

Nova Jaguaré
04.11 Abril



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 66
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:30

Programa:	BAIRRO LEGAL	Sub-Programa:	BAIRRO LEGAL
Projeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS - BAIRRO LEGAL	Lote:	EXEC. OBRAS - FAV.NOVA JAGUARÉ E VILA NILO
Processo :	2003-0.307.958-0	Empreendimento :	FAVELA NOVA JAGUARÉ
Nº do Contrato :	15/2004	Contratada :	SCHAHIN
Valor (R\$) :	132.172.967,83	Prazo :	72 (meses)
Data Base :	01/04/2004	Início/Término :	17/11/2005 a 17/11/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	1.734,51	0,02%	0,00	0,00	1.734,51	0,02%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	26.041,20	0,46%	0,00	0,00	26.041,20	0,46%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	282.317,53	5,58%	0,00	0,00	282.317,53	5,58%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	278.348,00	4,46%	0,00	0,00	278.348,00	4,46%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	19.164,97	0,59%	0,00	0,00	19.164,97	0,59%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	11.671,01	0,21%	0,00	0,00	11.671,01	0,21%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		TOTAL MEDIDO	619.277,22	0,00		619.277,22	
		BDI (35,00%)	216.747,02	0,00		216.747,02	
		TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	836.024,24	0,00		836.024,24	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Provisório	520.508,69
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	520.508,69



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 66

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:36

Programa : BAIRRO LEGAL
Projeto : EXECUÇÃO DE OBRAS - BAIRRO LEGAL

Sub_Programa : BAIRRO LEGAL
Lote : EXEC.OBRAS-FAV. NOVA JAGUARÉ E VILA NILO

Processo : 2003-0.307.958-0
Nº do Contrato : 15/2004
Valor (R\$) : 132.172.967,83
Data Base : 01/04/2004

Empreendimento : FAVELA NOVA JAGUARÉ
Contratada : SCHAHIN
Prazo : 72 (meses)
Início/Término : 17/11/2005 a 17/11/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	1.022,85	0,01	14.000.811,10	99,95	14.001.833,95	99,95
020000	TERRAPLENAGEM	1.734,51	0,02	10.255.903,19	99,83	10.257.637,70	99,85
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	5.238.329,48	99,87	5.238.329,48	99,87
050000	DRENAGEM PÚBLICA	26.041,20	0,46	5.504.796,16	97,67	5.530.837,36	98,13
070000	REDE DE ESGOTO	282.317,53	5,58	4.331.980,65	85,70	4.614.298,18	91,28
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	278.348,00	4,46	3.992.260,69	64,01	4.270.608,69	68,47
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	19.164,97	0,59	2.751.120,99	85,32	2.770.285,96	85,92
100000	DEMOLIÇÃO	38.967,23	0,69	5.453.028,58	96,34	5.491.995,81	97,03
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	1.370.750,43	56,44	1.370.750,43	56,44
120000	PAISAGISMO	22.960,78	2,93	620.385,02	79,21	643.345,80	82,14
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	37.127.909,01	99,04	37.127.909,01	99,04
140000	EQUIPE DE APOIO	7.469,44	0,70	1.003.960,64	93,46	1.011.430,08	94,15
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	745.728,11	99,72	745.728,11	99,72
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	678.026,51	92.396.964,05	93.074.990,56
	BDI (35,00%)	237.309,27		32.338.937,14	32.576.246,41
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	915.335,78		124.735.901,19	125.651.236,97

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Provisório	569.888,05
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00	
	Valor Total do Reajuste (R\$)	569.888,05	

SCHAHIN ENGENHARIA
LOTE 7 - NOVA JAGUARÉ e VILA NILO
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		n°	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	66	01 a 30/04/2011	678.026,51
02	B.D.I. (35 %)			237.309,27
Subtotal (01+02)				915.335,78
03	Reajuste provisório referente medição nº 66 (abril/11)	66	01 a 30/04/2011	569.888,05
Subtotal (03)				569.888,05
Total a ser Liquidado		66	01 a 30/04/2011	1.485.223,83

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn ABR10	Po	Reajuste	Total Pn ABR10
.00	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ e VL. NILO (PMSP)	79.311,54	42.003,40	121.314,94	79.311,54	49.379,36	128.690,90
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 07 (PMSP)	79.311,54	42.003,40	121.314,94	79.311,54	49.379,36	128.690,90
.03	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ e VL. NILO (FUNDO DE SANEAMENTO)	836.124,40	-	836.124,40	836.024,24	520.508,69	1.356.532,93
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	VALOR TOTAL - LOTE 07 (FUNDO DE SANEAMENTO)	836.124,40	-	836.124,40	836.024,24	520.508,69	1.356.532,93
.03	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VL.NILO (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (CDHU)	-	-	-			
.03	VALOR TOTAL - LOTE 07 (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.02	VALOR NO MÊS - VL. NILO (CEF)	-	-	-			
.02	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - VL.NILO (CEF)	-	-	-			
.02	VALOR TOTAL - VL.NILO (CEF)	-	-	-	-	-	-
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	915.435,94	42.003,40	957.439,34	915.335,78	569.888,05	1.485.223,83

OBRA JAGUARÉ – LOTE 07

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Execução de Viela

Foto 4



Viela executada

Foto 5


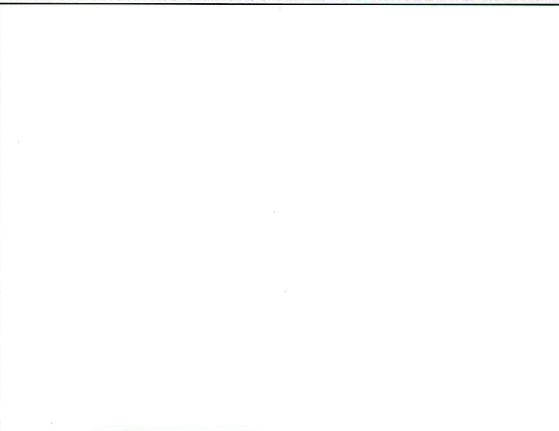


Foto 6



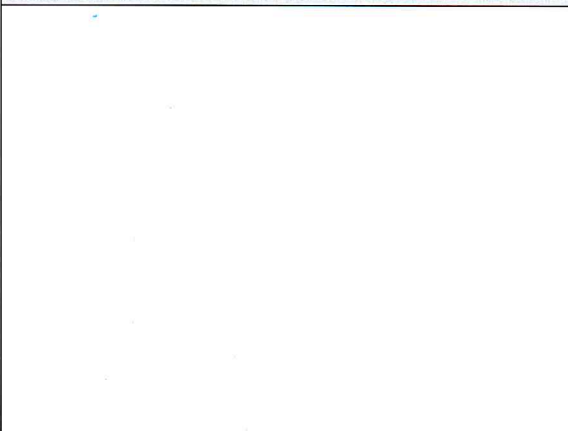

São Francisco
04/11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 07
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 11:18

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 02 - SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA

Processo :	2010-0.046.875-1	Empreendimento :	SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA
Nº do Contrato :	12/2010	Contratada :	EIT - SANTA BÁRBARA
Valor (R\$) :	127.375.367,04	Prazo :	30 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	18/10/2010 a 18/04/2013

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	1.024.186,12	9,39%	571.706,63	0,05	1.595.892,75	14,64%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	8.793,51	0,48%	1.030,59	0,00	9.824,10	0,54%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	52.824,46	1,59%	122.183,42	0,04	175.007,88	5,26%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	1.016,87	0,05%	0,00	0,00	1.016,87	0,05%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.787,50	1,03%	0,00	0,00	4.787,50	1,03%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	51.039,21	0,62%	3.177,92	0,00	54.217,13	0,66%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	105.495,53	2,85%	7.947,87	0,00	113.443,40	3,07%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	271.216,14	0,62%	982.812,20	0,02	1.254.028,34	2,89%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	90.199,45	2,48%	90.199,45	0,02	180.398,90	4,96%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	142.027,46	5,29%	21.687,97	0,01	163.715,43	6,09%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	13.222,56	21,90%	0,00	0,00	13.222,56	21,90%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	429.767,11	11,24%	51.105,81	0,01	480.872,92	12,57%
30.00.00	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
31.00.00	ENSAIOS AMBIENTAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
38.00.00	EQUIPAMENTOS SOCIAIS	27.645,56	3,10%	0,00	0,00	27.645,56	3,10%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		TOTAL MEDIDO	2.222.221,48	1.851.851,86		4.074.073,34	
		BDI (35,00%)	777.777,51	648.148,14		1.425.925,65	
		TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	2.999.998,99	2.500.000,00		5.499.998,99	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj. Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 09:58

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 02 - SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA

Processo : 2010-0.046.875-1

Empreendimento : SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA

Nº do Contrato : 12/2010

Contratada : EIT-STA BARBARA

Valor (R\$) 127.375.367,04

Prazo : 30 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 18/10/2010 a 18/04/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	629.517,81	60,00	629.517,81	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	1.024.190,00	9,39	2.673.280,04	24,52	3.697.470,04	33,91
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	8.793,51	0,48	10.957,28	0,60	19.750,79	1,09
050000	DRENAGEM PÚBLICA	52.824,46	1,59	1.059.322,83	31,84	1.112.147,29	33,43
070000	REDE DE ESGOTO	1.016,87	0,05	613.498,68	29,74	614.515,55	29,79
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.787,50	1,03	9.391,20	2,02	14.178,70	3,05
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	51.039,21	0,62	1.460.130,12	17,64	1.511.169,33	18,26
100000	DEMOLIÇÃO	105.495,53	2,85	183.335,81	4,96	288.831,34	7,81
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	271.216,14	0,62	1.684.400,80	3,88	1.955.616,94	4,50
140000	EQUIPE DE APOIO	90.199,45	2,48	376.178,28	10,34	466.377,73	12,82
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	142.027,46	5,29	28.405,48	1,06	170.432,94	6,34
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	13.222,56	21,90	10.439,46	17,29	23.662,02	39,19
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	429.767,11	11,24	345.881,06	9,04	775.648,17	20,28
300000	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	ENSAIOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	EQUIPAMENTOS SOCIAIS	27.645,56	3,10	100.417,18	11,27	128.062,74	14,37

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	2.222.225,36	9.185.156,03	11.407.381,39
	BDI (35,00%)		777.778,87	3.214.804,59	3.992.583,46
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		3.000.004,23	12.399.960,62	15.399.964,85

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

CONSÓRCIO EIT - SANTA BÁRBARA 2009
Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
SÃO FRANCISCO - COMPLEMENTAÇÃO
LOTE 02

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	
		Valor (R\$)		
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	2.222.225,36
02	B.D.I. (35 %)			777.778,87
Subtotal (01+02)				3.000.004,23
03	Reajuste definitivo referente medição nº 06 (abril/2011)			0,00
Subtotal (03)				0,00
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	3.000.004,23


DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (PMSP)	2,10	-	2,10	2,10	-	2,10
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (PMSP)	-	-	-			
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (PMSP)	3,14	-	3,14	3,14	-	3,14
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (PMSP)	-	-	-			
.00	PMSP TOTAL	5,24	-	5,24	5,24	-	5,24
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (CEF)	640.000,00	-	640.000,00			-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (CEF)	-	-	-			
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (CEF)	960.000,00	-	960.000,00			-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (CEF)	-	-	-			
02	CEF TOTAL	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	-
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.199.999,59	-	1.199.999,59
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.799.999,40	-	1.799.999,40
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	2.999.998,99	-	2.999.998,99
	SALDO ATUAL DE EMPENHO	4.600.005,24	-	4.600.005,24	3.000.004,23	-	3.000.004,23

OBRA SÃO FRANCISCO – LOTE 02

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1

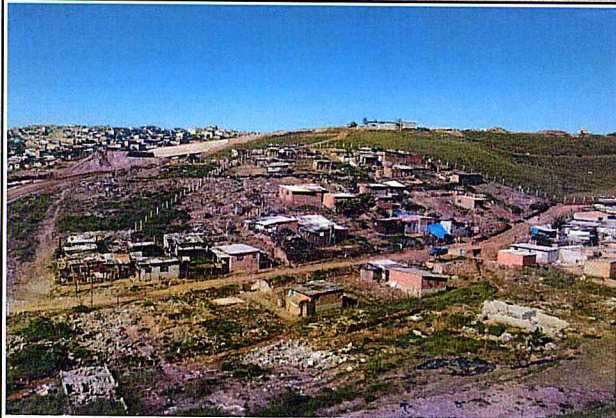

AP07: Área de construção dos apartamentos da AP07

Foto 2



AP06: Terraplenagem

Foto 3



Parque: Taludes do Parque Linear

Foto 4



AP04: Área de construção dos apartamentos da AP04

Foto 5


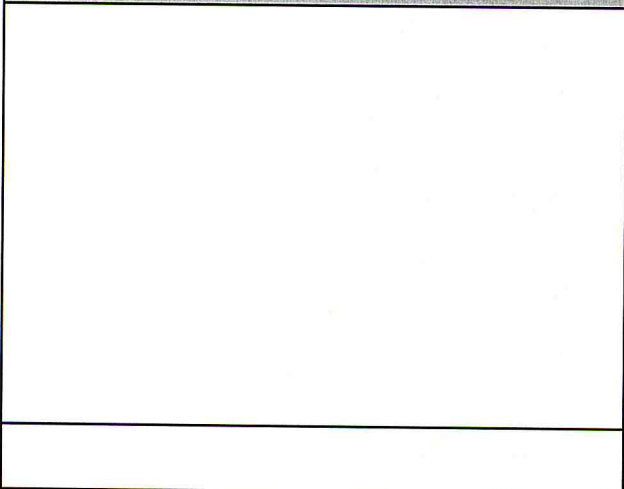


Foto 6



Cinco de Julho

04.11

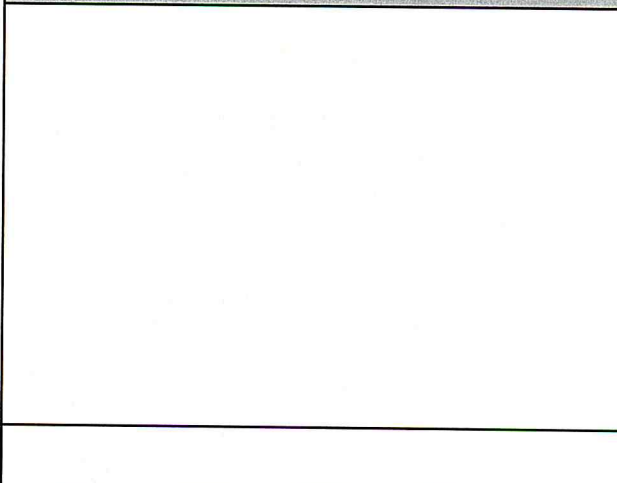

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 05

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA
Processo :	2010-0.046.881-6	Empreendimento :	CINCO DE JULHO
Nº do Contrato :	24/2010	Contratada :	FALEIROS / HE
Valor (R\$) :	4.478.766,88	Prazo :	12 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	13.247,94	35,00%	13.247,94	35,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	0,00	13.247,94	13.247,94
	BDI (35,00%)	0,00	4.636,77	4.636,77
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	17.884,71	17.884,71

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO FALEIROS/ HE
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA
LOTE 03

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		n°	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	57.227,52
02	B.D.I. (35 %)			20.029,63
	Subtotal (01+02)			77.257,15
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	77.257,15

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	40.800,00	-	40.800,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	10.416,93	-	10.416,93	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	51.216,93	-	51.216,93	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	37.856,00	-	37.856,00
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	39.200,00	-	39.200,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	10.008,42	-	10.008,42	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	49.208,42	-	49.208,42	37.856,00	-	37.856,00
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:00

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6

Empreendimento : FAVELA CINCO DE JULHO

Nº do Contrato : 24/2010

Contratada : FALEIROS / HE

Valor (R\$) 4.478.766,88

Prazo : 12 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	22.710,74	60,00	22.710,74	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	0,00	22.710,74	22.710,74
	BDI (35,00%)	0,00		7.948,74	7.948,74
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		30.659,48	30.659,48

CÁLCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA 5 DE JULHO – LOTE 03

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1




Vista Geral da Área

Foto 2




Vista Geral da Área

Foto 3

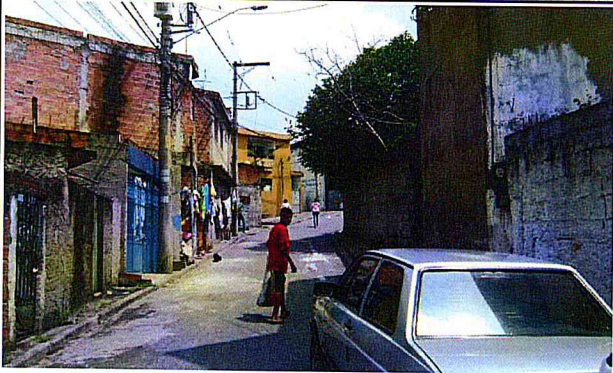

Vista Geral da Área

Foto 4

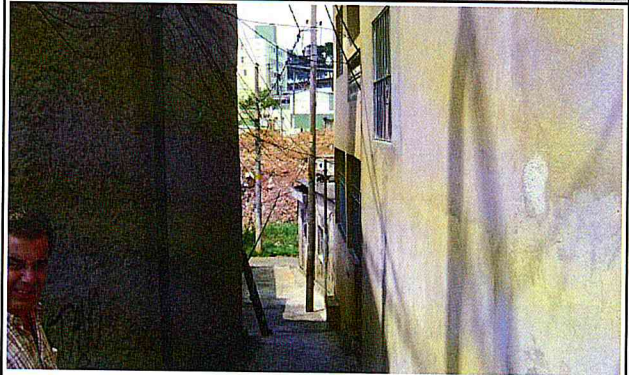

Vista Geral da Área

Foto 5


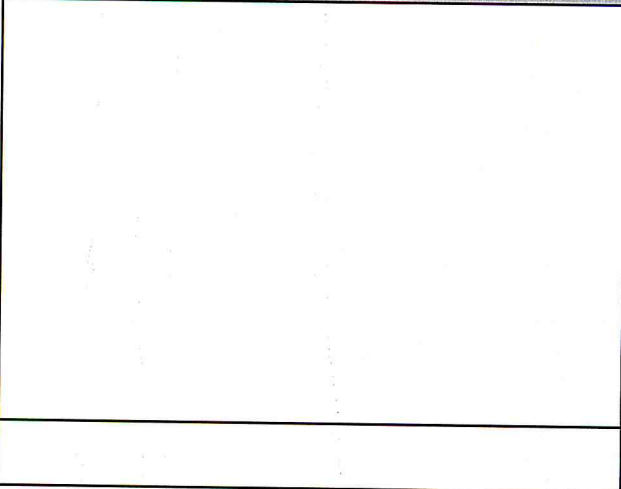


Foto 6



Nov de Julho
04/11

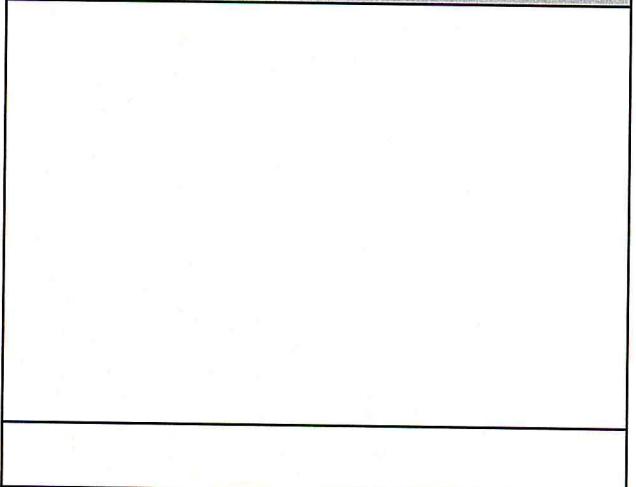

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 05

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Sub-Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Lote: LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6 Empreendimento : NOVE DE JULHO
Nº do Contrato : 24/2010 Contratada : FALEIROS / HE
Valor (R\$) : 5.686.240,55 Prazo : 12 (meses)
Data Base : 01/08/2010 Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	3.330,74	7,00%	3.330,74	7,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	TOTAL MEDIDO	0,00		3.330,74		3.330,74	
	BDI (35,00%)	0,00		1.165,75		1.165,75	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		4.496,49		4.496,49	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO			
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00	
Diferença de Reaj.Econômico		0,00	
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00	

CONSÓRCIO FALEIROS/ HE
Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA
LOTE 03

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	57.227,52
02	B.D.I. (35 %)			20.029,63
	Subtotal (01+02)			77.257,15
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	77.257,15

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	40.800,00	-	40.800,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	10.416,93	-	10.416,93	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	51.216,93	-	51.216,93	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	37.856,00	-	37.856,00
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	39.200,00	-	39.200,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	10.008,42	-	10.008,42	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	49.208,42	-	49.208,42	37.856,00	-	37.856,00
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:01

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6
Nº do Contrato : 24/2010
Valor (R\$) : 5.686.240,55
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA NOVE DE JULHO
Contratada : FALEIROS / HE
Prazo : 12 (meses)
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011


Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	28.549,20	60,00	28.549,20	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Sub Total	0,00	28.549,20	28.549,20
	BDI (35,00%)	0,00	9.992,20	9.992,20
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	38.541,40	38.541,40


CALCULO FINAL DE REAJUSTE	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

OBRA 9 DE JULHO – LOTE 03


ANDAMENTO DAS OBRAS

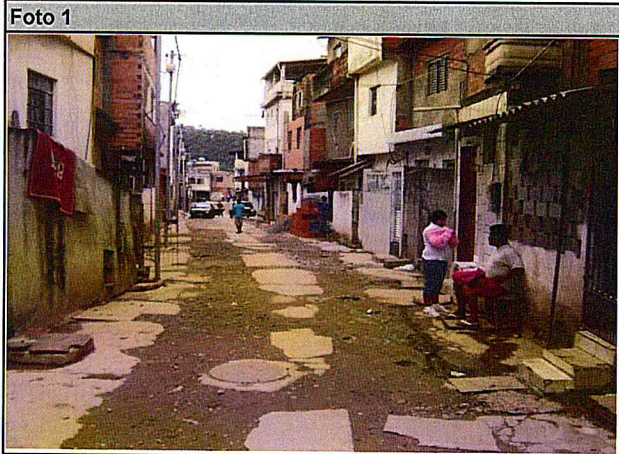


Vista Geral da Área

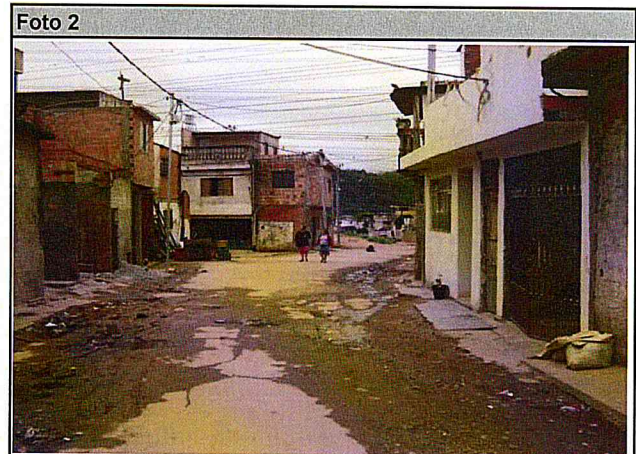



Vista Geral da Área

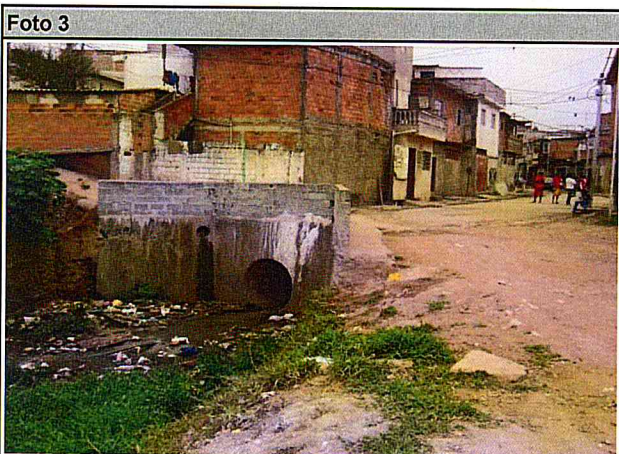

Vista Geral da Área

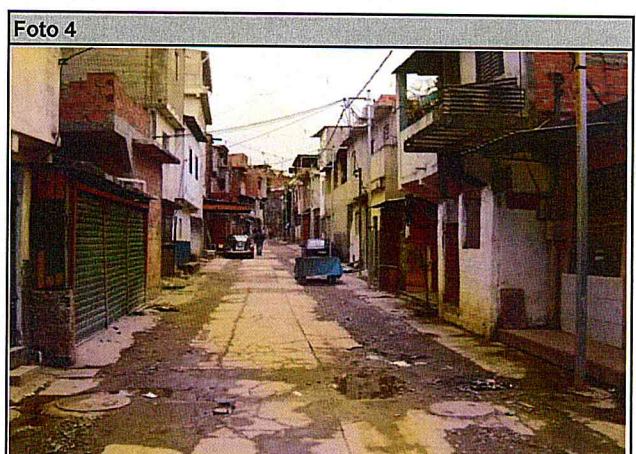

Vista Geral da Área

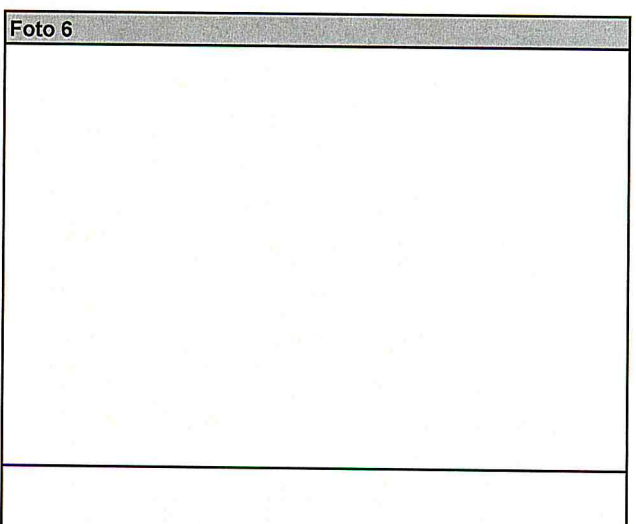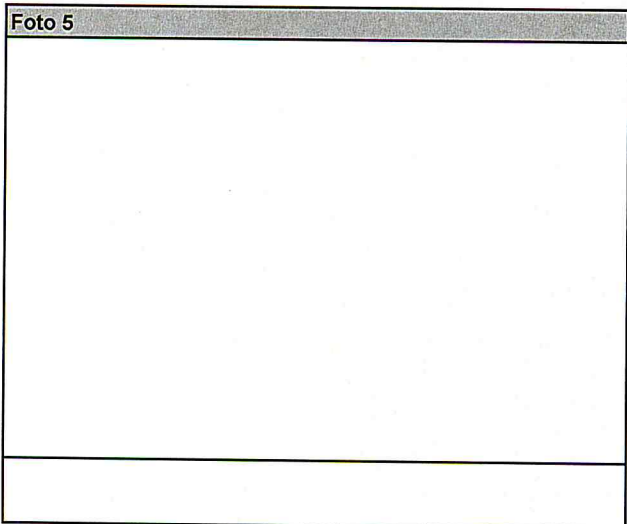

Vitotoma
04/11



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 05
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA
Processo :	2010-0.046.881-6	Empreendimento :	DOIS DE MAIO
Nº do Contrato :	24/2010	Contratada :	FALEIROS / HE
Valor (R\$) :	13.835.838,63	Prazo :	12 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	26.039,22	2,94%	0,00	0,00%	26.039,22	2,94%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	12.927,94	1,33%	23.349,49	2,41%	36.277,43	3,74%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	18.260,36	2,51%	4.201,22	0,58%	22.461,58	3,09%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	57.227,52	27.550,71	84.778,23
	BDI (35,00%)	20.029,63	9.642,74	29.672,37
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	77.257,15	37.193,45	114.450,60

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO FALEIROS/ HE
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA
LOTE 03

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	57.227,52
02	B.D.I. (35 %)			20.029,63
	Subtotal (01+02)			77.257,15
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	77.257,15

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	40.800,00	-	40.800,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	10.416,93	-	10.416,93	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	51.216,93	-	51.216,93	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	37.856,00	-	37.856,00
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	39.200,00	-	39.200,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	10.008,42	-	10.008,42	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	49.208,42	-	49.208,42	37.856,00	-	37.856,00
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 09:59

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6
Nº do Contrato : 24/2010
Valor (R\$) : 13.835.838,63
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : DOIS DE MAIO
Contratada : FALEIROS / HE
Prazo : 12 (meses)
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	69.916,14	60,00	69.916,14	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	26.039,22	2,94	0,00	0,00	26.039,22	2,94
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	12.927,94	1,33	23.349,49	2,41	36.277,43	3,74
140000	EQUIPE DE APOIO	18.260,36	2,51	7.700,36	1,06	25.960,72	3,57
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	100.965,99	158.193,51
	BDI (35,00%)	20.029,63	35.338,08	55.367,71
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	77.257,15	136.304,07	213.561,22

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA VITOTOMA – LOTE 03

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


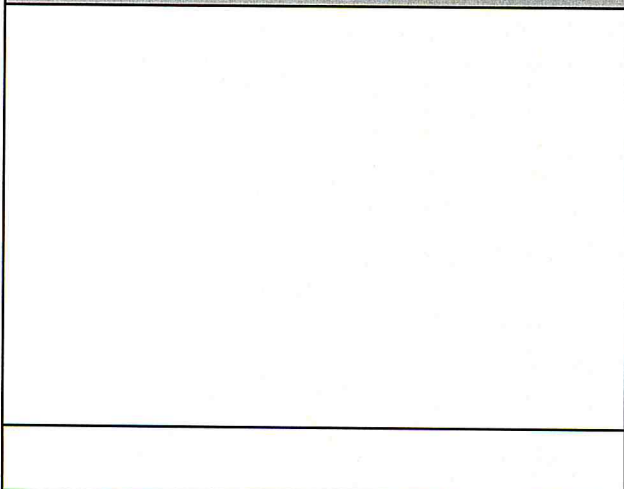


Foto 6



Luís de M. B. 05/11

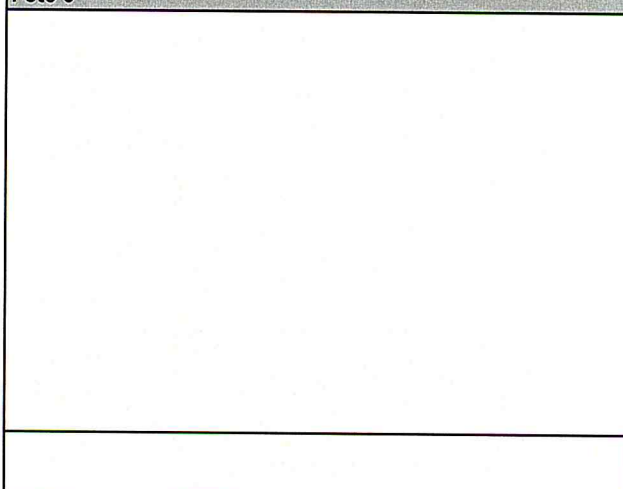

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 05
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Sub-Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Lote: LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6 Empreendimento : VITOTOMA
Nº do Contrato : 24/2010 Contratada : FALEIROS / HE
Valor (R\$) : 4.885.676,44 Prazo : 12 (meses)
Data Base : 01/08/2010 Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	TOTAL MEDIDO	0,00		0,00		0,00	
	BDI (35,00%)	0,00		0,00		0,00	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		0,00		0,00	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj. Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO FALEIROS/ HE
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA
LOTE 03

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	57.227,52
02	B.D.I. (35 %)			20.029,63
Subtotal (01+02)				77.257,15
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
Subtotal (03)				0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	77.257,15

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	40.800,00	-	40.800,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	10.416,93	-	10.416,93	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	51.216,93	-	51.216,93	39.401,15	-	39.401,15
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	37.856,00	-	37.856,00
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	39.200,00	-	39.200,00	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	10.008,42	-	10.008,42	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	49.208,42	-	49.208,42	37.856,00	-	37.856,00
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	100.425,35	-	100.425,35	77.257,15	-	77.257,15



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:02

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6
Nº do Contrato : 24/2010
Valor (R\$) : 4.885.676,44
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA VITOTOMA
Contratada : FALEIROS / HE
Prazo : 12 (meses)
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	Valor Anterior (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
Sub Total		0,00	0,00	0,00
BDI (35,00%)		0,00	0,00	0,00
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		0,00	0,00	0,00

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA 2 DE MAIO – LOTE 03

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Canalização do correço

Foto 5


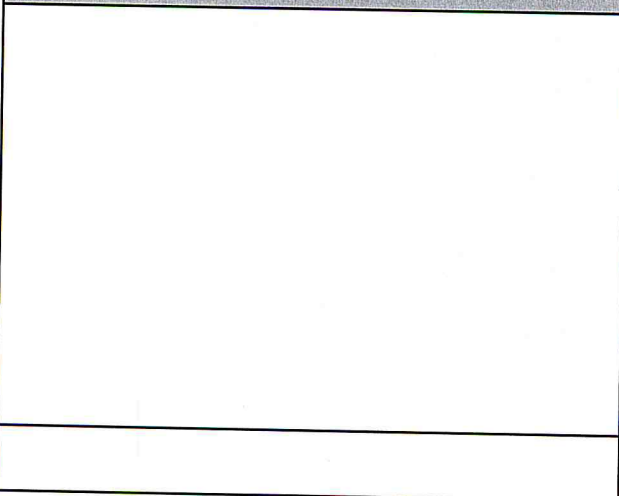


Foto 6



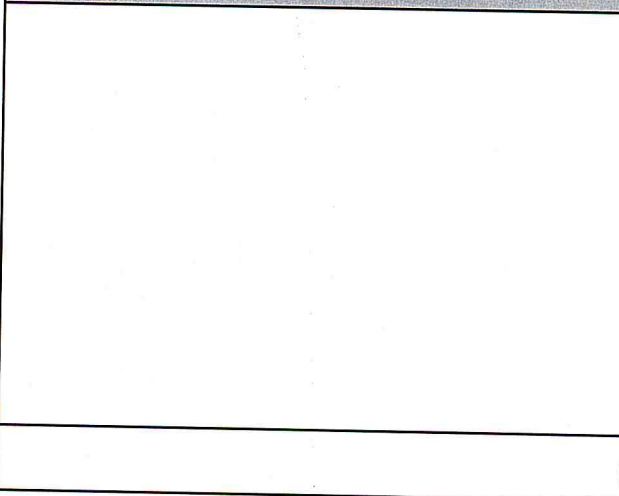

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Córrego da Mina
04/11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 07

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA Córrego da Mina
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	29.380.129,27	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	13.174,82	2,41%	13.174,82	2,41%	26.349,64	4,83%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.488,78	9,52%	0,00	0,00%	2.488,78	9,52%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		TOTAL MEDIDO	15.663,60	13.174,82		28.838,42	
		BDI (35,00%)	5.482,26	4.611,18		10.093,44	
		TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	21.145,86	17.786,00		38.931,86	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	1.647.179,39
02	B.D.I. (35 %)			576.512,77
	Subtotal (01+02)			2.223.692,16
03	Reajuste definitivo referente medição nº 07 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)		0,00	
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	2.223.692,16

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO
LOTE 14

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	119,36	-	119,36
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	119,36	-	119,36
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	350.873,27	-	350.873,27
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	4.948,76	-	4.948,76
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	14.802,10	-	14.802,10
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	8.574,38	-	8.574,38
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	1.177.107,55	-	1.177.107,55
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	1.556.306,06	-	1.556.306,06
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	150.374,23	-	150.374,23
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	2.120,90	-	2.120,90
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	6.343,76	-	6.343,76
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	3.674,73	-	3.674,73
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	504.474,67	-	504.474,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	666.988,29	-	666.988,29
.00	PMSP TOTAL	397,81	-	397,81	397,81	-	397,81
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	2.562.796,10	-	2.562.796,10	2.223.294,35	-	2.223.294,35
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	2.563.193,91	-	2.563.193,91	2.223.692,16	-	2.223.692,16



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:06

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Empreendimento : FAVELA CORREGO DA MINA

Nº do Contrato : 14/2010

Contratada : CONS. GOMES-FM

Valor (R\$) : 29.380.129,27

Prazo : 18 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	122.046,07	50,00	122.046,07	50,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	13.174,82	2,41	48.449,81	8,88	61.624,63	11,30
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.488,78	9,52	0,00	0,00	2.488,78	9,52
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	15.663,60	170.495,88	186.159,48
	BDI (35,00%)	5.482,26		59.673,53	65.155,79
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	21.145,86		230.169,41	251.315,27

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA CORREGO DA MINA – LOTE 14

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1




Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3

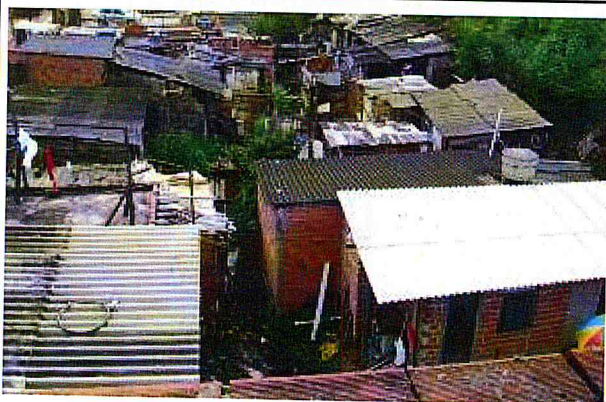

Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


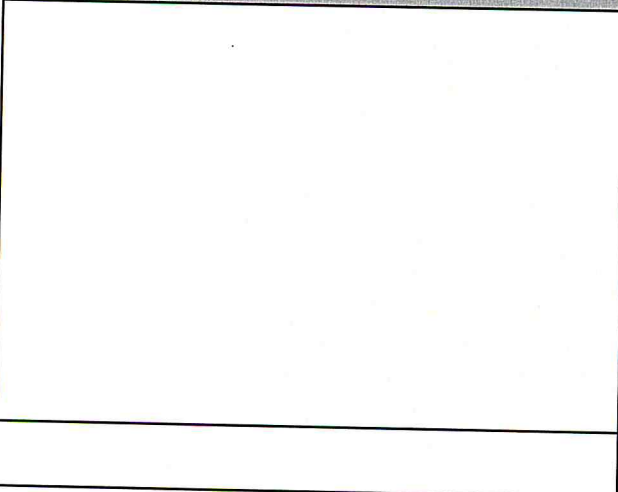


Foto 6



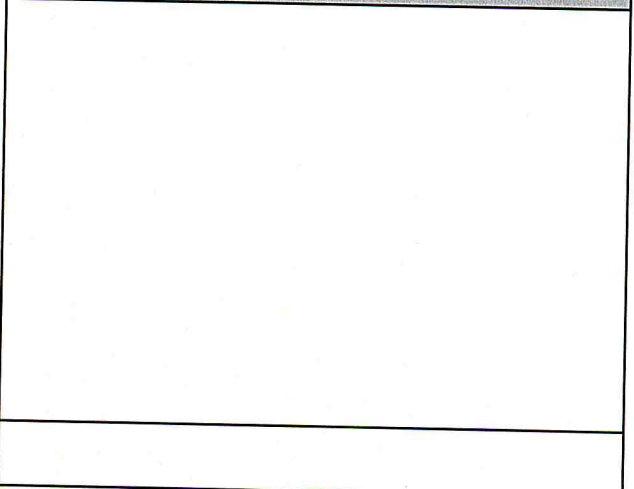

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 07

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA BAMBURRAL
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	44.311.943,95	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	37.087,34	10,00%	0,00	0,00%	37.087,34	10,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	69.785,03	1,40%	6.866,67	0,14%	76.651,70	1,54%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	148.643,86	4,94%	159.560,93	5,30%	308.204,79	10,24%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	29.942,40	3,88%	64.839,87	8,39%	94.782,27	12,27%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	17.035,82	1,25%	16.665,48	1,22%	33.701,30	2,47%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.496,88	0,57%	104.350,50	40,06%	105.847,38	40,64%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	67.303,12	8,72%	140.996,72	18,26%	208.299,84	26,98%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	371.294,45	493.280,17	864.574,62
	BDI (35,00%)	129.953,05	172.648,05	302.601,10
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	501.247,50	665.928,22	1.167.175,72

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	1.647.179,39
02	B.D.I. (35 %)			576.512,77
	Subtotal (01+02)			2.223.692,16
03	Reajuste definitivo referente medição nº 07 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	2.223.692,16

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO
LOTE 14

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	119,36	-	119,36
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	119,36	-	119,36
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	350.873,27	-	350.873,27
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	4.948,76	-	4.948,76
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	14.802,10	-	14.802,10
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	8.574,38	-	8.574,38
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	1.177.107,55	-	1.177.107,55
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	1.556.306,06	-	1.556.306,06
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	150.374,23	-	150.374,23
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	2.120,90	-	2.120,90
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	6.343,76	-	6.343,76
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	3.674,73	-	3.674,73
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	504.474,67	-	504.474,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	666.988,29	-	666.988,29
.00	PMSP TOTAL	397,81	-	397,81	397,81	-	397,81
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	2.562.796,10	-	2.562.796,10	2.223.294,35	-	2.223.294,35
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	2.563.193,91	-	2.563.193,91	2.223.692,16	-	2.223.692,16



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:05

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2
Nº do Contrato : 14/2010
Valor (R\$) : 44.311.943,95
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA BAMBURRAL
Contratada : CONS. GOMES-FM
Prazo : 18 (meses)
Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	37.087,34	10,00	185.436,70	50,00	222.524,04	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	69.785,03	1,40	6.866,67	0,14	76.651,70	1,54
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	148.643,86	4,94	282.350,34	9,38	430.994,20	14,32
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	29.942,40	3,88	117.972,19	15,27	147.914,59	19,15
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	17.035,82	1,25	107.399,76	7,86	124.435,58	9,11
190000	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.496,88	0,57	122.258,51	46,94	123.755,39	47,51
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	67.597,79	8,76	140.996,72	18,26	208.594,51	27,02
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
Sub Total		371.589,12		963.280,89		1.334.870,01	
BDI (35,00%)		130.056,19		337.148,28		467.204,47	
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		501.645,31		1.300.429,17		1.802.074,48	

CALCULO FINAL DE REAJUSTE	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

OBRA BAMBURRAL – LOTE 14

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1




Vista Geral da Área

Foto 2




Vista Geral da Área

Foto 3

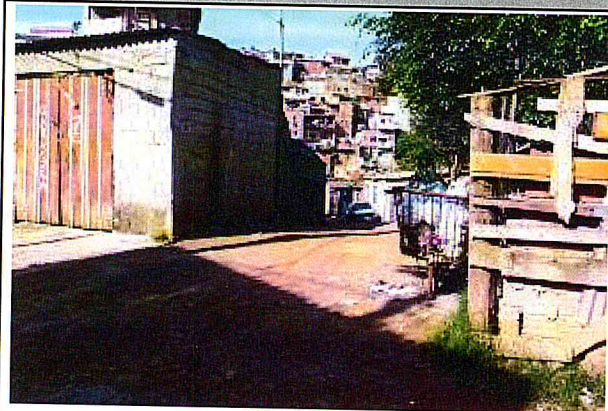

Vista Geral da Área

Foto 4

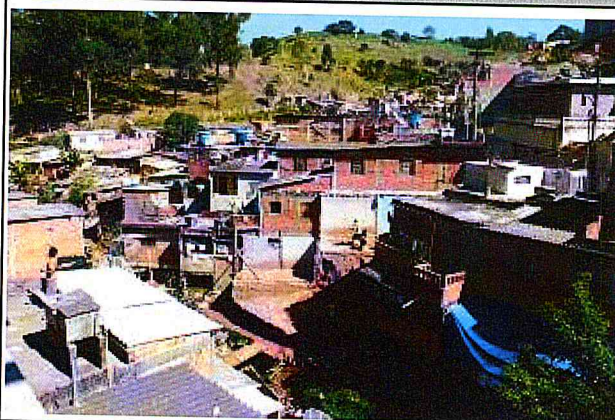

Vista Geral da Área

Foto 5


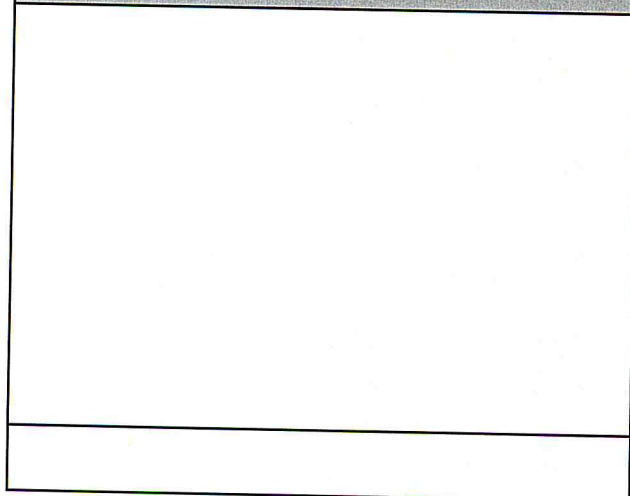


Foto 6



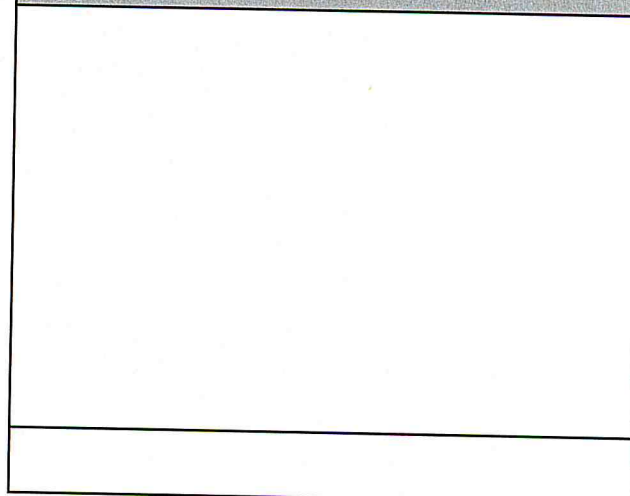

Planilha de Medição

Carine Ari

04.11

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 07

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA CARINA ARI
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	335.329,05	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	418,09	20,00%	418,09	20,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	10.361,62	85,06%	10.361,62	85,06%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	3.223,54	5,20%	8.738,28	14,10%	11.961,82	19,30%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	1.437,62	2,22%	14.831,54	22,88%	16.269,16	25,10%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	575,63	4,16%	1.841,71	13,31%	2.417,34	17,47%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	384,94	0,48%	384,94	0,48%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	5.236,79	36.576,18	41.812,97
	BDI (35,00%)	1.832,87	12.801,66	14.634,53
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	7.069,66	49.377,84	56.447,50

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	1.647.179,39
02	B.D.I. (35 %)			576.512,77
	Subtotal (01+02)			2.223.692,16
03	Reajuste definitivo referente medição nº 07 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	2.223.692,16

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO
LOTE 14

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	119,36	-	119,36
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	119,36	-	119,36
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	350.873,27	-	350.873,27
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	4.948,76	-	4.948,76
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	14.802,10	-	14.802,10
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	8.574,38	-	8.574,38
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	1.177.107,55	-	1.177.107,55
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	1.556.306,06	-	1.556.306,06
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	150.374,23	-	150.374,23
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	2.120,90	-	2.120,90
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	6.343,76	-	6.343,76
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	3.674,73	-	3.674,73
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	504.474,67	-	504.474,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	666.988,29	-	666.988,29
.00	PMSP TOTAL	397,81	-	397,81	397,81	-	397,81
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	2.562.796,10	-	2.562.796,10	2.223.294,35	-	2.223.294,35
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	2.563.193,91	-	2.563.193,91	2.223.692,16	-	2.223.692,16



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:05

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Empreendimento : FAVELA CARINA ARI

Nº do Contrato : 14/2010

Contratada : CONS. GOMES-FM

Valor (R\$) 335.329,05

Prazo : 18 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	1.254,27	60,00	1.254,27	60,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	10.361,62	85,06	10.361,62	85,06
050000	DRENAGEM PÚBLICA	3.223,54	5,20	33.657,28	54,30	36.880,82	59,50
070000	REDE DE ESGOTO	1.437,62	2,22	28.159,51	43,45	29.597,13	45,67
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	575,63	4,16	1.841,71	13,31	2.417,34	17,47
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	384,94	0,48	384,94	0,48
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	5.236,79	75.659,33	80.896,12
	BDI (35,00%)	1.832,87		26.480,76	28.313,63
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	7.069,66		102.140,09	109.209,75

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA CARINA ARI – LOTE 14


ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2

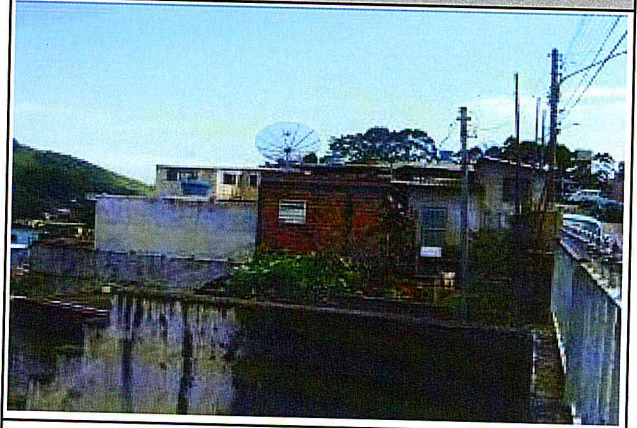

Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5

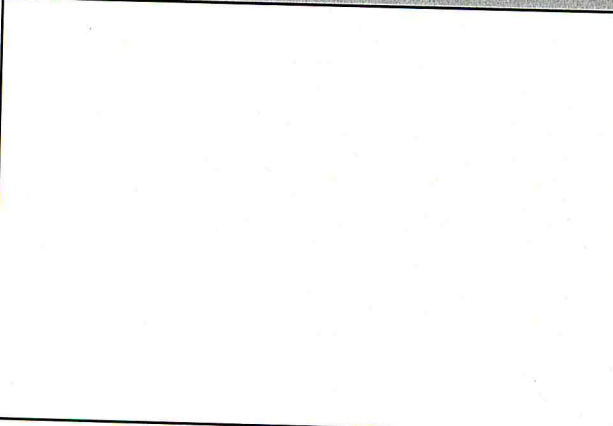


Foto 6





Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº da Medição: 07

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo	: 2010-0.046.947-2	Empreendimento	: FAVELA LIDIANE / SAMPAIO CORREA
Nº do Contrato	: 14/2010	Contratada	: CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$)	: 34.326.744,75	Prazo	: 18 (meses)
Data Base	: 01/08/2010	Início/Término	: 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	1.138.672,14	47,18%	923.351,79	38,26%	2.062.023,93	85,43%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	50.454,70	1,37%	15.060,87	0,41%	65.515,57	1,78%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	18.108,06	1,66%	18.108,06	1,66%	36.216,12	3,32%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	17.406,16	2,04%	11.110,32	1,30%	28.516,48	3,35%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	2.488,78	6,52%	2.488,78	6,52%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	37.798,57	2,30%	37.798,57	2,30%
30.00.00	QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.975,40	2,87%	32.164,46	4,41%	53.139,86	7,28%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	TOTAL MEDIDO	1.245.616,46		1.040.082,85		2.285.699,31	
	BDI (35,00%)	435.965,76		364.028,99		799.994,75	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.681.582,22		1.404.111,84		3.085.694,06	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	1.647.179,39
02	B.D.I. (35 %)			576.512,77
	Subtotal (01+02)			2.223.692,16
03	Reajuste definitivo referente medição nº 07 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)		0,00	
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	2.223.692,16

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO
LOTE 14

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	119,36	-	119,36
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	119,36	-	119,36
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	350.873,27	-	350.873,27
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	4.948,76	-	4.948,76
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	14.802,10	-	14.802,10
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	8.574,38	-	8.574,38
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	1.177.107,55	-	1.177.107,55
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	1.556.306,06	-	1.556.306,06
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	150.374,23	-	150.374,23
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	2.120,90	-	2.120,90
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	6.343,76	-	6.343,76
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	3.674,73	-	3.674,73
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	504.474,67	-	504.474,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	666.988,29	-	666.988,29
.00	PMSP TOTAL	397,81	-	397,81	397,81	-	397,81
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	2.562.796,10	-	2.562.796,10	2.223.294,35	-	2.223.294,35
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	2.563.193,91	-	2.563.193,91	2.223.692,16	-	2.223.692,16



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:08

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Empreendimento : FAVELA LIDIANE / SAMPAIO CORREA

Nº do Contrato : 14/2010

Contratada : CONS. GOMES-FM

Valor (R\$) 34.326.744,75

Prazo : 18 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	173.192,90	60,00	173.192,90	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	1.138.672,14	47,18	981.530,23	40,67	2.120.202,37	87,84
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	50.454,70	1,37	15.060,87	0,41	65.515,57	1,78
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	18.108,06	1,66	96.965,34	8,89	115.073,40	10,55
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	17.406,16	2,04	11.110,32	1,30	28.516,48	3,35
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	20.701,27	54,23	20.701,27	54,23
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	37.798,57	2,30	37.798,57	2,30
300000	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	20.975,40	2,87	32.164,46	4,41	53.139,86	7,28
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	Sub Total	1.245.616,46		1.368.523,96		2.614.140,42	
	BDI (35,00%)	435.965,76		478.983,36		914.949,12	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.681.582,22		1.847.507,32		3.529.089,54	

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00
Diferença de Reaj. Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA LIDIANE – LOTE 14

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2




Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4

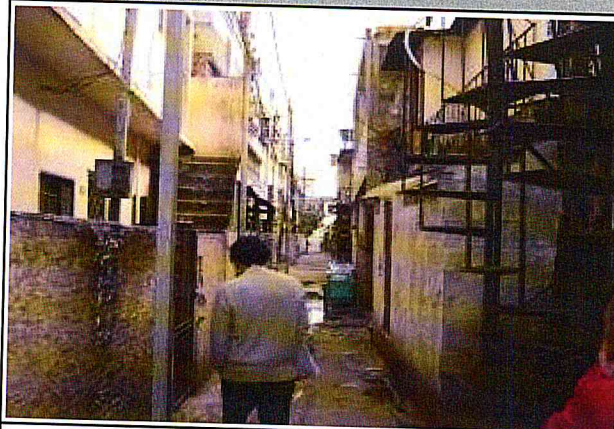

Vista Geral da Área

Foto 5


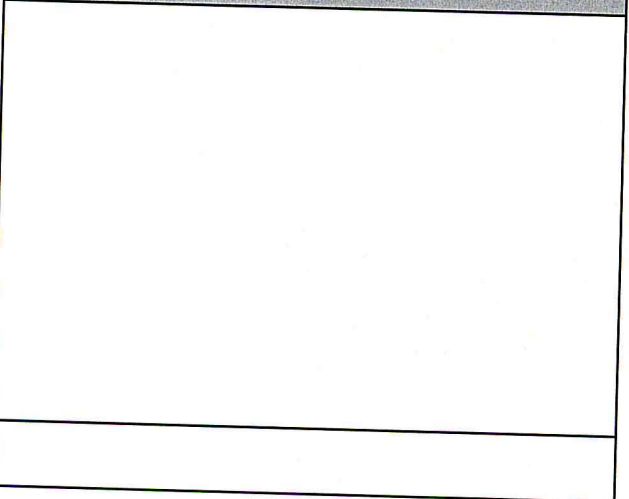


Foto 6



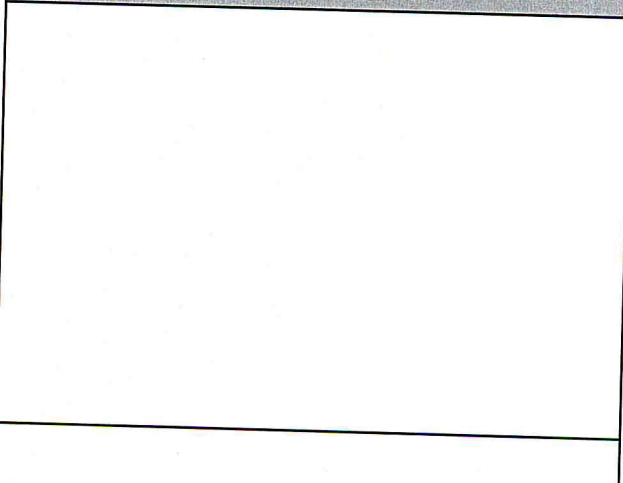

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Gabi
04.11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 07
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA GABI
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	711.772,29	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	9.073,42	11,14%	0,00	0,00%	9.073,42	11,14%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	TOTAL MEDIDO	9.073,42		0,00		9.073,42	
	BDI (35,00%)	3.175,69		0,00		3.175,69	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	12.249,11		0,00		12.249,11	
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	Reajuste Econômico Definitivo	0,00					
	Diferença de Reaj. Econômico	0,00					
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00					

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011
LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	07	01 a 30/04/2011	1.647.179,39
02	B.D.I. (35 %)			576.512,77
	Subtotal (01+02)			2.223.692,16
03	Reajuste definitivo referente medição nº 07 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)		0,00	
Total a ser Liquidado		07	01 a 30/04/2011	2.223.692,16

CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES
DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO
LOTE 14

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	278,45	-	278,45	278,45	-	278,45
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	119,36	-	119,36
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	119,36	-	119,36	119,36	-	119,36
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	350.873,27	-	350.873,27
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	4.948,76	-	4.948,76
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	14.802,10	-	14.802,10
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	8.574,38	-	8.574,38
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	1.177.107,55	-	1.177.107,55
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.793.957,27	-	1.793.957,27	1.556.306,06	-	1.556.306,06
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	150.374,23	-	150.374,23
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	2.120,90	-	2.120,90
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	6.343,76	-	6.343,76
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	3.674,73	-	3.674,73
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	504.474,67	-	504.474,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	768.838,83	-	768.838,83	666.988,29	-	666.988,29
.00	PMSP TOTAL	397,81	-	397,81	397,81	-	397,81
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	2.562.796,10	-	2.562.796,10	2.223.294,35	-	2.223.294,35
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	2.563.193,91	-	2.563.193,91	2.223.692,16	-	2.223.692,16



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 7

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:07

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2
Nº do Contrato : 14/2010
Valor (R\$) : 711.772,29
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA GABI
Contratada : CONS. GOMES-FM
Prazo : 18 (meses)
Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	9.073,42	11,14	0,00	0,00	9.073,42	11,14
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
Sub Total		9.073,42		0,00		9.073,42	
BDI (35,00%)		3.175,69		0,00		3.175,69	
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		12.249,11		0,00		12.249,11	

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA GABI – LOTE 14

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


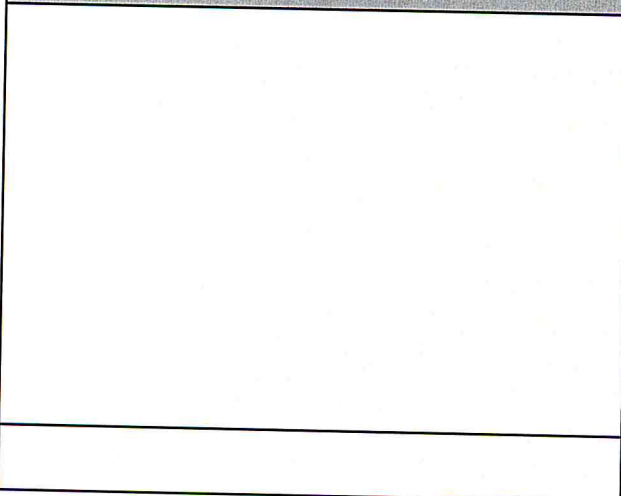


Foto 6



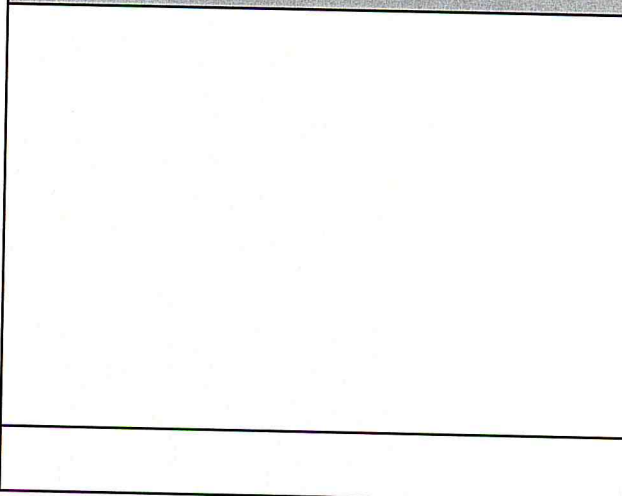

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº da Medição: 05

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Sub-Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Lote: LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO

Processo : 2010-0.046.954-5 Empreendimento : FAVELA PONTE DOS REMÉDIOS
Nº do Contrato : 21/2010 Contratada : SCHAHIN
Valor (R\$) : 63.790.865,23 Prazo : 30 (meses)
Data Base : 01/08/2010 Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	102.226,50	19,34%	102.226,50	19,34%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	0,00	102.226,50	102.226,50
	BDI (35,00%)	0,00	35.779,27	35.779,27
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	138.005,77	138.005,77

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

SCHAHIN ENGENHARIA
LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA
e PONTE DOS REMÉDIOS

Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	
			Valor (R\$)	
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	299.994,98
02	B.D.I. (35 %)			104.998,23
	Subtotal (01+02)			404.993,21
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	404.993,21

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	29.598,17		29.598,17
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	261.590,25		261.590,25
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	113.804,79		113.804,79
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-		-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04		375.395,04
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04	-	375.395,04
	VALOR TOTAL	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:13

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5
Nº do Contrato : 21/2010
Valor (R\$) : 63.790.865,23
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA PONTE DOS REMÉDIOS
Contratada : SCHAHIN
Prazo : 30 (meses)
Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	317.205,69	60,00	317.205,69	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO					
	Sub Total	0,00		317.205,69	317.205,69
	BDI (35,00%)	0,00		111.021,99	111.021,99
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		428.227,68	428.227,68

CALCULO FINAL DE REAJUSTE			
	Reajuste Econômico Definitivo	0,00	
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00	
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00	

OBRA PONTE DOS REMÉDIOS – LOTE 15

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3




Vista Geral da Área

Foto 4




Vista Geral da Área

Foto 5

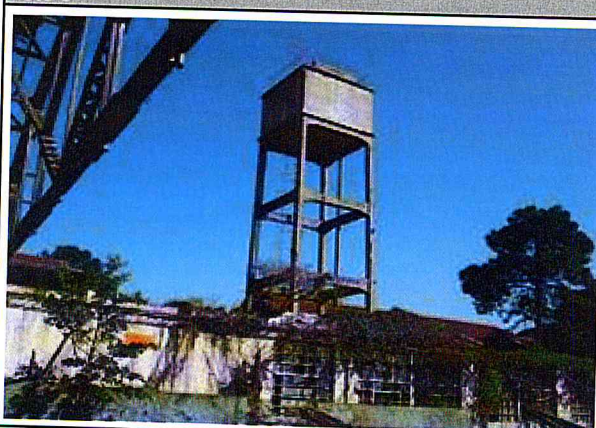

Vista Geral da Área

Foto 6

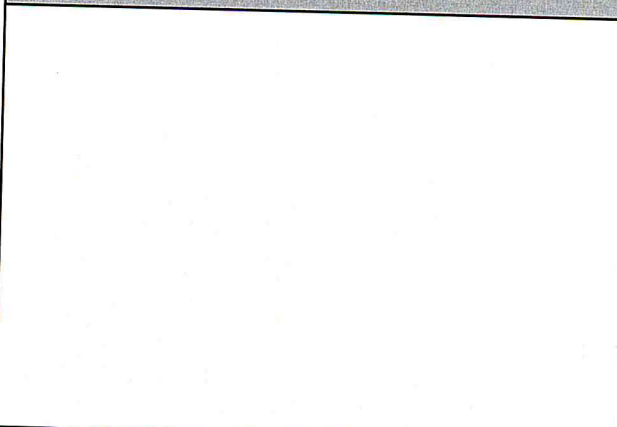



CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Sub-Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Lote: LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO

Processo : 2010-0.046.954-5 Empreendimento : FAVELA DIOGO PIRES
Nº do Contrato : 21/2010 Contratada : SCHAHIN
Valor (R\$) : 22.809.999,33 Prazo : 30 (meses)
Data Base : 01/08/2010 Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	14.300,11	4,79%	0,00	0,00%	14.300,11	4,79%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	69.999,74	4,35%	119.995,73	7,46%	189.995,47	11,81%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
	TOTAL MEDIDO	84.299,85		119.995,73		204.295,58	
	BDI (35,00%)	29.504,94		41.998,50		71.503,44	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	113.804,79		161.994,23		275.799,02	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

SCHAHIN ENGENHARIA
LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA
e PONTE DOS REMÉDIOS

Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	299.994,98
02	B.D.I. (35 %)			104.998,23
Subtotal (01+02)				404.993,21
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
Subtotal (03)				0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	404.993,21

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	29.598,17		29.598,17
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	261.590,25		261.590,25
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	113.804,79		113.804,79
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-		-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04		375.395,04
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04	-	375.395,04
	VALOR TOTAL	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:10

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMEDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5
Nº do Contrato : 21/2010
Valor (R\$) : 22.809.999,33
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA DIOGO PIRES
Contratada : SCHAHIN
Prazo : 30 (meses)
Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	113.393,52	60,00	113.393,52	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	14.300,11	4,79	0,00	0,00	14.300,11	4,79
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	69.999,74	4,35	119.995,73	7,46	189.995,47	11,81

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	84.299,85	233.389,25	317.689,10
	BDI (35,00%)	29.504,94		81.686,22	111.191,16
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	113.804,79		315.075,47	428.880,26

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA DIOGO PIRES – LOTE 15

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1




Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3

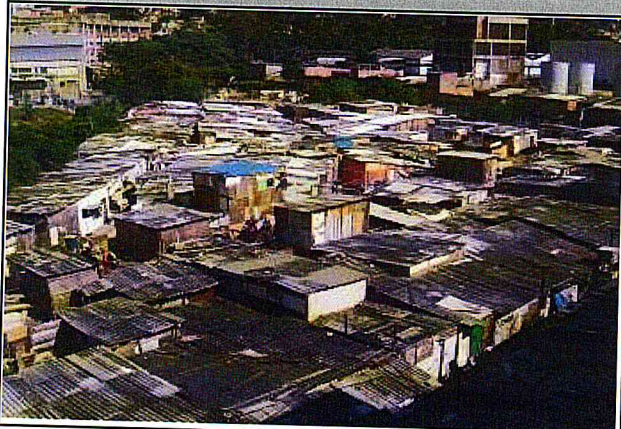

Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


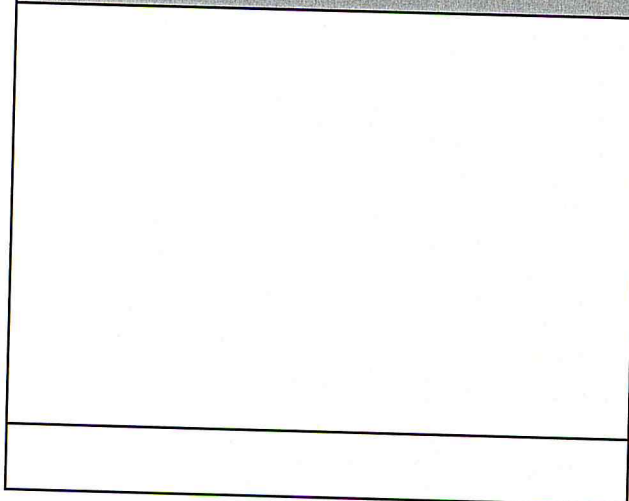


Foto 6



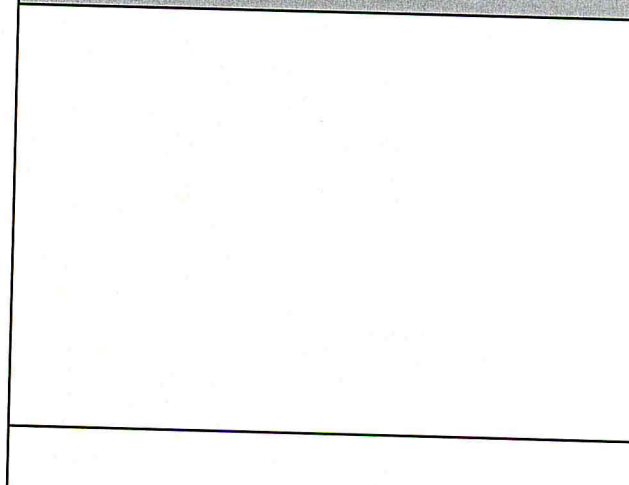

Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Barão de Antonina

04.11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 05

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Sub-Programa: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS Lote: LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO

Processo : 2010-0.046.954-5 Empreendimento : FAVELA BARÃO DE ANTONINA
Nº do Contrato : 21/2010 Contratada : SCHAHIN
Valor (R\$) : 17.508.222,37 Prazo : 30 (meses)
Data Base : 01/08/2010 Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	6.675,96	2,24%	0,00	0,00%	6.675,96	2,24%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	187.094,60	11,63%	0,00	0,00%	187.094,60	11,63%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO							
TOTAL MEDIDO		193.770,56		0,00		193.770,56	
BDI (35,00%)		67.819,69		0,00		67.819,69	
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		261.590,25		0,00		261.590,25	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00	
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00	-
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00	-

SCHAHIN ENGENHARIA
LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA
e PONTE DOS REMÉDIOS

Quadro Resumo do Valor a Faturar em ABRIL / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor (R\$)
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	05	01 a 30/04/2011	299.994,98
02	B.D.I. (35 %)			104.998,23
	Subtotal (01+02)			404.993,21
03	Reajuste definitivo referente medição nº 05 (abril/2011)			0,00
	Subtotal (03)			0,00
Total a ser Liquidado		05	01 a 30/04/2011	404.993,21

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	29.598,17		29.598,17
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-			
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	29.598,17	-	29.598,17	29.598,17	-	29.598,17
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	261.590,25		261.590,25
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	113.804,79		113.804,79
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-		-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04		375.395,04
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-			
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	380.000,00	-	380.000,00	375.395,04	-	375.395,04
	VALOR TOTAL	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	409.598,17	-	409.598,17	404.993,21	-	404.993,21



Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 5

Período 01/04/2011 a 30/04/2011

Hora : 10:09

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMEDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5

Empreendimento : FAVELA BARÃO DE ANTONINA

Nº do Contrato : 21/2010

Contratada : SCHAHIN

Valor (R\$) 17.508.222,37

Prazo : 30 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	86.806,41	60,00	86.806,41	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	28.600,23	9,58	0,00	0,00	28.600,23	9,58
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	187.094,90	11,63	0,00	0,00	187.094,90	11,63

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	215.695,13	86.806,41	302.501,54
	BDI (35,00%)	75.493,29	30.382,23	105.875,52	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	291.188,42	117.188,64	408.377,06	

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj. Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

OBRA BARÃO DE ANTONINA – LOTE 15

ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5

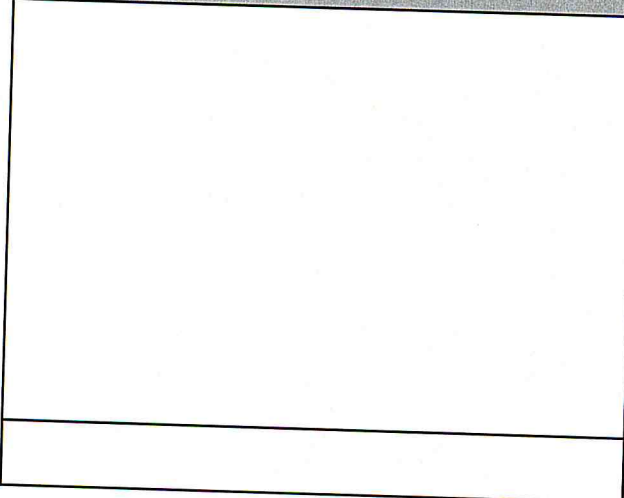


Foto 6

