



## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nova Jaguaré  
07.11 Julho

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 69  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 11:10

Programa:	BAIRRO LEGAL	Sub-Programa:	BAIRRO LEGAL
Projeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS - BAIRRO LEGAL	Lote:	EXEC. OBRAS - FAV.NOVA JAGUARÉ E VILA NILO

Processo :	2003-0.307.958-0	Empreendimento :	FAVELA NOVA JAGUARÉ
Nº do Contrato :	15/2004	Contratada :	SCHAHIN
Valor (R\$) :	132.504.652,58	Prazo :	72 (meses)
Data Base :	01/04/2004	Início/Término :	17/11/2005 a 17/11/2011

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	1.022,85	0,01%	2.045,70	0,01%	3.068,55	0,02%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	226.685,66	2,15%	1.734,51	0,02%	228.420,17	2,16%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	17.009,34	0,30%	26.041,20	0,46%	43.050,54	0,76%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	282.317,53	6,01%	282.317,53	6,01%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	143.978,39	2,59%	790.145,03	14,20%	934.123,42	16,79%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	219.327,17	6,88%	219.327,17	6,88%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	90.804,70	1,61%	11.671,01	0,21%	102.475,71	1,81%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	190.961,06	6,83%	294.799,21	10,54%	485.760,27	17,37%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	94.369,54	12,52%	0,00	0,00%	94.369,54	12,52%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	147.924,54	0,39%	147.924,54	0,39%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	14.938,88	1,46%	14.938,88	1,46%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	764.831,54	1.790.944,78	2.555.776,32
	BDI (35,00%)	267.691,03	626.830,66	894.521,69
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.032.522,57	2.417.775,44	3.450.298,01

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	644.810,34
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	644.810,34



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 69

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:36

Programa : BAIRRO LEGAL  
Projeto : EXECUÇÃO DE OBRAS - BAIRRO LEGAL

Sub\_Programa : BAIRRO LEGAL  
Lote : EXEC.OBRAS-FAV. NOVA JAGUARÉ E VILA NILO

Processo : 2003-0.307.958-0  
Nº do Contrato : 15/2004  
Valor (R\$) : 132.504.652,58  
Data Base : 01/04/2004

Empreendimento : FAVELA NOVA JAGUARÉ  
Contratada : SCHAHIN  
Prazo : 72 (meses)  
Início/Término : 17/11/2005 a 17/11/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	1.022,85	0,01	14.003.879,65	99,97	14.004.902,50	99,97
020000	TERRAPLENAGEM	226.685,66	2,15	10.257.637,70	97,14	10.484.323,36	99,28
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	5.238.329,48	88,34	5.238.329,48	88,34
050000	DRENAGEM PÚBLICA	17.009,34	0,30	5.530.837,36	98,00	5.547.846,70	98,30
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	4.614.298,18	98,25	4.614.298,18	98,25
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	143.978,39	2,59	4.782.405,72	85,95	4.926.384,11	88,54
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	2.970.448,16	93,13	2.970.448,16	93,13
100000	DEMOLIÇÃO	90.804,70	1,61	5.491.995,81	97,09	5.582.800,51	98,69
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	190.961,06	6,83	1.665.549,64	59,54	1.856.510,70	66,37
120000	PAISAGISMO	94.369,54	12,52	643.345,80	85,37	737.715,34	97,89
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	37.275.833,55	99,30	37.275.833,55	99,30
140000	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00	1.026.368,96	100,0	1.026.368,96	100,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	745.728,11	100,0	745.728,11	100,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	Sub Total	764.831,54		94.246.658,12		95.011.489,66	
	BDI (35,00%)	267.691,03		32.986.330,05		33.254.021,08	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.032.522,57		127.232.988,17		128.265.510,74	
<b>CALCULO FINAL DE REAJUSTE</b>							
	Reajuste Econômico Definitivo	644.810,34					
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00					
	Valor Total do Reajuste (R\$)	644.810,34					



**SCHAHIN ENGENHARIA**  
**LOTE 7 - NOVA JAGUARÉ e VILA NILO**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		n°	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	69	01 a 31/07/2011	764.831,54
02	B.D.I. (35 %)			267.691,03
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>1.032.522,57</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 69 (julho/11)	69	01 a 31/07/2011	644.810,34
<b>Subtotal (03)</b>				<b>644.810,34</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>69</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>1.677.332,91</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn ABR11	Po	Reajuste	Total Pn ABR11
.00	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ e VL. NILO (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 07 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ e VL. NILO (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.033.140,94	645.196,52	1.678.337,46	1.032.522,57	644.810,34	1.677.332,91
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 07 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.033.140,94	645.196,52	1.678.337,46	1.032.522,57	644.810,34	1.677.332,91
.03	VALOR NO MÊS - NOVA JAGUARÉ (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - VL.NILO (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 07 (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 07 (CDHU)	-	-	-	-	-	-
.02	VALOR NO MÊS - VL. NILO (CEF)	-	-	-	-	-	-
.02	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - VL.NILO (CEF)	-	-	-	-	-	-
.02	VALOR TOTAL - VL.NILO (CEF)	-	-	-	-	-	-
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>1.033.140,94</b>	<b>645.196,52</b>	<b>1.678.337,46</b>	<b>1.032.522,57</b>	<b>644.810,34</b>	<b>1.677.332,91</b>



## OBRA JAGUARÉ – LOTE 07

### ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Área de Lazer

Foto 2



Área de lazer e Muros de arrimo

Foto 3



Pavimentação de Sistema Viário.

Foto 4



Muro de Contenção

Foto 5



Preparo de talude para projetado

Foto 6



Revestimento externo



São Francisco  
07/11



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 14:45

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 02 - SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA
Processo :	2010-0.046.875-1	Empreendimento :	SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA
Nº do Contrato :	12/2010	Contratada :	EIT - SANTA BÁRBARA
Valor (R\$) :	127.375.367,04	Prazo :	30 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	18/10/2010 a 18/04/2013

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	2.097.232,04	19,23%	3.850.099,06	35,31%	5.947.331,10	54,54%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	5.180,57	0,29%	13.475,94	0,74%	18.656,51	1,03%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	197.733,12	5,94%	339.248,85	10,20%	536.981,97	16,14%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	1.016,87	0,05%	1.016,87	0,05%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	5.596,00	1,20%	5.596,00	1,20%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	530.901,86	6,41%	530.901,86	6,41%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	368.844,51	9,97%	368.844,51	9,97%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	53.611,92	1,25%	53.611,92	1,25%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	269.170,22	0,62%	1.892.939,99	4,36%	2.162.110,21	4,98%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	92.399,35	2,54%	368.938,01	10,14%	461.337,36	12,68%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	131.663,29	4,90%	362.553,87	13,49%	494.217,16	18,39%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	21.471,19	35,56%	13.222,56	21,90%	34.693,75	57,46%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	1.518.484,03	39,70%	1.991.963,43	52,08%	3.510.447,46	91,78%
30.00.00	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31.00.00	ENSAIOS AMBIENTAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38.00.00	EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00%	133.512,31	14,98%	133.512,31	14,98%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	4.333.333,81		9.925.925,18		14.259.258,99	
	BDI (35,00%)	1.516.666,83		3.474.073,78		4.990.740,61	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	5.850.000,64		13.399.998,96		19.249.999,60	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO			
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00	
Diferença de Reaj.Econômico		0,00	
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00	





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 09:58

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 02 - SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA

Processo : 2010-0.046.875-1  
Nº do Contrato : 12/2010  
Valor (R\$) : 127.375.367,04  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : SÃO FRANCISCO 2ª ETAPA  
Contratada : EIT-STA BARBARA  
Prazo : 30 (meses)  
Início/Término : 18/10/2010 a 18/04/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	629.517,81	60,00	629.517,81	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	2.097.232,04	19,23	5.951.676,35	54,58	8.048.908,39	73,81
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	5.180,57	0,29	23.402,63	1,29	28.583,20	1,58
050000	DRENAGEM PÚBLICA	197.733,12	5,94	1.276.388,26	38,37	1.474.121,38	44,31
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	614.515,55	29,79	614.515,55	29,79
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	14.987,20	3,23	14.987,20	3,23
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.987.854,06	24,02	1.987.854,06	24,02
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	544.232,45	14,71	544.232,45	14,71
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	53.611,92	1,25	53.611,92	1,25
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	269.170,22	0,62	2.594.528,59	5,97	2.863.698,81	6,58
140000	EQUIPE DE APOIO	92.399,35	2,54	654.916,84	18,01	747.316,19	20,58
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	131.663,29	4,90	369.271,38	13,74	500.934,67	18,64
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	21.471,19	35,56	23.662,02	39,19	45.133,21	74,75
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	1.518.484,03	39,70	2.286.738,68	59,79	3.805.222,71	99,48
300000	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	ENSAIOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	233.929,49	26,24	233.929,49	26,24

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	4.333.333,81	17.259.233,23	21.592.567,04
	BDI (35,00%)		1.516.666,83	6.040.731,59	7.557.398,42
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		5.850.000,64	23.299.964,82	29.149.965,46

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

**CONSÓRCIO EIT - SANTA BÁRBARA 2009**  
**Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011**  
**SÃO FRANCISCO - COMPLEMENTAÇÃO**  
**LOTE 02**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	01 a 31/07/2011	4.333.333,81
02	B.D.I. (35 %)			1.516.666,83
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>5.850.000,64</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)			0,00
<b>Subtotal (03)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>10</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>5.850.000,64</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (CEF)	-	-	-	-	-	-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (CEF)	640.000,00	-	640.000,00	-	-	-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (CEF)	-	-	-	-	-	-
02	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (CEF)	960.000,00	-	960.000,00	-	-	-
02	<b>CEF TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	-	<b>1.600.000,00</b>	-	-	-
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - VALOR NO MÊS (FUNDO DE SANEAMENTO)	2.340.000,43	-	2.340.000,43	-	-	-
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - STA BÁRBARA - SALDO DO MÊS ANTERIOR (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	2.340.000,25	-	2.340.000,25
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - VALOR NO MÊS (FUNDO DE SANEAMENTO)	3.510.000,61	-	3.510.000,61	-	-	-
.03	SÃO FRANCISCO COMPL. - EIT - SALDO DO MÊS ANTERIOR (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	3.510.000,39	-	3.510.000,39
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>5.850.001,04</b>	-	<b>5.850.001,04</b>	<b>5.850.000,64</b>	-	<b>5.850.000,64</b>
	<b>SALDO ATUAL DE EMPENHO</b>	<b>7.450.001,04</b>	-	<b>7.450.001,04</b>	<b>5.850.000,64</b>	-	<b>5.850.000,64</b>



## OBRA SÃO FRANCISCO – LOTE 02

### ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Provisão 6A: UH em andamento-Revestimento externo.

Foto 2



Provisão 6B: UH em andamento -Estrutura da escada.

Foto 3



Parque Linear: Drenagem no talude do Vale da Inca

Foto 4



Parque Linear: Canalização de Córrego

Foto 5



Quadras 3 e 4: Terraplenagem do Sistema Viário

Foto 6



Parque Linear: Demolição de barracos





## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA
Processo :	2010-0.046.881-6	Empreendimento :	CINCO DE JULHO
Nº do Contrato :	24/2010	Contratada :	FALEIROS / HE
Valor (R\$) :	4.478.766,88	Prazo :	12 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	13.247,94	35,00%	13.247,94	35,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	38.622,82	27,94%	38.622,82	27,94%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	410.161,11	29,11%	0,00	0,00%	410.161,11	29,11%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	410.161,11		51.870,76		462.031,87	
	BDI (35,00%)	143.556,38		18.154,75		161.711,13	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	553.717,49		70.025,51		623.743,00	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO			
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00	
Diferença de Reaj.Econômico		0,00	
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00	

**CONSÓRCIO FALEIROS/ HE**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA**  
**LOTE 03**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	451.790,45
02	B.D.I. (35 %)			158.126,64
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>609.917,09</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>609.917,09</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	17.130,00	-	17.130,00	17.121,51	-	17.121,51
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	282.400,00	-	282.400,00	282.395,92	-	282.395,92
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	11.596,91	-	11.596,91	11.540,29	-	11.540,29
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	311.057,72	-	311.057,72
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	16.460,00	-	16.460,00	16.450,07	-	16.450,07
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	271.330,00	-	271.330,00	271.321,57	-	271.321,57
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	11.135,87	-	11.135,87	11.087,73	-	11.087,73
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	298.859,37	-	298.859,37
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	610.052,78	-	610.052,78	609.917,09	-	609.917,09
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	610.052,78	-	610.052,78	609.917,09	-	609.917,09





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:00

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6  
Nº do Contrato : 24/2010  
Valor (R\$) : 4.478.766,88  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA CINCO DE JULHO  
Contratada : FALEIROS / HE  
Prazo : 12 (meses)  
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	22.710,74	60,00	22.710,74	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	38.622,82	27,94	38.622,82	27,94
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO	410.161,11	29,11	0,00	0,00	410.161,11	29,11
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	410.161,11	61.333,56	471.494,67
	BDI (35,00%)		143.556,38	21.466,72	165.023,10
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		553.717,49	82.800,28	636.517,77

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA - FAVELA 05 DE JULHO - LOTE 03**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área.

Foto 2



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área

Foto 3



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área

Foto 4



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área

Foto 5



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área

Foto 6



CORREGO CANGUEIRAS.Limpeza da área





## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

*NOVE DE JULHO*  
*02/11*

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo	: 2010-0.046.881-6	Empreendimento	: NOVE DE JULHO
Nº do Contrato	: 24/2010	Contratada	: FALEIROS / HE
Valor (R\$)	: 5.686.240,55	Prazo	: 12 (meses)
Data Base	: 01/08/2010	Início/Término	: 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	3.330,74	7,00%	3.330,74	7,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	16.761,50	5,36%	34.315,19	10,98%	51.076,69	16,34%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	16.761,50		37.645,93		54.407,43	
	BDI (35,00%)	5.866,52		13.176,06		19.042,58	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	22.628,02		50.821,99		73.450,01	

<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>			
	Reajuste Econômico Definitivo	0,00	
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00	
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00	



**CONSÓRCIO FALEIROS/ HE**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA**  
**LOTE 03**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações		01 a 31/07/2011	451.790,45
02	B.D.I. (35 %)			158.126,64
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>609.917,09</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)	08	01 a 31/07/2011	0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>609.917,09</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	17.130,00	-	17.130,00	17.121,51	-	17.121,51
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	282.400,00	-	282.400,00	282.395,92	-	282.395,92
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	11.596,91	-	11.596,91	11.540,29	-	11.540,29
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	311.057,72	-	311.057,72
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	16.460,00	-	16.460,00	16.450,07	-	16.450,07
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	271.330,00	-	271.330,00	271.321,57	-	271.321,57
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	11.135,87	-	11.135,87	11.087,73	-	11.087,73
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	298.859,37	-	298.859,37
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>610.052,78</b>	-	<b>610.052,78</b>	<b>609.917,09</b>	-	<b>609.917,09</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>610.052,78</b>	-	<b>610.052,78</b>	<b>609.917,09</b>	-	<b>609.917,09</b>



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:01

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6  
Nº do Contrato : 24/2010  
Valor (R\$) : 5.686.240,55  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA NOVE DE JULHO  
Contratada : FALEIROS / HE  
Prazo : 12 (meses)  
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	28.549,20	60,00	28.549,20	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	16.761,50	5,36	34.315,19	10,98	51.076,69	16,34
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	Valor Anterior (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
Sub Total		16.761,50	62.864,39	79.625,89
BDI (35,00%)		5.866,52	22.002,51	27.869,03
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		22.628,02	84.866,90	107.494,92


CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA 9 DE JULHO – LOTE 03**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1

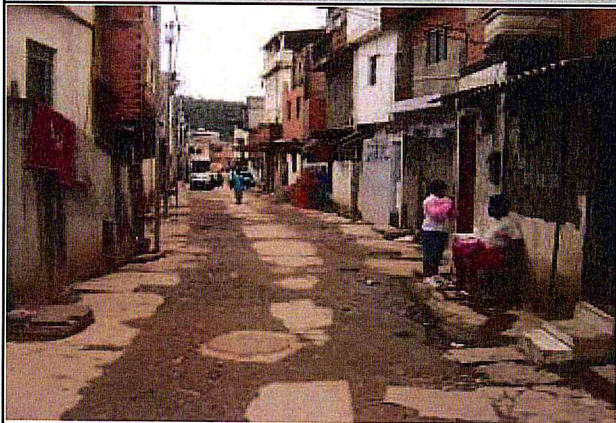

Vista Geral da Área

Foto 2




Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4

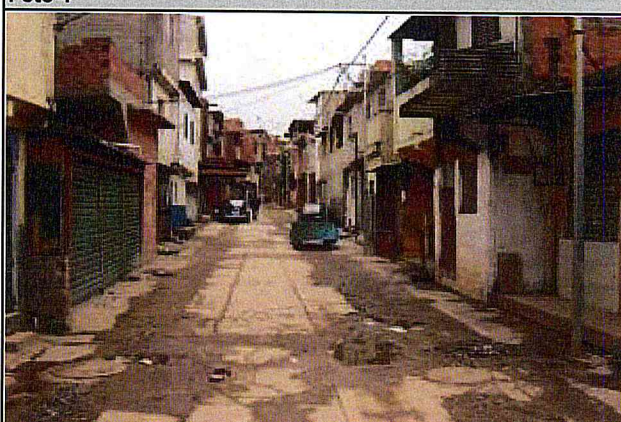

Vista Geral da Área

Foto 5


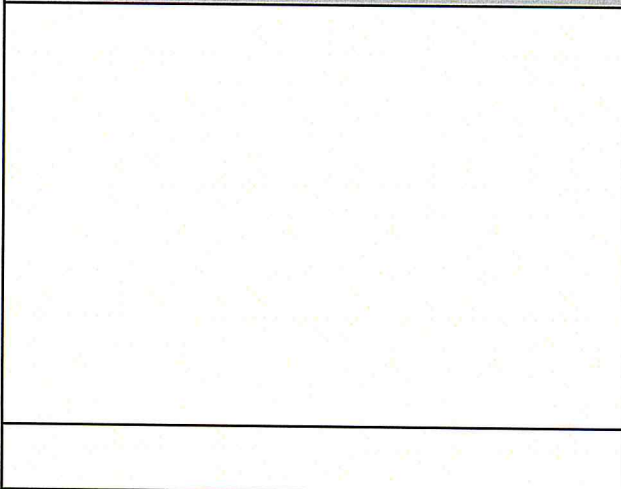


Foto 6



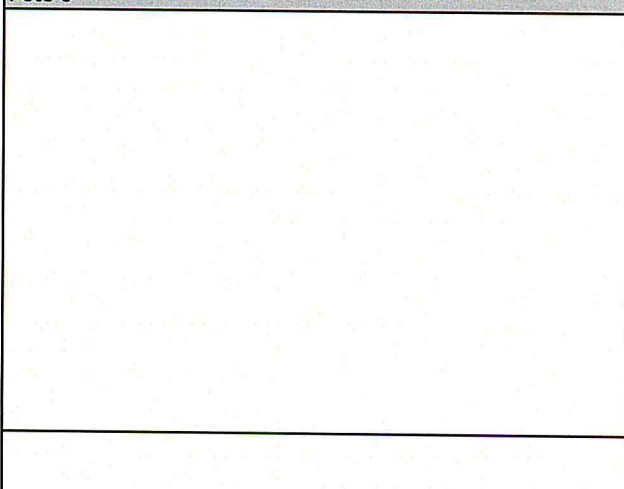

Vitotoma  
02/11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA
Processo :	2010-0.046.881-6	Empreendimento :	DOIS DE MAIO
Nº do Contrato :	24/2010	Contratada :	FALEIROS / HE
Valor (R\$) :	13.835.838,63	Prazo :	12 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	90.122,11	64,18%	90.122,11	64,18%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	26.215,44	8,47%	26.215,44	8,47%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	292.124,34	32,97%	292.124,34	32,97%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	3.519,18	0,68%	3.519,18	0,68%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	84.902,08	8,75%	84.902,08	8,75%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	18.260,36	2,51%	58.982,30	8,11%	77.242,66	10,62%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	6.607,48	3,31%	0,00	0,00%	6.607,48	3,31%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	24.867,84	555.865,45	580.733,29
	BDI (35,00%)	8.703,74	194.552,89	203.256,63
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	33.571,58	750.418,34	783.989,92

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



**CONSÓRCIO FALEIROS/ HE**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA**  
**LOTE 03**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	451.790,45
02	B.D.I. (35 %)			158.126,64
	<b>Subtotal (01+02)</b>			609.917,09
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			0,00
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>609.917,09</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	17.130,00	-	17.130,00	17.121,51	-	17.121,51
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	282.400,00	-	282.400,00	282.395,92	-	282.395,92
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	11.596,91	-	11.596,91	11.540,29	-	11.540,29
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	311.057,72	-	311.057,72
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	16.460,00	-	16.460,00	16.450,07	-	16.450,07
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	271.330,00	-	271.330,00	271.321,57	-	271.321,57
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	11.135,87	-	11.135,87	11.087,73	-	11.087,73
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	298.859,37	-	298.859,37
.00	PMSP TOTAL	-	-	-	-	-	-
.03	FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL	610.052,78	-	610.052,78	609.917,09	-	609.917,09
	VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO	610.052,78	-	610.052,78	609.917,09	-	609.917,09





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:00

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6  
Nº do Contrato : 24/2010  
Valor (R\$) : 13.835.838,63  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : DOIS DE MAIO  
Contratada : FALEIROS / HE  
Prazo : 12 (meses)  
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	69.916,14	60,00	69.916,14	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	90.122,11	64,18	90.122,11	64,18
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	26.215,44	8,47	26.215,44	8,47
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	292.124,34	32,97	292.124,34	32,97
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	3.519,18	0,68	3.519,18	0,68
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	84.902,08	8,75	84.902,08	8,75
140000	EQUIPE DE APOIO	18.260,36	2,51	62.481,44	8,59	80.741,80	11,10
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	6.607,48	3,31	0,00	0,00	6.607,48	3,31
190000	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	24.867,84	629.280,73	654.148,57
	BDI (35,00%)		8.703,74	220.248,23	228.951,97
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		33.571,58	849.528,96	883.100,54

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA - FAVELA VITOTOMA MASTROROZA – LOTE 03**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Foto Geral da Área

Foto 2



Foto Geral da Área

Foto 3



Foto Geral da Área

Foto 4



Foto Geral da Área

Foto 5



Foto Geral da Área

Foto 6



Foto Geral da Área





## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

*Nota de Medição  
02/11*

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo	: 2010-0.046.881-6	Empreendimento	: VITOTOMA
Nº do Contrato	: 24/2010	Contratada	: FALAIROS / HE
Valor (R\$)	: 4.885.676,44	Prazo	: 12 (meses)
Data Base	: 01/08/2010	Início/Término	: 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	120.467,43	40,64%	120.467,43	40,64%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	0,00		120.467,43		120.467,43	
	BDI (35,00%)	0,00		42.163,60		42.163,60	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		162.631,03		162.631,03	

<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>			
	Reajuste Econômico Definitivo	0,00	
	Diferença de Reaj. Econômico	0,00	
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00	

**CONSÓRCIO FALEIROS/ HE**

Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

**DOIS DE MAIO, CINCO DE JULHO, NOVE DE JULHO, VITOTOMA  
LOTE 03**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	451.790,45
02	B.D.I. (35 %)			158.126,64
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>609.917,09</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>609.917,09</b>



DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 03 (PMSP) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	17.130,00	-	17.130,00	17.121,51	-	17.121,51
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	282.400,00	-	282.400,00	282.395,92	-	282.395,92
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	11.596,91	-	11.596,91	11.540,29	-	11.540,29
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FALEIROS	311.126,91	-	311.126,91	311.057,72	-	311.057,72
.03	VALOR NO MÊS - DOIS DE MAIO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	16.460,00	-	16.460,00	16.450,07	-	16.450,07
.03	VALOR NO MÊS - CINCO DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	271.330,00	-	271.330,00	271.321,57	-	271.321,57
.03	VALOR NO MÊS - NOVE DE JULHO (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	11.135,87	-	11.135,87	11.087,73	-	11.087,73
.03	VALOR NO MÊS - VITOTOMA (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 03 (FUNDO DE SANEAMENTO) - H.E.	298.925,87	-	298.925,87	298.859,37	-	298.859,37
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>610.052,78</b>	-	<b>610.052,78</b>	<b>609.917,09</b>	-	<b>609.917,09</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>610.052,78</b>	-	<b>610.052,78</b>	<b>609.917,09</b>	-	<b>609.917,09</b>



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:02

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 3 - 2MAIO, 5JULHO, 9JULHO, VITOTOMA

Processo : 2010-0.046.881-6  
Nº do Contrato : 24/2010  
Valor (R\$) : 4.885.676,44  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA VITOTOMA  
Contratada : FALEIROS / HE  
Prazo : 12 (meses)  
Início/Término : 22/12/2010 a 22/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	120.467,43	40,64	120.467,43	40,64
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	0,00	120.467,43	120.467,43
	BDI (35,00%)	0,00		42.163,60	42.163,60
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00		162.631,03	162.631,03

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



OBRA - FAVELA DOIS DE MAIO / 2º ETAPA - LOTE 3  
ANDAMENTO DAS OBRAS

Foto 1



Bloco 6 : Alvenaria do pavimento terreo

Foto 2



Bloco 6 : Alvenaria do pavimento terreo

Foto 3



Bloco 6 : Alvenaria do pavimento terreo

Foto 4



Bloco 6 : Montagem da forma da laje e ferragem

Foto 5



Bloco 6 : Escoramento da laje

Foto 6



Bloco 6 : Concreto da laje



*Corrego da Mina  
07/11*



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

### Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA CÓRREGO DA MINA
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	29.252.682,37	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	14.459,67	3,20%	55.267,72	12,25%	69.727,39	15,45%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	2.488,78	9,52%	2.488,78	9,52%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	14.459,67	57.756,50	72.216,17
	BDI (35,00%)	5.060,88	20.214,76	25.275,64
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	19.520,55	77.971,26	97.491,81

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES

Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,  
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL  
LOTE 14

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	01 a 31/07/2011	1.716.097,34
02	B.D.I. (35 %)			600.634,05
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>2.316.731,39</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>10</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>2.316.731,39</b>

**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**  
**LOTE 14**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	658.915,43	-	658.915,43
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	13.664,39	-	13.664,39
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	579,27	-	579,27
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	948.552,89	-	948.552,89
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	1.621.711,98	-	1.621.711,98
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	282.392,32	-	282.392,32
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	5.856,16	-	5.856,16
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	248,26	-	248,26
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	406.522,67	-	406.522,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	695.019,41	-	695.019,41
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:06

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Empreendimento : FAVELA CORREGO DA MINA

Nº do Contrato : 14/2010

Contratada : CONS. GOMES-FM

Valor (R\$) : 29.252.682,37

Prazo : 18 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	122.046,07	50,00	122.046,07	50,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	14.459,67	3,20	90.542,71	20,07	105.002,38	23,27
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	2.488,78	9,52	2.488,78	9,52
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	215.077,56	229.537,23
	BDI (35,00%)	5.060,88	75.277,11	80.337,99
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	19.520,55	290.354,67	309.875,22


CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj. Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA CórREGO DA MINA – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1

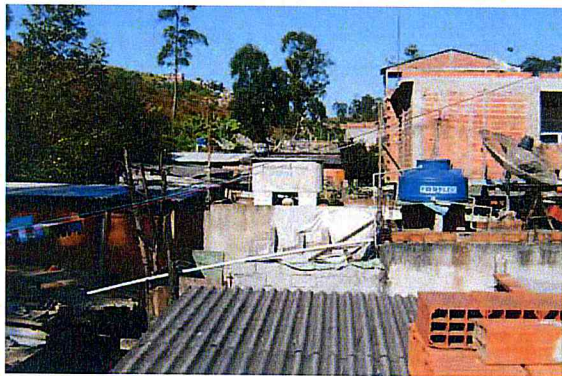

Vista parcial

Foto 2



Vista parcial

Foto 3



Vista parcial

Foto 4



Vista parcial

Foto 5



Vista parcial

Foto 6



Vista parcial



Bamburrall

07.11



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA BAMBURRAL
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	43.497.589,57	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	37.087,34	10,00%	37.087,34	10,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	185.872,46	3,74%	424.148,78	8,53%	610.021,24	12,26%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	6.269,25	0,56%	6.269,25	0,56%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	309.834,75	9,80%	1.533.917,74	48,52%	1.843.752,49	58,32%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	23.492,23	3,82%	23.492,23	3,82%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	43.361,38	6,37%	170.714,05	25,09%	214.075,43	31,46%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	108.603,36	7,95%	108.603,36	7,95%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	67.141,60	2,38%	67.141,60	2,38%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	197.868,60	75,97%	197.868,60	75,97%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	158.196,41	20,49%	478.894,74	62,03%	637.091,15	82,52%
39.00.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	697.265,00		3.048.137,69		3.745.402,69	
	BDI (35,00%)	244.042,75		1.066.848,17		1.310.890,92	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	941.307,75		4.114.985,86		5.056.293,61	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00

**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,**  
**CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL**  
**LOTE 14**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	01 a 31/07/2011	1.716.097,34
02	B.D.I. (35 %)			600.634,05
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>2.316.731,39</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>10</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>2.316.731,39</b>



**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**  
**LOTE 14**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	658.915,43	-	658.915,43
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	13.664,39	-	13.664,39
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	579,27	-	579,27
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	948.552,89	-	948.552,89
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	1.621.711,98	-	1.621.711,98
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	282.392,32	-	282.392,32
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	5.856,16	-	5.856,16
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	248,26	-	248,26
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	406.522,67	-	406.522,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	695.019,41	-	695.019,41
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:05

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Nº do Contrato : 14/2010

Valor (R\$) : 43.497.589,57

Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA BAMBURRAL

Contratada : CONS. GOMES-FM

Prazo : 18 (meses)

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	222.524,04	60,00	222.524,04	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	185.872,46	3,74	424.148,78	8,53	610.021,24	12,20
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	6.269,25	0,56	6.269,25	0,50
100000	DEMOLIÇÃO	309.834,75	9,80	1.656.707,15	52,41	1.966.541,90	62,20
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	23.492,23	3,82	23.492,23	3,80
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	43.361,38	6,37	223.846,37	32,90	267.207,75	39,20
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	199.337,64	14,59	199.337,64	14,50
190000	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO	0,00	0,00	67.141,60	2,38	67.141,60	2,30
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	215.776,61	82,84	215.776,61	82,80
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	158.196,41	20,49	479.189,41	62,07	637.385,82	82,50
390000	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	697.265,00	3.518.433,08	4.215.698,08
	BDI (35,00%)	244.042,75		1.231.451,54	1.475.494,29
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	941.307,75		4.749.884,62	5.691.192,37

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA BAMBURRAL – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Demolição: - Execução em andamento.

Foto 2



Demolição: - Execução em andamento.

Foto 3



Demolição: - Execução em andamento.

Foto 4



Vista Parcial: Abertura de via de acesso ao canteiro.

Foto 5



Vista Parcial: Casa da Conversa e Canteiro.

Foto 6



Vista Parcial: Estoque de materiais de drenagem.





## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo	: 2010-0.046.947-2	Empreendimento	: FAVELA CARINA ARI
Nº do Contrato	: 14/2010	Contratada	: CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$)	: 345.385,86	Prazo	: 18 (meses)
Data Base	: 01/08/2010	Início/Término	: 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	418,09	20,00%	418,09	20,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	13.513,48	89,53%	13.513,48	89,53%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	12.824,05	20,27%	12.824,05	20,27%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	17.857,90	26,24%	17.857,90	26,24%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	2.417,34	17,47%	2.417,34	17,47%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	384,94	0,48%	384,94	0,48%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	2.488,78	100,00%	2.488,78	100,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		TOTAL MEDIDO	0,00	49.904,58		49.904,58	
		BDI (35,00%)	0,00	17.466,59		17.466,59	
		TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	67.371,17		67.371,17	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,**  
**CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL**  
**LOTE 14**

<b>Quadro Resumo</b>			
Código	Discriminação	Medição	
		nº	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	1.716.097,34
02	B.D.I. (35 %)		600.634,05
<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>2.316.731,39</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)		0,00
<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>10</b>	<b>2.316.731,39</b>

**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**  
**LOTE 14**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	658.915,43	-	658.915,43
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	13.664,39	-	13.664,39
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	579,27	-	579,27
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	948.552,89	-	948.552,89
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	1.621.711,98	-	1.621.711,98
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	282.392,32	-	282.392,32
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	5.856,16	-	5.856,16
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	248,26	-	248,26
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	406.522,67	-	406.522,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	695.019,41	-	695.019,41
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:06

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2  
Nº do Contrato : 14/2010  
Valor (R\$) : 345.385,86  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA CARINA ARI  
Contratada : CONS. GOMES-FM  
Prazo : 18 (meses)  
Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	1.254,27	60,00	1.254,27	60,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	13.513,48	89,53	13.513,48	89,53
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	37.743,05	59,65	37.743,05	59,65
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	31.185,87	45,82	31.185,87	45,82
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	2.417,34	17,47	2.417,34	17,47
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	384,94	0,48	384,94	0,48
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	2.488,78	100,00	2.488,78	100,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	Valor Anterior (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
Sub Total		0,00	88.987,73	88.987,73
BDI (35,00%)		0,00	31.145,69	31.145,69
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		0,00	120.133,42	120.133,42

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA CARINA ARI – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Contenções: Execução de pilares.

Foto 2



Contenções: Execução de pilares.

Foto 3



Contenções: Execução de alvenaria.

Foto 4



Contenções: Execução de alvenaria.

Foto 5



Drenagem e esgoto: Execução em andamento.

Foto 6



Drenagem e esgoto: Execução em andamento.



Lidiane  
07/11



### Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA LIDIANE / SAMPAIO CORREA
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	35.995.035,83	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	529.902,95	13,42%	2.282.270,21	57,79%	2.812.173,16	71,20%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	287.594,08	7,83%	599.504,25	16,33%	887.098,33	24,16%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	7.482,48	1,65%	4.799,34	1,06%	12.281,82	2,70%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	220.284,00	1,87%	220.284,00	1,87%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	39.164,30	4,32%	94.962,56	10,48%	134.126,86	14,80%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	143.878,63	16,89%	143.878,63	16,89%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	8.213,99	21,10%	8.213,99	21,10%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	115.899,54	7,06%	37.798,57	2,30%	153.698,11	9,37%
30.00.00	QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	23.716,33	3,25%	137.028,09	18,78%	160.744,42	22,03%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	1.003.759,68		3.528.739,64		4.532.499,32	
	BDI (35,00%)	351.315,88		1.235.058,86		1.586.374,74	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.355.075,56		4.763.798,50		6.118.874,06	

<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00

**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**

Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

**LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,  
CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL  
LOTE 14**

Quadro Resumo			
Código	Discriminação	Medição	
		nº	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	1.716.097,34
02	B.D.I. (35 %)		600.634,05
	<b>Subtotal (01+02)</b>		<b>2.316.731,39</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)		0,00
	<b>Subtotal (03)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>10</b>	<b>2.316.731,39</b>



**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**  
**LOTE 14**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	658.915,43	-	658.915,43
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	13.664,39	-	13.664,39
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	579,27	-	579,27
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	948.552,89	-	948.552,89
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	1.621.711,98	-	1.621.711,98
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	282.392,32	-	282.392,32
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	5.856,16	-	5.856,16
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	248,26	-	248,26
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	406.522,67	-	406.522,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	695.019,41	-	695.019,41
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>





# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2

Empreendimento : FAVELA LIDIANE / SAMPAIO CORREA

Nº do Contrato : 14/2010

Contratada : CONS. GOMES-FM

Valor (R\$) 35.995.035,83

Prazo : 18 (meses)

Data Base : 01/08/2010

Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	173.192,90	60,00	173.192,90	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	529.902,95	13,42	2.340.448,65	59,26	2.870.351,60	72,00
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	287.594,08	7,83	599.504,25	16,33	887.098,33	24,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	7.482,48	1,65	4.799,34	1,06	12.281,82	2,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	220.284,00	1,87	220.284,00	1,87
140000	EQUIPE DE APOIO	39.164,30	4,32	173.819,84	19,18	212.984,14	23,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	143.878,63	16,89	143.878,63	16,89
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	26.426,48	67,88	26.426,48	67,88
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	115.899,54	7,06	37.798,57	2,30	153.698,11	9,00
300000	QUALIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	23.716,33	3,25	137.028,09	18,78	160.744,42	22,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	3.857.180,75	4.860.940,43
	BDI (35,00%)	1.003.759,68	1.350.013,23	1.701.329,11
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	1.355.075,56	5.207.193,98	6.562.269,54

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA LIDIANE – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



**Demolição:** Execução em andamento.

Foto 2



**Demolição:** Execução em andamento.

Foto 3



**Demolição:** Execução em andamento.

Foto 4



**Fundação:** Execução de estacas hélice contínua.

Foto 5



**Fundação:** Execução de estacas hélice contínua.

Foto 6




**Fundação:** Execução de estacas hélice contínua.



**OBRA LIDIANE 3R's – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

**Foto 1**

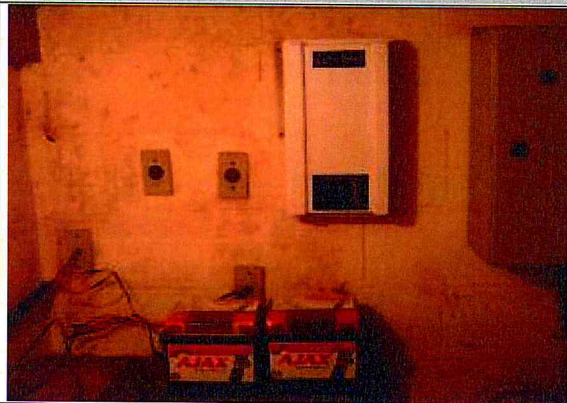

**Qualificação:** Central de luz de emergência.

**Foto 2**



**Urbanismo:** Execução da guarita.

**Foto 3**



**Urbanismo:** Preparação para execução da quadra.

**Foto 4**



**Urbanismo:** Vista parcial da ciclovia.

**Foto 5**



**Pintura:** Vista parcial dos blocos 11, 12 e 13.

**Foto 6**



**Urbanismo:** Vista parcial da ciclovia.





## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Gabi  
07.11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 10  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 14 - OBRAS LOTE 14
Processo :	2010-0.046.947-2	Empreendimento :	FAVELA GABI
Nº do Contrato :	14/2010	Contratada :	CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO - FM RODRIGUES
Valor (R\$) :	711.772,29	Prazo :	18 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor		Valor		Valor	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	612,99	20,00%	612,99	20,00%	1.225,98	40,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	23.488,14	25,98%	23.488,14	25,98%
12.00.00	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	28.886,82	35,45%	28.886,82	35,45%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	15.998,71	35,52%	15.998,71	35,52%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	612,99		68.986,66		69.599,65	
	BDI (35,00%)	214,54		24.145,31		24.359,85	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	827,53		93.131,97		93.959,50	

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO			
Reajuste Econômico	Definitivo	0,00	
Diferença de Reaj.Econômico		0,00	
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00	

**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011  
**LIDIANE/SAMPAIO CORREA, CÓRREGO DA MINA/RECANTO PARAISO,**  
**CARINA ARI, GABI, AREIÃO e BAMBURRAL**  
**LOTE 14**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	10	01 a 31/07/2011	1.716.097,34
02	B.D.I. (35 %)			600.634,05
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>2.316.731,39</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 10 (julho/2011)			0,00
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total a ser Liquidado</b>			<b>2.316.731,39</b>



**CONSÓRCIO GOMES LOURENÇO / F.M. RODRIGUES**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**  
**LOTE 14**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - AREIÃO (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - GABI (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 14 (PMSP) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	658.915,43	-	658.915,43
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	13.664,39	-	13.664,39
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	579,27	-	579,27
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	948.552,89	-	948.552,89
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - GOMES LOURENÇO	1.631.631,54	-	1.631.631,54	1.621.711,98	-	1.621.711,98
.03	VALOR NO MÊS - AREIÃO (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BAMBURRAL (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	282.392,32	-	282.392,32
.03	VALOR NO MÊS - CARINA ARI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - CÔRREGO DA MINA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	5.856,16	-	5.856,16
.03	VALOR NO MÊS - GABI (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	248,26	-	248,26
.03	VALOR NO MÊS - LIDIANE/SAMPAIO CORREA (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	406.522,67	-	406.522,67
.03	VALOR NO MÊS - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	-	-	-
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 14 (FUNDO DE SANEAMENTO) - FM RODRIGUES	699.270,67	-	699.270,67	695.019,41	-	695.019,41
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
.03	<b>FUNDO DE SANEAMENTO TOTAL</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>2.330.902,21</b>	-	<b>2.330.902,21</b>	<b>2.316.731,39</b>	-	<b>2.316.731,39</b>



## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 10

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:07

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 14 - OBRAS LOTE 14

Processo : 2010-0.046.947-2  
Nº do Contrato : 14/2010  
Valor (R\$) : 711.772,29  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA GABI  
Contratada : CONS. GOMES-FM  
Prazo : 18 (meses)  
Início/Término : 20/10/2010 a 20/04/2012

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	612,99	20,00	612,99	20,00	1.225,98	40,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	23.488,14	25,98	23.488,14	25,98
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	28.886,82	35,45	28.886,82	35,45
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	15.998,71	35,52	15.998,71	35,52

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	612,99	68.986,66	69.599,65
	BDI (35,00%)	214,54		24.145,31	24.359,85
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	827,53		93.131,97	93.959,50

CÁLCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA GABI – LOTE 14**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



**Demolição:** Vista parcial da área demolida.

Foto 2



**Demolição:** Vista parcial da área demolida.

Foto 3



**Drenagem:** Área a ser executada a rede.

Foto 4



**Drenagem:** Demarcação da área a ser executada a rede.

Foto 5



**Drenagem:** Execução em andamento.

Foto 6



**Drenagem:** Execução em andamento.



Ponte dos Remédios  
07/11



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

## Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:13

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO
Processo :	2010-0.046.954-5	Empreendimento :	FAVELA PONTE DOS REMÉDIOS
Nº do Contrato :	21/2010	Contratada :	SCHAHIN
Valor (R\$) :	63.790.865,23	Prazo :	30 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	102.226,50	19,34%	102.226,50	19,34%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	0,00	102.226,50	102.226,50
	BDI (35,00%)	0,00	35.779,27	35.779,27
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	138.005,77	138.005,77

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



**SCHAHIN ENGENHARIA**  
**LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA**  
**e PONTE DOS REMÉDIOS**  
 Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	57.200,46
02	B.D.I. (35 %)			20.020,16
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>77.220,62</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
<b>Subtotal (03)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>77.220,62</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	77.220,62	-	77.220,62
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	77.220,62	-	77.220,62
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:13

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5  
Nº do Contrato : 21/2010  
Valor (R\$) : 63.790.865,23  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA PONTE DOS REMÉDIOS  
Contratada : SCHAHIN  
Prazo : 30 (meses)  
Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	317.205,69	60,00	317.205,69	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	Valor Anterior (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
Sub Total		0,00	317.205,69	317.205,69
BDI (35,00%)		0,00	111.021,99	111.021,99
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		0,00	428.227,68	428.227,68

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA PONTE DOS REMÉDIOS – LOTE 15**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4




Vista Geral da Área

Foto 5



Vista Geral da Área

Foto 6

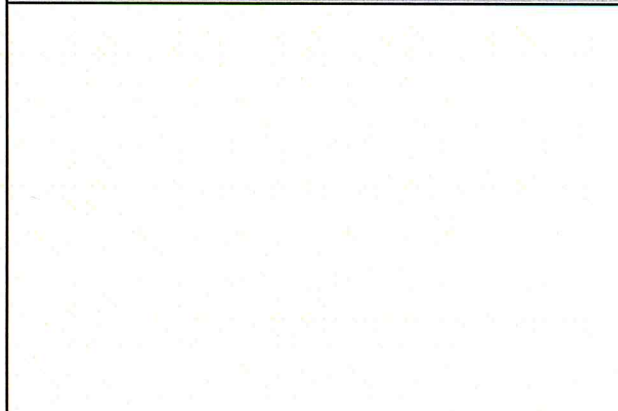



Diogo Pires  
02/11



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano

### Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº da Medição: 08

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO
Processo :	2010-0.046.954-5	Empreendimento :	FAVELA DIOGO PIRES
Nº do Contrato :	21/2010	Contratada :	SCHAHIN
Valor (R\$) :	22.809.999,33	Prazo :	30 (meses)
Data Base :	01/08/2010	Início/Término :	20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	28.600,23	9,58%	42.900,33	14,37%	71.500,56	23,95%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	352.540,06	21,92%	352.540,06	21,92%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	28.600,23		395.440,39		424.040,62	
	BDI (35,00%)	10.010,08		138.404,12		148.414,20	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	38.610,31		533.844,51		572.454,82	

<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



**SCHAHIN ENGENHARIA**  
**LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA**  
**e PONTE DOS REMÉDIOS**

Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	57.200,46
02	B.D.I. (35 %)			20.020,16
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>77.220,62</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
<b>Subtotal (03)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>77.220,62</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	77.220,62	-	77.220,62
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	77.220,62	-	77.220,62
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:12

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMEDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5  
Nº do Contrato : 21/2010  
Valor (R\$) : 22.809.999,33  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA DIOGO PIRES  
Contratada : SCHAHIN  
Prazo : 30 (meses)  
Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	113.393,52	60,00	113.393,52	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	28.600,23	9,58	42.900,33	14,37	71.500,56	23,95
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	352.540,06	21,92	352.540,06	21,92

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Valor Medido	Valor Anterior (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
Sub Total		28.600,23	508.833,91	537.434,14
BDI (35,00%)		10.010,08	178.091,84	188.101,92
TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)		38.610,31	686.925,75	725.536,06

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Valor
Reajuste Econômico Definitivo		0,00
Diferença de Reaj.Econômico		0,00
Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA DIOGO PIRES – LOTE 15**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


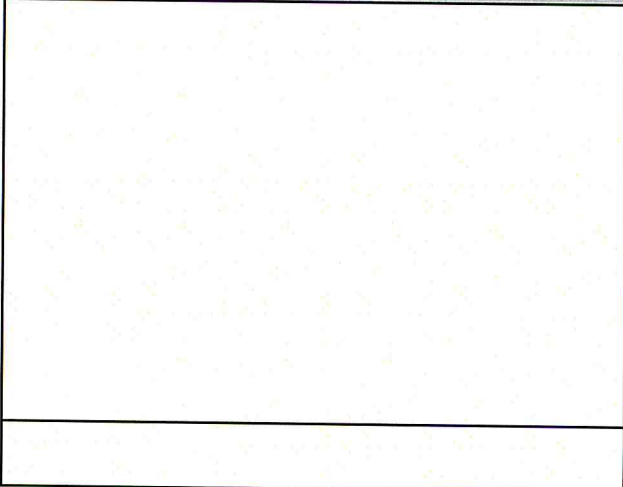


Foto 6



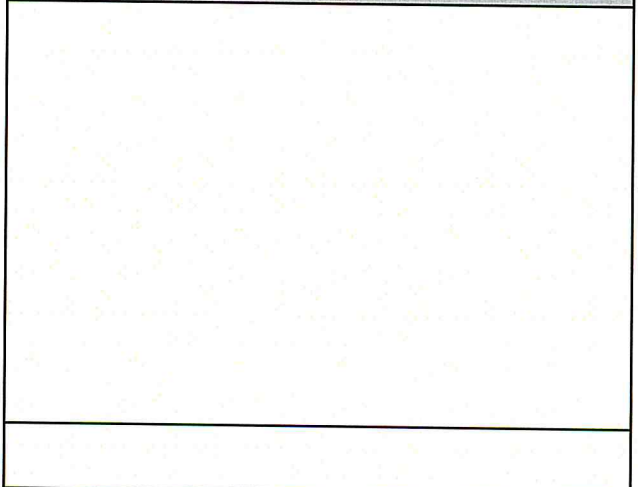

### Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 08  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:10

Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Sub-Programa:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Projeto:	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Lote:	LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMÉDIO

Processo	: 2010-0.046.954-5	Empreendimento	: FAVELA BARÃO DE ANTONINA
Nº do Contrato	: 21/2010	Contratada	: SCHAHIN
Valor (R\$)	: 17.508.222,37	Prazo	: 30 (meses)
Data Base	: 01/08/2010	Início/Término	: 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
		Medido	%	Anterior (R\$)	%	Acumulado (R\$)	%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	28.600,23	9,58%	63.876,42	21,40%	92.476,65	30,98%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	349.639,19	21,74%	349.639,19	21,74%
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	TOTAL MEDIDO	28.600,23		413.515,61		442.115,84	
	BDI (35,00%)	10.010,08		144.730,45		154.740,53	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	38.610,31		558.246,06		596.856,37	

<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>	Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	0,00



**SCHAHIN ENGENHARIA**  
**LOTE 15 - DIOGO PIRES, BARÃO DE ANTONINA**  
**e PONTE DOS REMÉDIOS**

Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO / 2011

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		n°	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	08	01 a 31/07/2011	57.200,46
02	B.D.I. (35 %)			20.020,16
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>77.220,62</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 08 (julho/2011)			0,00
<b>Subtotal (03)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>08</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>77.220,62</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn AGO11	Po	Reajuste	Total Pn AGO11
.00	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.00	VALOR TOTAL - LOTE 15 (PMSP)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR NO MÊS - BARÃO DE ANTONINA (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - DIOGO PIRES (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	38.610,31	-	38.610,31
.03	VALOR NO MÊS - PONTE DOS REMÉDIOS (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	-	-	-	77.220,62	-	77.220,62
.03	VALOR SALDO MÊS ANTERIOR - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	-	-	-
.03	VALOR TOTAL - LOTE 15 (FUNDO DE SANEAMENTO)	1.795.006,78	-	1.795.006,78	77.220,62	-	77.220,62
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>
	<b>VALOR ATUAL DE EMPENHO / MEDIÇÃO</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>-</b>	<b>1.795.006,78</b>	<b>77.220,62</b>	<b>-</b>	<b>77.220,62</b>



# Planilha de Medição

Data : 13/02/2012

Nº Medição: 8

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:10

Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Projeto : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Sub\_Programa : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS  
Lote : LOTE 15 - ANTONINA, DIOGO PIRES, REMEDIOS

Processo : 2010-0.046.954-5  
Nº do Contrato : 21/2010  
Valor (R\$) : 17.508.222,37  
Data Base : 01/08/2010

Empreendimento : FAVELA BARÃO DE ANTONINA  
Contratada : SCHAHIN  
Prazo : 30 (meses)  
Início/Término : 20/12/2010 a 20/06/2013

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	86.806,41	60,00	86.806,41	60,00
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	EQUIPE DE APOIO	28.600,23	9,58	85.800,69	28,74	114.400,92	38,33
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	349.639,49	21,74	349.639,49	21,74

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	522.246,59	550.846,82
	BDI (35,00%)	10.010,08	182.786,28	192.796,36
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	38.610,31	705.032,87	743.643,18

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	0,00
	Diferença de Reaj. Econômico		0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)		0,00



**OBRA BARÃO DE ANTONINA – LOTE 15**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Vista Geral da Área

Foto 2



Vista Geral da Área

Foto 3



Vista Geral da Área

Foto 4



Vista Geral da Área

Foto 5


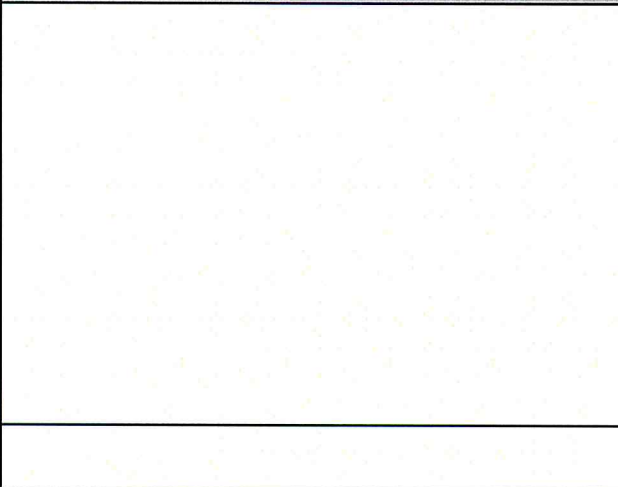


Foto 6



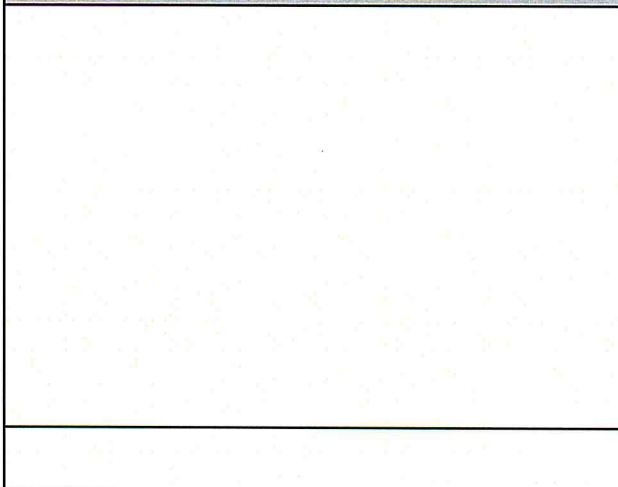

**Planilha de Medição**

Data : 22/02/2012

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 41  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	BAIRRO LEGAL	Sub-Programa:	BAIRRO LEGAL
Projeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS - PAT PROSANEAR	Lote:	EXEC. OBRAS - LOTE 13 - JD. GUARANI E TIRO AO POMBO
Processo :	2007-0.318.760-7	Empreendimento :	JD. GUARANI / BOA ESPERANÇA
Nº do Contrato :	07/2008	Contratada :	GOMES LOURENÇO
Valor (R\$) :	22.461.658,49	Prazo :	45 (meses)
Data Base :	01/01/2008	Início/Término :	06/03/2008 a 06/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04.00.00	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	TOTAL MEDIDO	0,00	0,00	0,00
	BDI (35,00%)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	217.763,54
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	217.763,54



**CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA**  
**Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO/2011**  
**TIRO AO POMBO e JD. GUARANI / BOA ESPERANÇA - LOTE 13**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	41	01 a 31/07/2011	984.056,66
02	B.D.I. (35 %)			344.419,82
<b>Subtotal (01+02)</b>				<b>1.328.476,48</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 41 (julho/2011)			364.666,79
<b>Subtotal (03)</b>				<b>364.666,79</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>41</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>1.693.143,27</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn JAN11	Po	Reajuste	Total Pn JAN11
.00	PMSP NO MES - TIRO AO POMBO			-			
.00	PMSP SALDO MES ANTERIOR - TIRO AO POMBO	37.318,16	10.243,83	47.561,99		146.903,25	146.903,25
.00	PMSP NO MÊS - JARDIM GUARANI -			-			
.00	PMSP SALDO MES ANTERIOR - JD. GUARANI	-		-		217.763,54	217.763,54
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	<b>37.318,16</b>	<b>10.243,83</b>	<b>47.561,99</b>	<b>-</b>	<b>364.666,79</b>	<b>364.666,79</b>
02	CEF NO MES - TIRO AO POMBO	800.000,00	-	800.000,00	535.166,67	-	535.166,67
02	CEF SALDO MES ANTERIOR - TIRO AO POMBO	56.626,80	-	56.626,80			
02	CEF NO MÊS - JARDIM GUARANI -	800.000,00	-	800.000,00	793.309,81	-	793.309,81
02	CEF SALDO MES ANTERIOR - JD. GUARANI	83.885,77	-	83.885,77			
02	<b>CEF TOTAL</b>	<b>1.740.512,57</b>	<b>-</b>	<b>1.740.512,57</b>	<b>1.328.476,48</b>	<b>-</b>	<b>1.328.476,48</b>
	<b>SALDO ATUAL DE EMPENHO</b>	<b>1.777.830,73</b>	<b>10.243,83</b>	<b>1.788.074,56</b>	<b>1.328.476,48</b>	<b>364.666,79</b>	<b>1.693.143,27</b>



## Planilha de Medição

Data : 22/02/2012

Nº Medição: 41

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 14:23

Programa : BAIRRO LEGAL  
Projeto : EXECUÇÃO DE OBRAS - PAT PROSANEAR

Sub\_Programa : BAIRRO LEGAL  
Lote : LOTE 13 - JD. GUARANI E TIRO AO POMBO

Processo : 2007-0.318.760-7

Empreendimento : JD. GUARANI / BOA ESPERANÇA

Nº do Contrato : 07/2008

Contratada : GOMES LOURENÇO

Valor (R\$) 22.461.658,49

Prazo : 45 (meses)

Data Base : 01/01/2008

Início/Término : 06/03/2008 a 06/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	36.749,42	99,48	36.749,42	99,48
020000	TERRAPLENAGEM	22.080,30	2,21	907.411,30	90,97	929.491,60	93,19
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	8.620,24	1,61	303.976,94	56,93	312.597,18	58,55
040000	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	18.504,90	74,66	18.504,90	74,66
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	637.142,89	99,79	637.142,89	99,79
070000	REDE DE ESGOTO	73.885,30	4,37	1.007.601,28	59,63	1.081.486,58	64,00
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	103.020,09	48,84	107.917,13	51,16	210.937,22	99,99
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	126.804,85	12,63	339.323,50	33,81	466.128,35	46,44
100000	DEMOLIÇÃO	39.460,66	3,51	957.221,20	85,07	996.681,86	88,58
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	3.911,81	1,50	200.232,39	76,90	204.144,20	78,41
120000	PAISAGISMO	0,00	0,00	17.958,58	6,36	17.958,58	6,36
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	177.882,03	2,96	5.375.878,37	89,51	5.553.760,40	92,48
140000	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00	446.613,29	100,0	446.613,29	100,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	506.482,58	77,98	506.482,58	77,98
190000	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	31.971,62	1,45	1.681.415,66	76,20	1.713.387,28	77,65
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	525.992,00	100,0	525.992,00	100,00
<b>CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO</b>							
	Sub Total	587.636,90		13.070.421,42		13.658.058,32	
	BDI (35,00%)	205.672,91		4.574.647,30		4.780.320,21	
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	793.309,81		17.645.068,72		18.438.378,53	
<b>CALCULO FINAL DE REAJUSTE</b>							
	Reajuste Econômico Definitivo	217.763,54					
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00					
	Valor Total do Reajuste (R\$)	217.763,54					



**OBRA JD. GUARANI – LOTE 13**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



Rua Geraldo Benedito da Silva: Muros de contenção.

Foto 2



Rua Geraldo Benedito da Silva: Readequações.

Foto 3



Rua Manuel Marques de Souza: Pavimentação.

Foto 4



Rua Projetada 2: Pavimentação.

Foto 5



Córrego Guarani: Rede de esgoto, canalização eixo 1.

Foto 6



Córrego Guarani: Muros de contenção eixo 1.





Tiro ao Pombo  
01.11

CONVÊNIO FUNDO DE SANEAMENTO

Nº da Medição: 41  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 10:09

Programa:	BAIRRO LEGAL	Sub-Programa:	BAIRRO LEGAL
Projeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS - PAT PROSANEAR	Lote:	EXEC. OBRAS - LOTE 13 - JD. GUARANI E TIRO AO POMBO
Processo :	2007-0.318.760-7	Empreendimento :	TIRO AO POMBO
Nº do Contrato :	07/2008	Contratada :	GOMES LOURENÇO
Valor (R\$) :	24.784.771,28	Prazo :	45 (meses)
Data Base :	01/01/2008	Início/Término :	06/03/2008 a 06/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido		Valor Anterior (R\$)		Valor Acumulado (R\$)	
			%		%		%
01.00.00	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.00.00	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04.00.00	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00.00	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00.00	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00.00	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00.00	READEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00.00	PAISAGISMO E PAISAGISMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00.00	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00.00	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.00.00	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.00.00	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.00.00	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		TOTAL MEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BDI (35,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO	Reajuste Econômico Definitivo	146.903,25
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00
	Valor Total do Reajuste (R\$)	146.903,25



**CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA**  
**Quadro Resumo do Valor a Faturar em JULHO/2011**  
**TIRO AO POMBO e JD. GUARANI / BOA ESPERANÇA - LOTE 13**

Quadro Resumo				
Código	Discriminação	Medição		
		nº	Período	Valor ( R\$ )
01	Serviços de Infra-estrutura e Edificações	41	01 a 31/07/2011	984.056,66
02	B.D.I. (35 %)			344.419,82
	<b>Subtotal (01+02)</b>			<b>1.328.476,48</b>
03	Reajuste definitivo referente medição nº 41 (julho/2011)			364.666,79
	<b>Subtotal (03)</b>			<b>364.666,79</b>
<b>Total a ser Liquidado</b>		<b>41</b>	<b>01 a 31/07/2011</b>	<b>1.693.143,27</b>

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE MEDIÇÃO - EMPENHO X MEDIÇÃO**

FONTE	ÁREA	EMPENHO			MEDIÇÃO		
		Po	Reajuste	Total Pn JAN11	Po	Reajuste	Total Pn JAN11
.00	PMSP NO MES - TIRO AO POMBO			-			
.00	PMSP SALDO MES ANTERIOR - TIRO AO POMBO	37.318,16	10.243,83	47.561,99		146.903,25	146.903,25
.00	PMSP NO MÊS - JARDIM GUARANI -			-			
.00	PMSP SALDO MES ANTERIOR - JD. GUARANI	-		-		217.763,54	217.763,54
.00	<b>PMSP TOTAL</b>	<b>37.318,16</b>	<b>10.243,83</b>	<b>47.561,99</b>	<b>-</b>	<b>364.666,79</b>	<b>364.666,79</b>
02	CEF NO MES - TIRO AO POMBO	800.000,00	-	800.000,00			
02	CEF SALDO MES ANTERIOR - TIRO AO POMBO	56.626,80	-	56.626,80	535.166,67	-	535.166,67
02	CEF NO MÊS - JARDIM GUARANI -	800.000,00	-	800.000,00			
02	CEF SALDO MES ANTERIOR - JD. GUARANI	83.885,77	-	83.885,77	793.309,81	-	793.309,81
02	<b>CEF TOTAL</b>	<b>1.740.512,57</b>	<b>-</b>	<b>1.740.512,57</b>	<b>1.328.476,48</b>	<b>-</b>	<b>1.328.476,48</b>
	<b>SALDO ATUAL DE EMPENHO</b>	<b>1.777.830,73</b>	<b>10.243,83</b>	<b>1.788.074,56</b>	<b>1.328.476,48</b>	<b>364.666,79</b>	<b>1.693.143,27</b>



# Planilha de Medição

Data : 22/02/2012

Nº Medição: 41

Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Hora : 14:24

Programa : BAIRRO LEGAL  
Projeto : EXECUÇÃO DE OBRAS - PAT PROSANEAR

Sub\_Programa : BAIRRO LEGAL  
Lote : LOTE 13 - JD. GUARANI E TIRO AO POMBO

Processo : 2007-0.318.760-7  
Nº do Contrato : 07/2008  
Valor (R\$) : 24.784.771,28  
Data Base : 01/01/2008

Empreendimento : TIRO AO POMBO  
Contratada : GOMES LOURENÇO  
Prazo : 45 (meses)  
Início/Término : 06/03/2008 a 06/12/2011

Item	Serviços	Valor Medido	%	Valor Anterior (R\$)	%	Valor Acumulado (R\$)	%
010000	INSTALAÇÕES DE APOIO	0,00	0,00	36.623,69	99,47	36.623,69	99,47
020000	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	454.008,32	90,05	454.008,32	90,05
030000	SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA	0,00	0,00	903.580,84	88,89	903.580,84	88,89
040000	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	37.110,99	90,44	37.110,99	90,44
050000	DRENAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	226.596,20	100,0	226.596,20	100,00
070000	REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	325.055,26	89,89	325.055,26	89,89
080000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	271.830,64	82,14	271.830,64	82,14
090000	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	354.043,52	56,81	354.043,52	56,81
100000	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	604.873,39	100,0	604.873,39	100,00
110000	READEQUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS	10.439,16	0,87	866.216,94	72,01	876.656,10	72,87
120000	PAISAGISMO	0,00	0,00	6.390,82	3,58	6.390,82	3,58
130000	UNIDADES HABITACIONAIS	385.980,60	3,55	8.626.028,53	79,26	9.012.009,13	82,81
140000	EQUIPE DE APOIO	0,00	0,00	473.637,80	100,0	473.637,80	100,00
150000	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	742.388,07	89,61	742.388,07	89,61
250000	REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
290000	APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	1.046.216,00	100,0	1.046.216,00	100,00

CÁLCULO FINAL DE MEDIÇÃO		Sub Total	396.419,76	14.974.601,00	15.371.020,76
	BDI (35,00%)	138.746,91		5.241.110,15	5.379.857,06
	TOTAL MEDIDO COM BDI (Valor a Faturar)	535.166,67		20.215.711,15	20.750.877,82

CALCULO FINAL DE REAJUSTE		Reajuste Econômico Definitivo	146.903,25
	Diferença de Reaj.Econômico	0,00	
	Valor Total do Reajuste (R\$)	146.903,25	



**OBRA TIRO AO POMBO – LOTE 13**

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 1



**BLOCO A e B**

Foto 2



**ESCADA 2**

Foto 3



**LOCAL TRIPOSTA BURACO**

Foto 4



**TRIPOSTAS AGULHAMENTO**

Foto 5



**BLOCO A,B e E - CENTRO DE MEDIÇÃO**

Foto 6



**RUA DA GRAÇA - ESCADA DE CONTENÇÃO**
