

Prestação de Contas 2017 – SMSO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Março 2018



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Serviços e Obras

Prestação de Contas 2017 – SMSO

Desapropriações	Vlr. Autorizado 2017	Empenhado	Liquidado
Corredores - Mobilidade	23.978.828,87	20.763.867,12	10.320.161,09
Terminais - Mobilidade	23.214.513,40	3.782.630,38	3.613.814,59
Gerenciamento	3.284.870,99	3.284.871,01	3.242.602,72
Drenagem	5.000.000,00	4.500.000,00	3.641.988,07
TOTAL	55.478.213,26	32.331.368,51	20.818.566,47

CORREDOR LESTE ITAQUERA I [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Leste Itaquera 1	13.301.686,45

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Continuidade e finalização das obras do Corredor

CONTRATO 045/SIURB/2013
Valor do Contrato: R\$ 150.406.618,68
Processo: 2013-0.136.235-9
Empresa Contratada: CARIOCA/HELENO & FONSECA

Liquidado 2017
R\$ 3.803.040,75

Projeção



Integração:

1. Terminal de Ônibus Vila Carrão
2. Terminal / Estação Itaquera (Linha 3 Metrô / Linha 11 CPTM)

Composição da Obra:

3. Obra de arte: Viaduto Eixos 1 e 2 Av. Aricanduva sobre Av. Itaquera.

CORREDOR LESTE ITAQUERA I [30% mobilidade]



TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA II [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Terminal Itaquera Corredor Leste Itaquera 2	25.417.098,40

CONTRATO 051/SIURB/2013
Valor do Contrato: R\$ 456.360.434,19
Processo: 2013-0.136.203-0
Empresa Contratada: Camargo Côrrea / Constran

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- Continuidade das obras do Terminal- Continuidade nas obras do Corredor denominado Leste Itaquera 2

Liquidado 2017
R\$ 3.734.683,30

Projeção



TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA II [30% mobilidade]



CORREDOR CAPÃO REDONDO [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Capão Redondo	1.278.283,42


ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Elaboração de projetos

CONTRATO 046/SMSO/2013
Valor do Contrato: R\$ R\$ 213.175.405,41
Processo: 2013-0.136.122-0
Empresa Contratada: Consórcio S.A. Paulista /
Construbase

Liquidado 2017

R\$ 0,00

Projeção

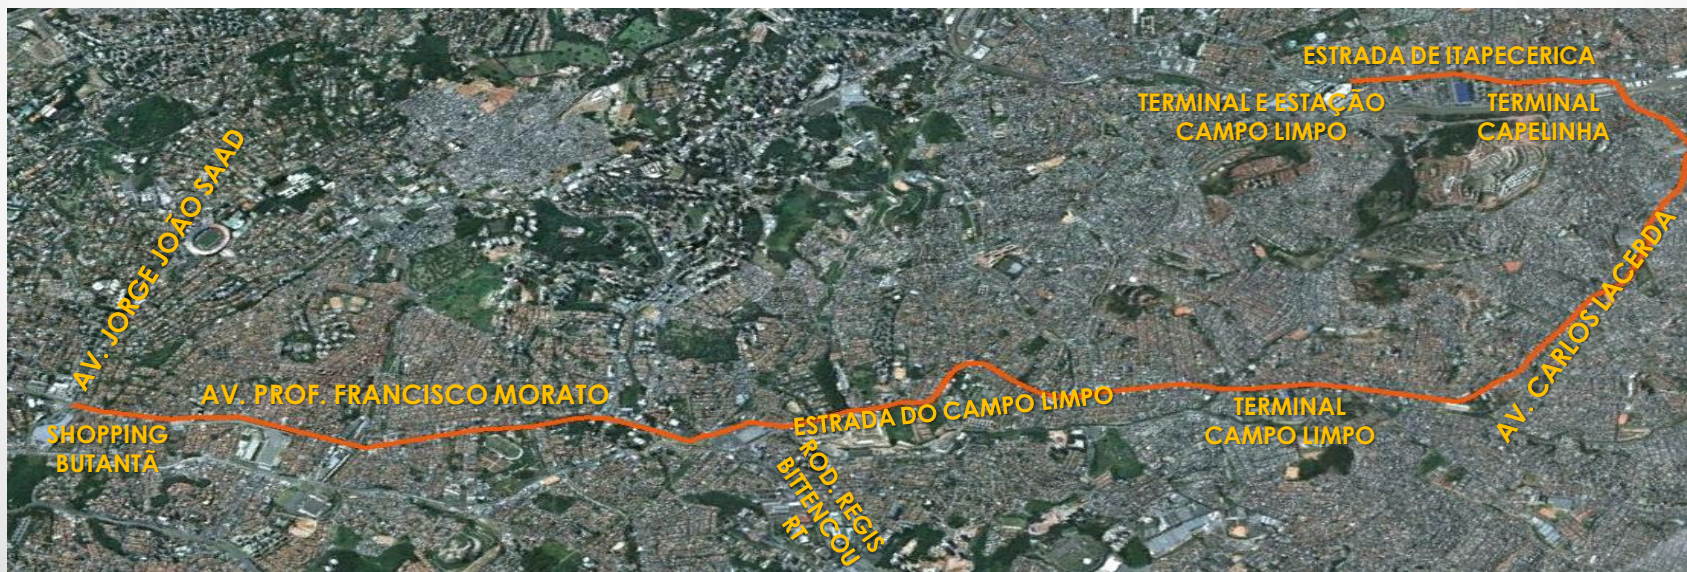

CORREDOR M'BOI MIRIM [30% mobilidade]


NOME	VALOR (R\$)
ESTÁGIO	AÇÃO
Corredor M'Boi Mirim	6.696.274

CONTRATO 047/SIURB/2013
Valor do Contrato: R\$ 116.661.203,46
Processo: 2013-0.136.129-8
Empresa Contratada: Consórcio Arvek / DPBarros

Adequações e retomada do projeto e obras em outubro/17

Elaboração de projetos executivos, execução das obras do Empreendimento 6 – Corredor M'boi Mirim, integrante do programa de mobilidade urbana

Liquidado 2017
R\$ 6.396.251,63

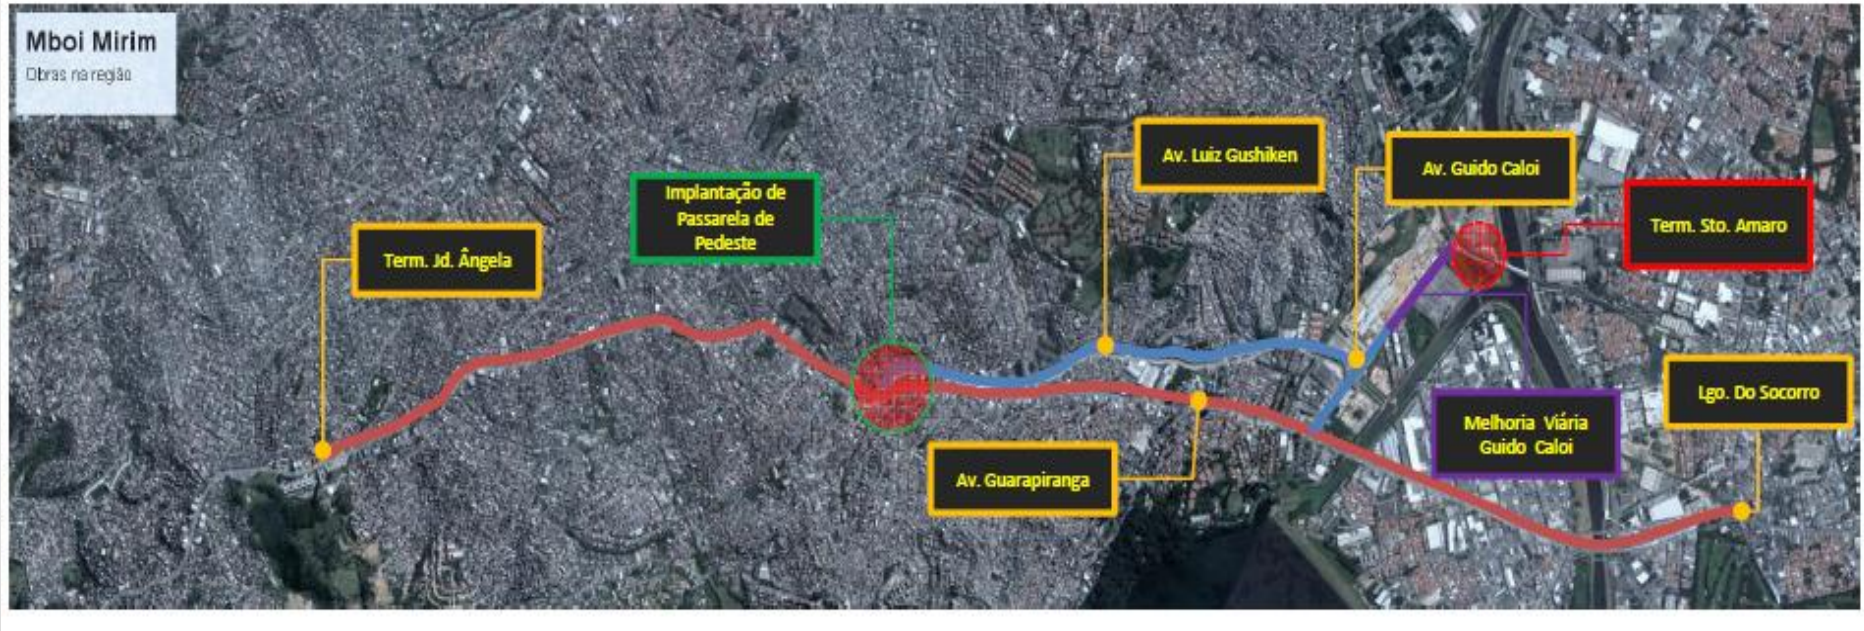

CORREDOR M'BOI MIRIM [30% mobilidade]



Situação Inicial:



CARLOS CALDEIRA

[30% mobilidade(Contrato com Drenagem)]

NOME	VALOR (R\$)
Carlos Caldeira	1.000.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO

CONTRATO 098/SIURB/2015
Valor do Contrato: R\$ 179.324.091,18
Processo: 2015-0.183.093-3
Empresa Contratada: CONSÓRCIO CG – JZ

Liquidado 2017
R\$ 0,00

Início de Projeto Executivo

Execução de projeto executivo e de obras de prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho, da estrada de Itapeçerica até a estrada M'Boi Mirim, passagem inferior para ligação com a estrada M'Boi Mirim, dois viadutos sobre o futuro reservatório, reservatório de amortecimento de cheias, canalização do córrego Água dos Brancos (Capão Redondo) e sistema de micro-drenagem.

Projeção



Gerenciamento

Gerenciamento Mobilidade:

- Gerenciamento SP Obras – Mobilidade Urbana : **R\$ 3.284.871,00**

Liquidado 2017
R\$ 3.242.602,72

Drenagem

Drenagem Urbana:

- Aplicação em intervenções diversas do Programa de Drenagem Urbana **R\$ 4.000.000,00** (PRA lote 5).

Liquidado 2017
R\$ 3.641.988,07





AVENIDA CIPRIANO RODRIGUES

RUA FORMOSELHA

RUA ARMANDO CARDOSO ALVES / CLUBE ESPORTIVO DA PENHA ...

CORREGO AFLUENTE "J"

Drenagem

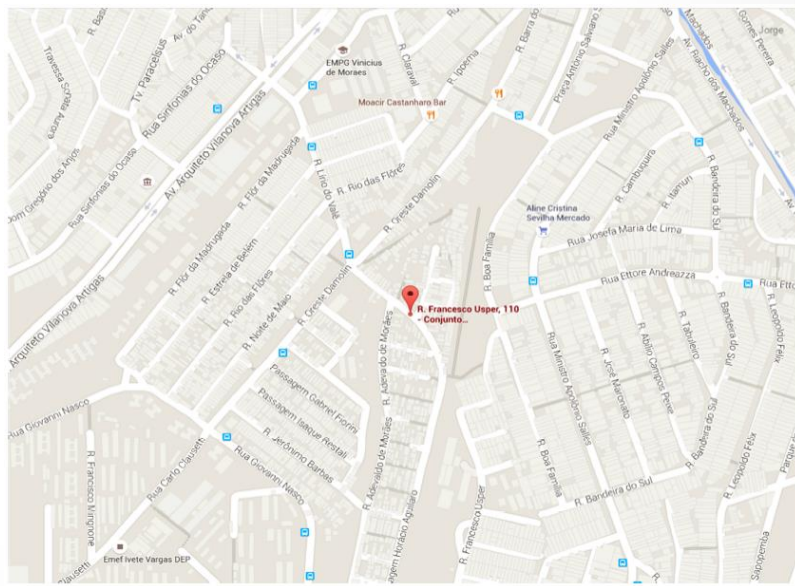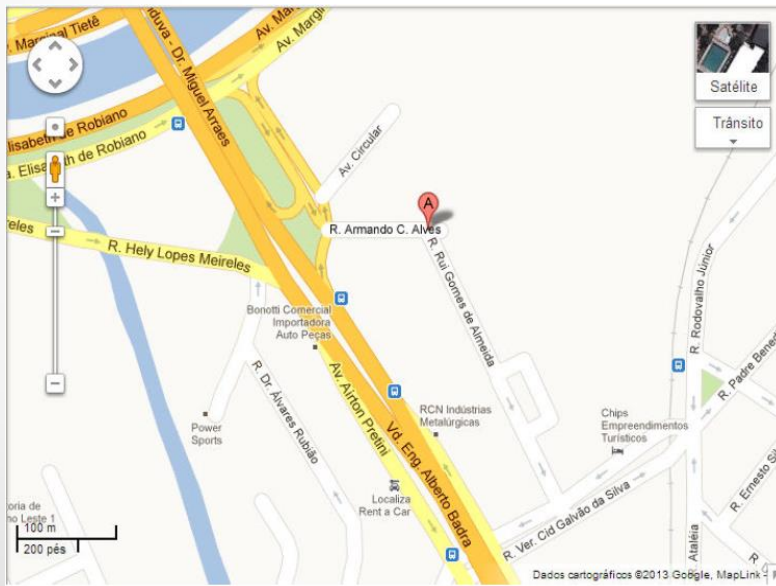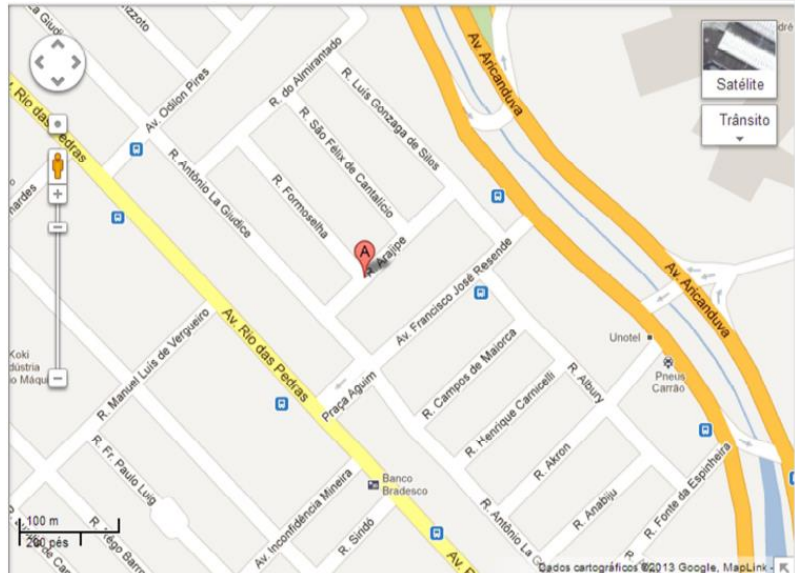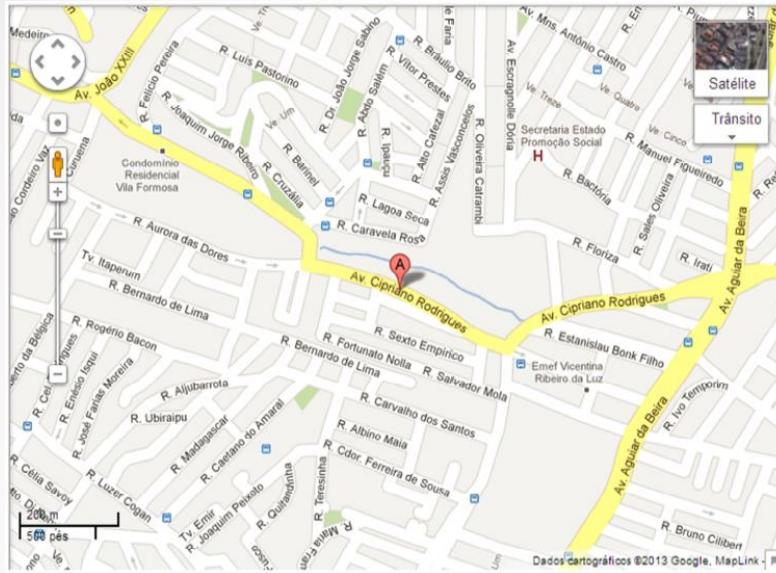

Drenagem

AVENIDA CIPRIANO RODRIGUES



RUA ARMANDO CARDOSO ALVES – CLUBE ESPORTIVO DA PENHA



RUA FORMOSELHA



CORREGO AFLUENTE "J"



REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ

NOME	VALOR (R\$)
Vale do Anhangabaú	500.000,00

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em fase de contratação

- Elaboração de projetos e obras

Liquidado 2017

R\$ 0,00



Valor total estimado da obra R\$ 79.934.920,45



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Serviços e Obras
