



REUNIÃO FUNDURB 24/04/14 PROJETOS SMT - 2013

ORÇAMENTO 2013

	DESTINAÇÃO	VERBA ALOCADA	VALOR LIQUIDADADO	SALDO DEVOLVER	% UTILIZAÇÃO
SPTRrans	Parada JK *	6.000.000,00	5.892.200,15	107.799,85	98,2
	Estrada Iguatemi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,0
	Total	15.500.000,00	15.392.200,15	107.799,85	99,3
CET	SIM - Itaquera	900.000,00	0,00	900.000,00	0,0
	Sinalização	5.100.000,00	4.193.631,20	906.368,80	82,2
	Total	6.000.000,00	4.193.631,20	1.806.368,80	69,9
SMT	Total	21.500.000,00	19.585.831,35	1.914.168,65	91,1

* - dos R\$ 6.000.000,00 referentes a Parada JK foram utilizados R\$ 5.003.000,00 na referida obra e R\$ 889.200,15 na obra da Estrada Iguatemi conforme aprovado na 4ª reunião ordinária em 20.12.13



REFORMA PARADA JUSCELINO KUBITSCHEK SPTrans

DESCRIÇÃO ATIVIDADES

Parada Juscelino Kubitschk

- Alargamento da Avenida Santo Amaro, no acesso a Av. São Gabriel e Av. Brig. Luis Antonio, sentido b/c;
- Novo acesso veicular à Av. Santo Amaro provenientes da Av. Brigadeiro Luis Antonio;
- Implantação de parada no canteiro central (parada à esquerda) com altura de 28,0 cm;
- Instalação de equipamentos e execução das adequações necessárias ao atendimento completo das Normas de Acessibilidade a mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- Implantação de sistema de informação ao usuário segundo manual de identidade visual da SPTrans (RTD-Rede de Transmissão de Dados e PMV's-Painéis de Mensagem Variável);



PARADA JUSCELINO KUBITSCHKEK



PARADA JUSCELINO KUBITSCHKE



PARADA JUSCELINO KUBITSCHKEK

Antigo Abrigo (removido) com Parada a Direita.

Novos Abrigos com Parada a Esquerda.

Parada sentido Joaquim Floriano Novos Abrigos à Esquerda.



PARADA JUSCELINO KUBITSCHEK



PARADA JUSCELINO KUBITSCHKE



Obras de alargamento da Pista (passeio concluído)



Obras de alargamento da Pista (execução de guias e base de pavimento)



Obras de alargamento da Pista (guias, sarjetas e pavimento concluídos)

PARADA JUSCELINO KUBITSCHKEK



Fotos da execução



PARADA JUSCELINO KUBITSCHEK

Fotos da execução



PARADA JUSCELINO KUBITSCHEK

Fotos da execução






CORREDOR RAGUEB CHOFI – ESTRADA DO IGUATEMI **SPTans**

CORREDOR AV. RAGUEB CHOHI / ESTR. DO IGUATEMI



CORREDOR AV. RAGUEB CHOHI / ESTR. DO IGUATEMI

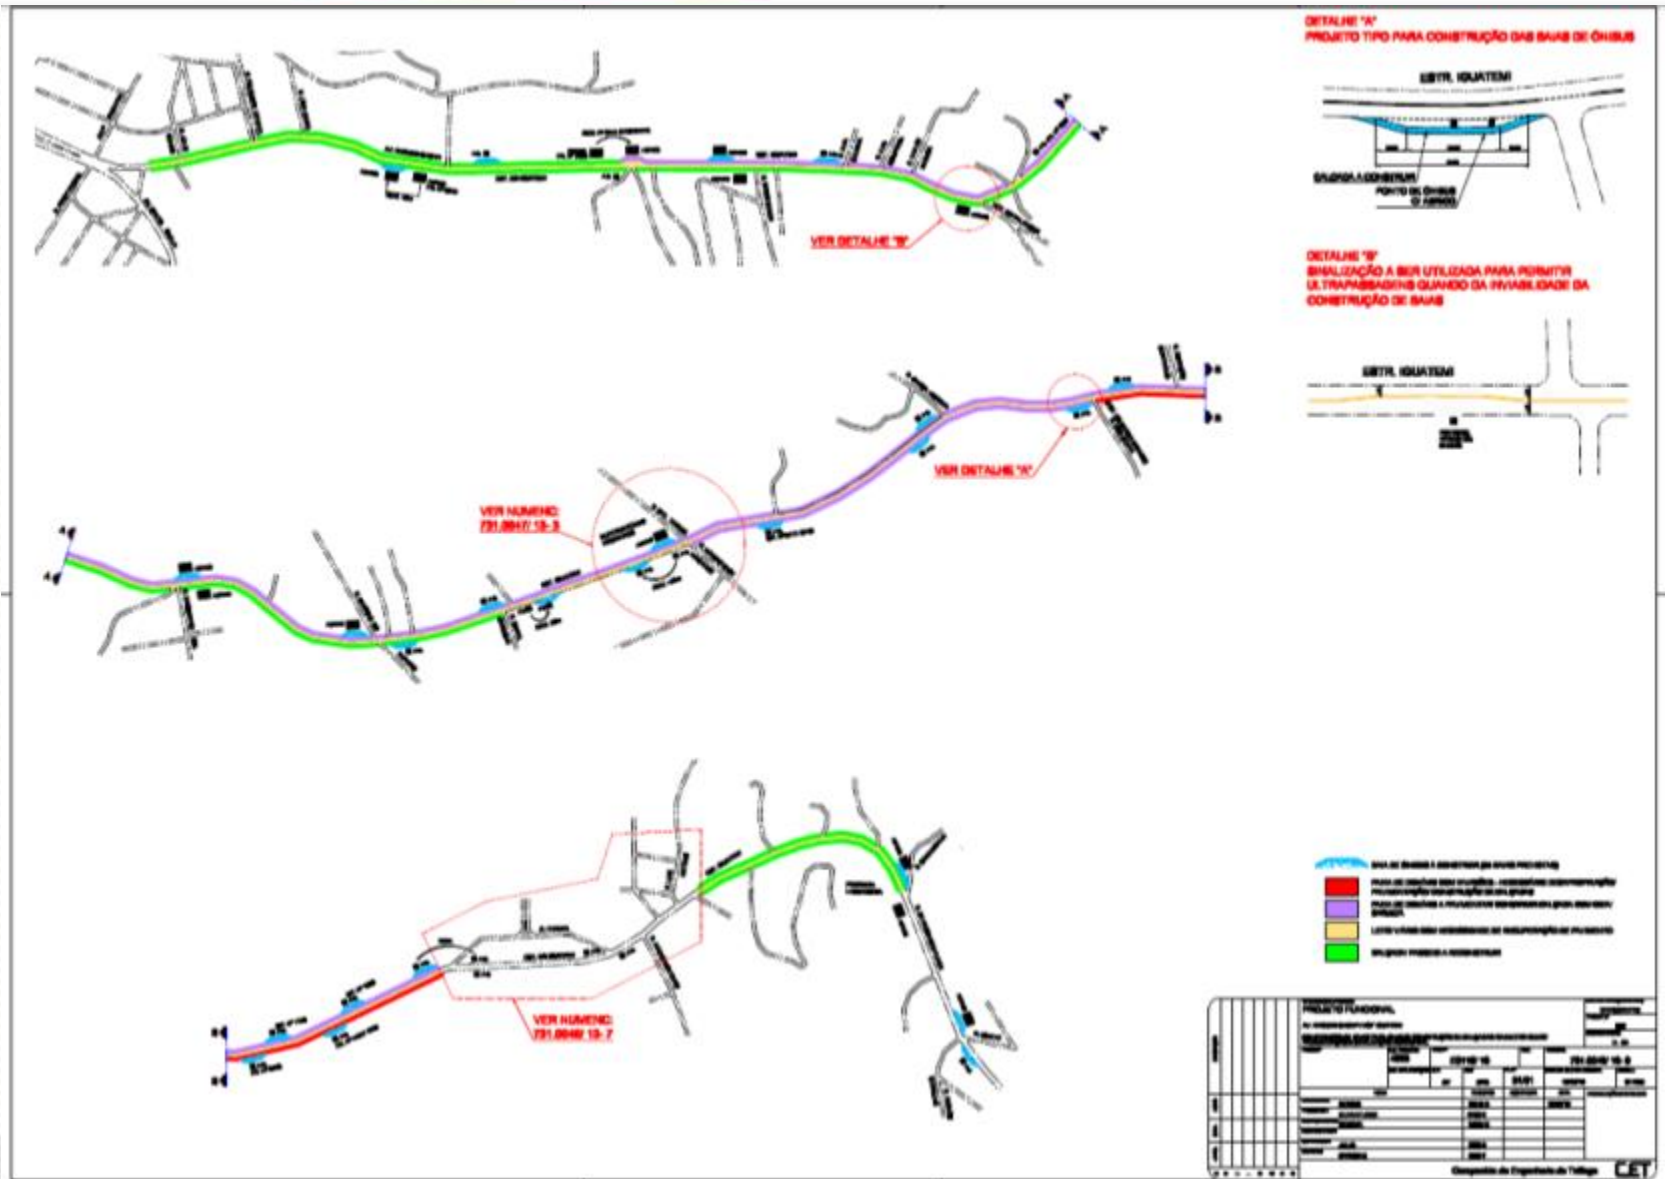

CORREDOR AV. RAGUEB CHOHI / ESTR. DO IGUATEMI

Pavimentação Da Estrada do Iguatemi da Rua Bento Guelfi até a Rua Luís Mateus.



ANTES



DEPOIS



Implantação de retorno para acesso à Rua Érico Semer.



Implantação de retorno próximo ao Supermercado Negreiros.

CORREDOR AV. RAGUEB CHOHI / ESTR. DO IGUATEMI



Fechamento do canteiro central (mini barreira), próximo do entroncamento da Rua Marcio Beck (junto ao supermercado Negreiros).



Pavimentação e sinalização do entroncamento da Estr. do Iguatemi com a Rua Marcio Beck



Implantação de alargamento viário e construção do passeio entre a Rua Inácio Monteiro até a Rua Luis Mateus.




Execução de passeio para acessibilidade às baias e pontos de parada.

CORREDOR AV. RAGUEB CHOHI / ESTR. DO IGUATEMI



Implantação de 14 baias ao longo da via.

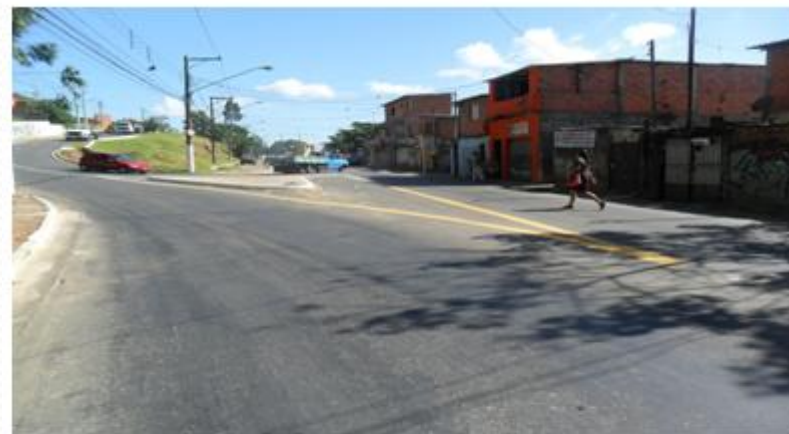

Implantação do binário formado pela Estrada do Iguatemi e Rua Itiruna (sentido centro-bairro)



Pavimentação e sinalização de 16 pontos de parada.



Implantação do binário formado pela Estrada do Iguatemi e Rua Itiruna (sentido bairro-centro).



SINALIZAÇÃO CET

SINALIZAÇÃO

US	Descrição	Total 2013
8001	FUNDURB - Serviços de Sinalização	16.709,55
8002	Serviços de Implantação de Travessia de Pedestres Iluminada	849.090,00
8137	Corredor Marginal Tietê	382.955,43
8138	Corredor Celestino Bourroul	32.547,35
8139	Corredor Alfredo Pujol	59.005,16
8140	Corredor Estrada do Iguatemi	15.729,86
8141	Corredor MMDC	25.842,82
8142	Corredor Pirajussara	15.446,21
8144	Corredor Conselheiro Rodrigues Alves	14.905,85
8145	Corredor Brigadeiro Gavião Peixoto	28.760,36
8147	Corredor Marginal Pinheiros (Trecho I,II e III)	584.759,44
8148	Corredor Av. Paulista/Av. Dr. Arnaldo / Av. Heitor Penteado	84.231,86
8151	Corredor Rua Ibitirama	79.360,29
8160	Corredor Norte - Sul	137.539,74
8165	Corredor João Teodoro	20.025,71
8510	Serviços de Sinalização Horizontal no Sistema Viário - FUNDURB	572.113,69
8520	Serviços de Sinalização Vertical no Sistema Viário - FUNDURB	367.161,96
8560	Serviços de Sinalização de Vias Recapeadas - Programa Subprefeitura - FUNDURB	907.445,97
TOTAL GERAL		4.193.631,25


SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS

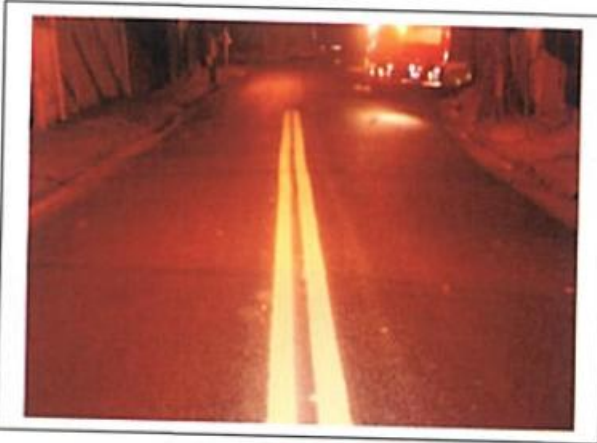

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:
ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:
ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:
ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



6-7-2013

SINALIZAÇÃO:

V. 1009

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO:

ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

ANTES



DEPOIS *CE 118/1100115*



ANTES



DEPOIS



SINALIZAÇÃO

ANTES



DEPOIS 01/09/17



ANTES



DEPOIS

