



PREFEITURA DE SÃO PAULO

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**

SIURB – Execução Orçamentária FUNDURB 2013

Drenagem do Córrego Cordeiro

Objeto: 6 reservatórios, 4 caixas de equalização de vazão e canalização de córrego

- Valor do contrato: R\$ 142.927.466,72
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 28.416.358,59
- Dotação: 98.22.17.451.1.230.1.231.4.4.90.51.00.08 - Obra
98.22.17.451.1.230.1.231.4.4.90.61.00.08 - Desapropriação
- Obra: Empenhado R\$ 20.021.685,97 – Liquidado R\$ 15.560.848,29
- Desapropriação: Empenhado: R\$ 2.967.234,11 – Liquidado R\$ 2.967.234,11
 - Obra em andamento
 - Valor de empenho cancelado: R\$ 9.352.153,51

Drenagem do Córrego Cordeiro



Reservatório Dórly Pirajussara

Objeto: Obras de drenagem na bacia do Córrego Pirajussara, compreendendo a implantação dos reservatórios de retenção do Parque Esmeralda e do Jardim D'Orly, canalização aberta de pequeno trecho do Córrego Pirajussara, diques de contenção, redes de micro-drenagem, recomposição do pavimento e os respectivos projetos executivos

- Valor do contrato: R\$ 87.582.725,02
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 158.926,41
- Dotação: 98.22.17.451.1.230.1.231.4.4.90.51.00.08
- Valor empenhado: R\$ 158.926,41
- Valor liquidado: R\$ 158.926,41
- Situação:
 - Obra concluída

Reservatório Dórly Pirajussara



Itaquera: Radial Leste / Dersa

Objeto: Radial Leste: Viaduto Itaquera, canalização parcial do Córrego Verde, Passagem Inferior Inajá-Guaçu e projeto do Viaduto Guaianazes

- Valor do contrato: Radial Leste: R\$ 130.930.419,14
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 35.000.000,00
- Dotação: 22.10.15.451.1.263.5.175.4.4.90.51.00.08
- Valor empenhado: R\$ 25.645.435,60
- Valor liquidado: R\$ 20.551.028,2
- Situação:
 - Radial Leste:
 - Viaduto Itaquera: obra concluída
 - Córrego Verde / Passagem Inajá-Guaçu / Projeto do Viaduto Guaianazes: em andamento

Viaduto Itaquera: Radial Leste / Dersa



Foto aérea do Viaduto Itaquera



Execução da pavimentação do viaduto



Colocação das placas pré-moldadas na passagem de pedestre



Viaduto em funcionamento

Canalização parcial do Córrego Verde



Execução de armação de laje de fundo do canal



Execução da regularização do fundo da vala para execução da laje de fundo do canal



Execução das atividades no sentido contrário à contenção do canal



Corte, Aterro e execução de contenção para execução do canal.

Passagem Inferior Inajá-Guaçu



Execução da concretagem da laje superior da Passagem inferior – sentido bairro



Execução dos estações para a segunda etapa da Passagem inferior sentido centro



Implantação de passagem para execução das estações da Passagem inferior sentido centro.



Pavimentação executada sobre laje inferior sentido bairro

Desapropriações Itaquera

Objeto: Desapropriações necessárias para as obras do convênio PMSP – GESP para Desenvolvimento da Zona Leste, bem como para as obras da Copa

- Valor do contrato: não se aplica
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 35.000,000,00
- Dotação: 22.10.15.451.1.263.5.175.4.4.90.61.00.08
- Valor empenhado: R\$ 25.889.316,58
- Valor liquidado: R\$ 25.889.316,58

- Situação:
 - Todos processos ajuizados
 - 4 imissões na posse
 - 12 com auto de imissão, aguardando cumprimento do mesmo.
 - 12 ainda necessários, mas sem auto de imissão.

Rua do Gasômetro

Objeto: Requalificação da Rua do Gasômetro


- Valor do contrato: R\$ 7.850.000,00
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 7.850.000,00
- Dotação: 22.10.15.451.1.263.5.083.4.4.90.51.00.08
- Valor empenhado: R\$ 7.850.000,00
- Valor liquidado: R\$ 3.752.844,41

- Situação: Obra em andamento

Rua do Gasômetro



Espera para o poste

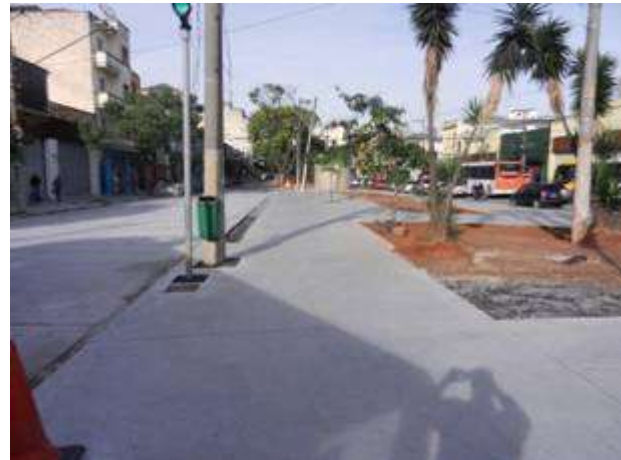

Viaduto Santo Amaro

Objeto: Recuperação estrutural e alteamento do viaduto

- Valor do contrato: R\$ 9.500.000,00 (data-base 2004)
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 8.648.476,25
- Dotação: 22.10.15.451.1.263.5.187.4.4.90.51.00.08
- Valor empenhado: R\$ 498.789,37
- Valor liquidado: R\$ 440.203,08 (recém-iniciada)

- Situação: Obra em andamento
 - Valor de empenho cancelado: R\$ 8.149.686,88

Viaduto Santo Amaro



Garagem Praça Roosevelt

Objeto: Recuperação e Adequação da garagem em dois pavimentos em subsolo sob a Praça Franklin Roosevelt

- Valor do contrato: R\$ 36.847.967,00
- Valor disponível FUNDURB 2013: R\$ 5.637.590,82
- Dotação: 22.10.15.452.1.310.5.181.4.4.90.51.00.08
- Valor empenhado: R\$ 5.637.591
- Valor liquidado: R\$ 5.610.715,84

- Situação: Obra em andamento

Garagem Praça Roosevelt




Balanço Geral

Empenhado / Liquidado

EMPREENHIMENTO	VALORES		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	(%) LIQUID. / EMP.
Drenagem do Córrego Cordeiro	R\$ 22.988.920,08	R\$ 18.528.082,40	80,60%
Reservatório Dórly Pirajussara	R\$ 158.926,41	R\$ 158.926,41	100,00%
Itaquera: Radial Leste / Dersa	R\$ 25.645.435,60	R\$ 20.551.028,21	80,14%
Desapropriações Itaquera	R\$ 25.889.316,58	R\$ 25.889.316,58	100,00%
Rua do Gasômetro	R\$ 7.850.000,00	R\$ 3.752.844,41	47,81%
Viaduto Santo Amaro	R\$ 498.789,37	R\$ 440.203,08	88,25%
Garagem Praça Roosevelt	R\$ 5.637.590,82	R\$ 5.610.715,84	99,52%
TOTAL	R\$ 88.668.978,86	R\$ 74.931.116,93	84,51%


Balanço Geral

Gráfico

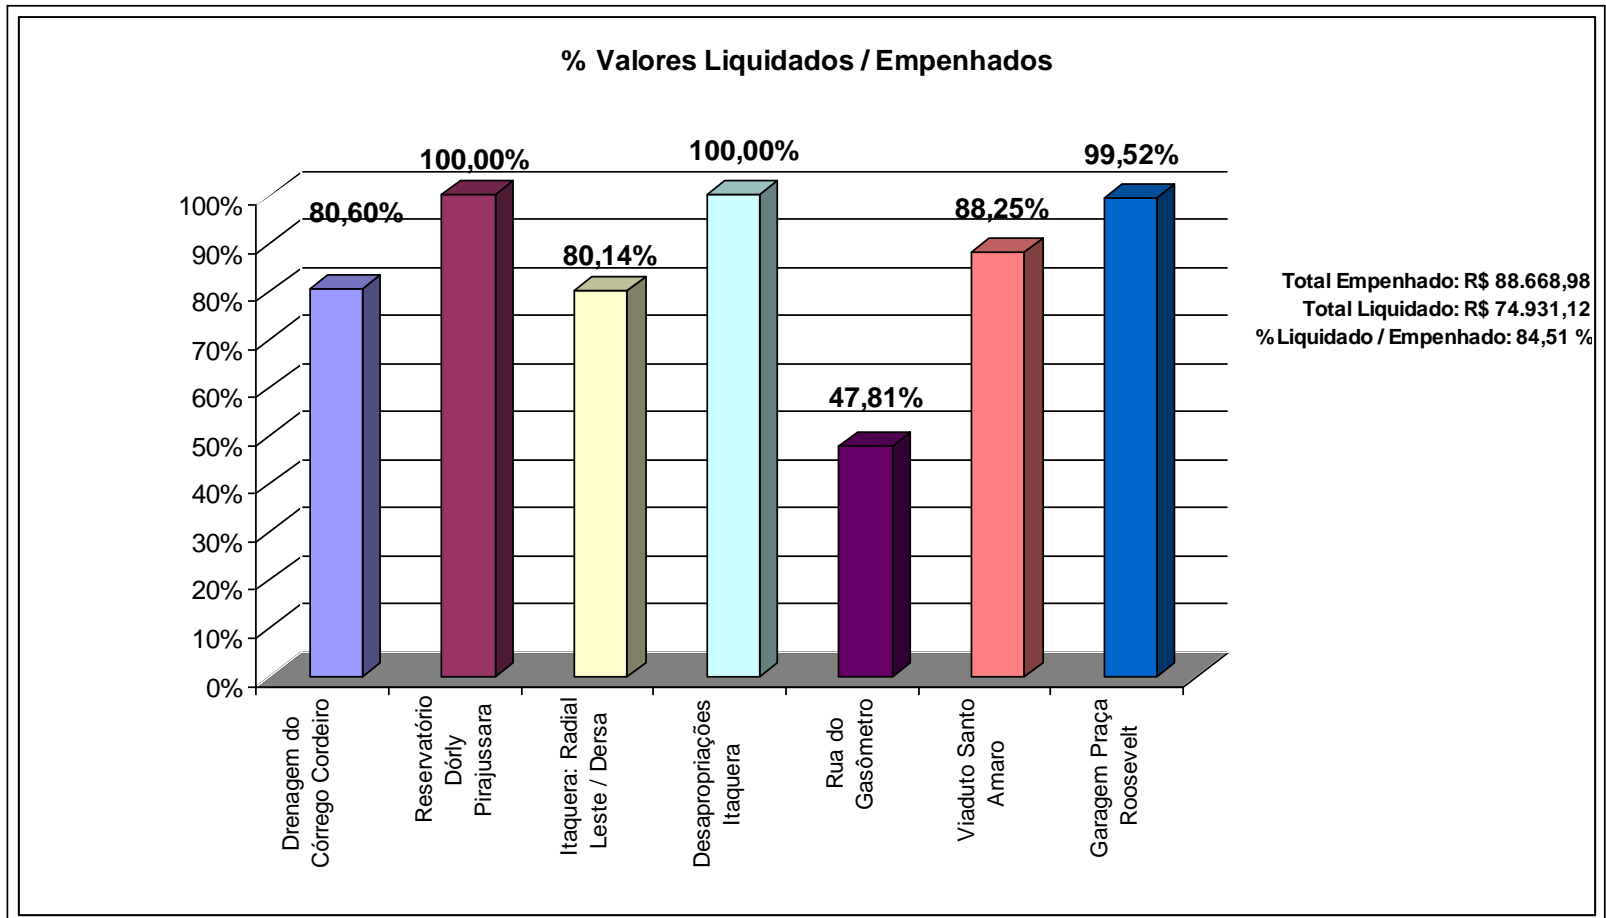

Balanço Geral

Gráfico

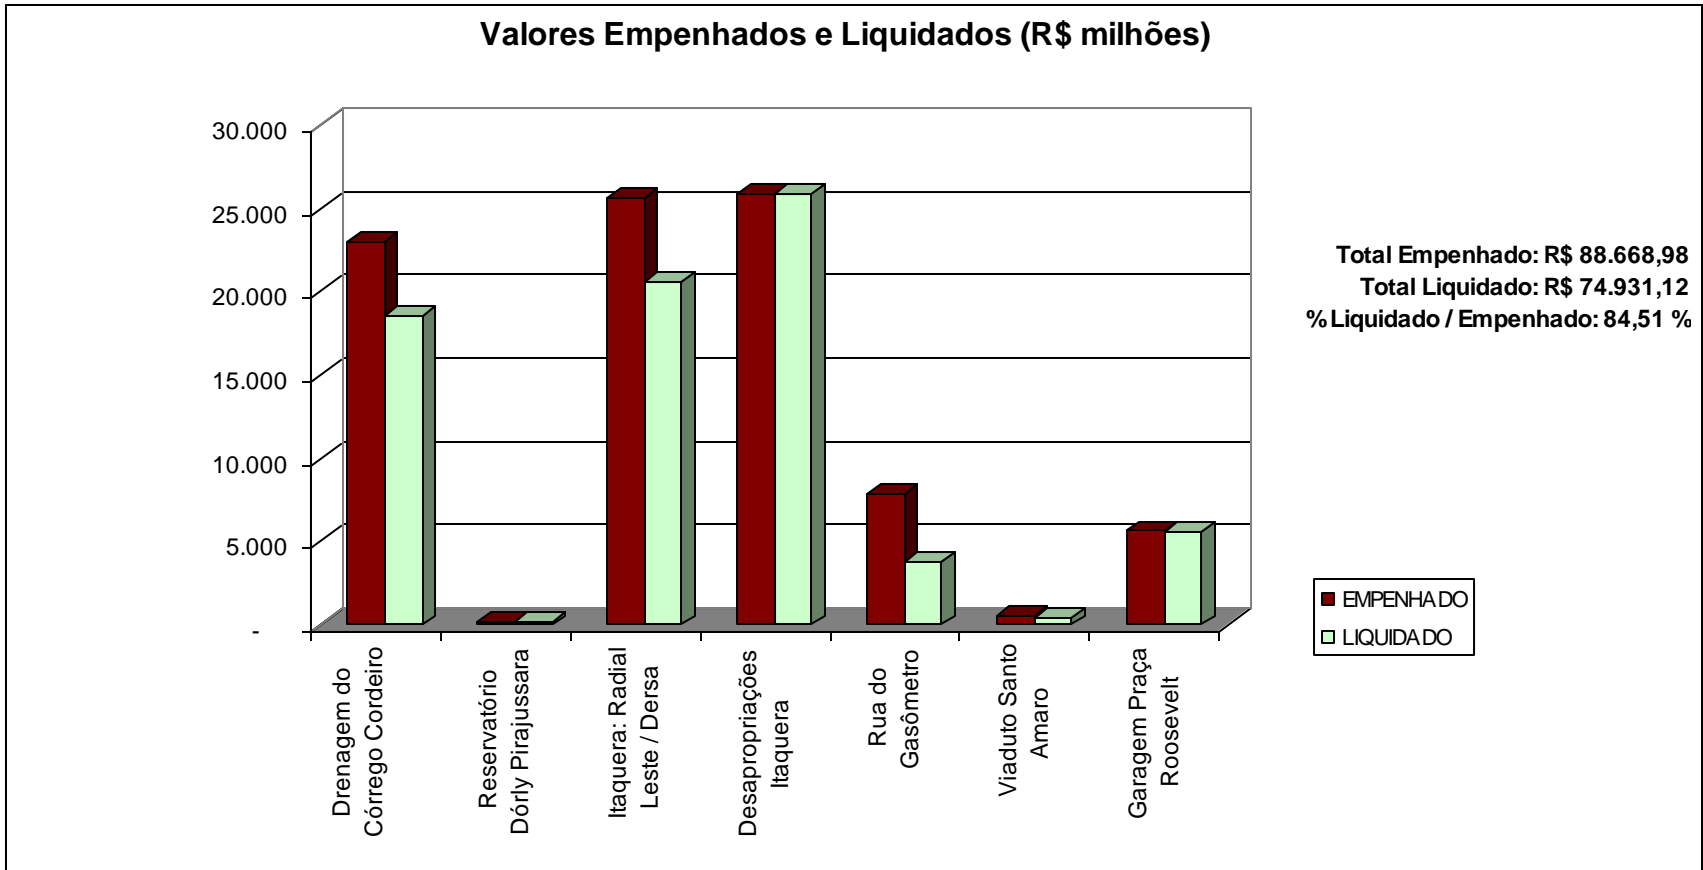

Balanço Geral

Disponível / Empenhado

EMPREENDIMENTO	VALORES			
	DISPONIVEL	EMPENHADO	(%) EMP. / DISP.	OBS.
Drenagem do Córrego Cordeiro	R\$ 28.416.358,59	R\$ 22.988.920,08	80,90%	A Devolver
Reservatório Dórlly Pirajussara	R\$ 158.926,41	R\$ 158.926,41	100,00%	
Itaquera: Radial Leste / Dersa	R\$ 35.000.000,00	R\$ 25.645.435,60	73,27%	A empenhar se chegarem processos
Desapropriações Itaquera	R\$ 35.000.000,00	R\$ 25.889.316,58	73,97%	
Rua do Gasômetro	R\$ 7.850.000,00	R\$ 7.850.000,00	100,00%	
Viaduto Santo Amaro	R\$ 8.648.476,25	R\$ 498.789,37	5,77%	A Devolver
Garagem Praça Roosevelt	R\$ 5.637.590,82	R\$ 5.637.590,82	100,00%	
TOTAL	R\$ 120.711.352,07	R\$ 88.668.978,86	73,46%	

Balanço Geral

Gráfico

