



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**FUNDURB / SIURB  
Prestação de Contas / 2014**

Data base da ultima posição orçamentária: 31/12/14



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM**

# Taxa CEF Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Viabilizar prestação de contas para o PAC e garantir repasse do Governo Federal.

- Valor solicitado ao FUNDURB 2014: R\$ 3.395,28
- Situação: Prestação de contas aprovada. Taxa paga.
  
- Valores empenhados: R\$ 3.395,28
- Valores liquidados: R\$ 3.395,28
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90,.39.00.08

# Ponte Baixa - Material Expropriatório

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 1.291.237,92
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.291.237,92
- Situação: Material em revisão (mudança do traçado).
  
- Valores empenhados: R\$ 1.291.237,92
- Valores liquidados: R\$ 1.144.760,30
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Ponte Baixa – Trabalho Social Reajuste

**Objeto:** Reajustes referentes aos trabalhos sociais necessários

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 125.862,85
- Situação: Trabalho em andamento.
  
- Valores empenhados: R\$ 125.862,85
- Valores liquidados: R\$ 102.935,70
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego do Cordeiro – Material Expropriatório

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 24.045,84
- Valores solicitados FUNDURB 2014: R\$ 24.045,84
- Situação: Elaboração finalizada, medição em tramitação.
  
- Valores empenhados: R\$ 24.045,84
- Valores liquidados: R\$ 24.045,84
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.08

# Gerenciadora – Lote 1 e Lote 2

**Objeto:** Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para Implantação de Programas de Infraestrutura Urbana e de Edifícios Públicos.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 26.600.000,00
- Situação: Em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 14.800.000,00 (lote 1) + R\$ 11.800.000,00 (lote 2) = R\$ 26.600.000,00
- Valores liquidados: R\$ 12.191.330,64 (lote 1) + R\$ 9.522.395,88 (lote 2) = R\$ 21.713.726,52
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Licenciamentos Ambientais (FUPAM)

**Objeto:** Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura para elaboração de estudos ambientais até licença ambiental de instalação (LAI) para diversos empreendimentos de drenagem


- Valor do contrato: R\$ 10.000.000,00
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 0,00
- Valor pretendido: R\$ 0,00
  
- Situação: suspensa a contratação
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08



# Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego da Paciência

**Objeto:** Estudo de drenagem e projeto básico de canalização , geométrico, pavimentação estrutural, licenciamento ambiental, iluminação, sinalização viária, desvio de tráfego e paisagismo do córrego paciência

- Valor do contrato: R\$ 1.153.133,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 729.762,60
- Situação: Projeto concluído
  
- Valores empenhados: R\$ 729.762,60
- Valores liquidados: R\$ 729.657,01
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

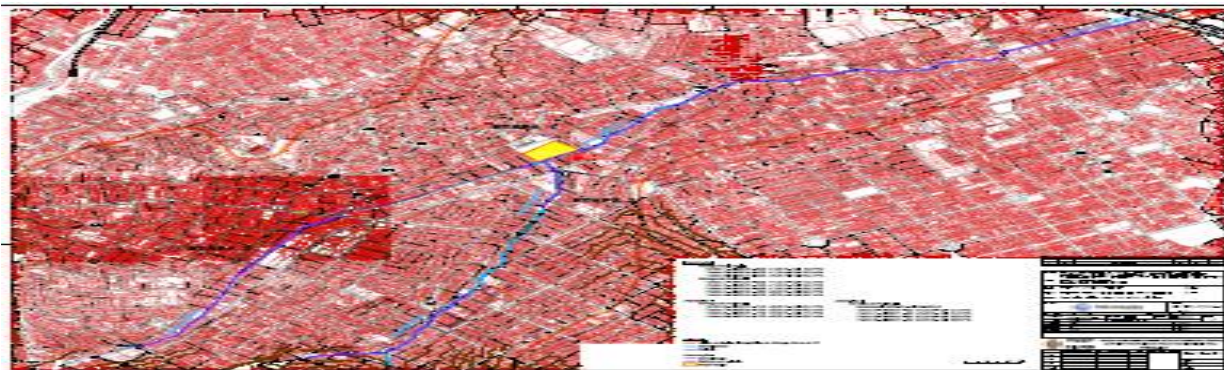

# Córrego Tremembé - Projeto

**Objeto:** Projeto básico de Canalização de córregos associada à construção de reservatórios de amortecimento de cheias (R-1, R-2, R-3A, R-3B, R-4, R-5 e R-6) e implantação de 6 parques lineares- (V = 217.000m<sup>3</sup>)

- Valor do contrato: R\$ 604.962,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido atualizado: R\$ 27.007,56
- Justificativa das alterações: retificação no valor da medição final.
- Situação: Projeto concluído – em fase de medição final.
- Valores empenhados: R\$ 27.007,56
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego Rapadura – Projeto Básico e Executivo

**Objeto:** Elaboração do Projeto básico e executivo de canalização do córrego Rapadura.

- Valor do contrato: R\$ 374.239,97
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 36.782,27
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 36.782,27
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Obra do Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Execução de Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato: R\$ 399.375.476,80
- Valores solicitados FUNDURB 2014: R\$ R\$ 52.191.605,46
- Valor atualizado: R\$ 42.191.605,00
- Justificativa das alterações: cobertura dos valores antes previstos na securitização do FMSAI
- Valores empenhados: R\$ 42.191.605,46
- Valores liquidados: R\$ 38.083.967,33
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Córrego Ponte Baixa - Enterramento de Rede

**Objeto:** Remanejamento de redes aéreas existentes para o modo subterrâneo para viabilizar as obras de canalização dos córregos Ponte Baixa e do jardim Letícia

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 837.232,35
- Valor aprovado: R\$ 837.232,35
- Valor atualizado: R\$ 1.034.596,88
- Situação: Obra contratada
  
- Valores empenhados: R\$ 1.034.596,88
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Obra da Bacia do Córrego Cordeiro

**Objeto:** Realizar intervenções de controle de cheias na bacia do Córrego do Cordeiro com o objetivo na redução das ocorrências de enchentes, 6 reservatórios, 4 caixas de equalização de vazão e canalização de córrego.

- Valor do contrato: R\$ 142.927.466,72
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 56.800.898,47
- Valor atualizado: R\$ 56.698.130,82
- Justificativa das alterações: ajuste no cronograma
- Situação: Obra em execução
  
- Valores empenhados: R\$ 56.698.130,82
- Valores liquidados: R\$ 55.824.206,95
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

**Objeto:** Inclui execução de galerias de águas pluviais, ampliação das captações existentes, recomposição de pavimento, contenção de margens e elaboração de projetos executivo e “as built” .

- Valor do contrato: R\$ 136.896.340,90
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
  - Valor aprovado: R\$ 36.460.988,68
  - Valor atualizado: R\$ 36.366.391,70
  - Justificativa: ajuste no cronograma
- Situação: obra em andamento
- Valores empenhados: R\$ 36.366.392,00
- Valores liquidados: R\$ 35.961.144,26
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras Concluídas

<b>Endereço</b>	<b>Subprefeitura</b>
Rua Maestro Batista Julião	Ipiranga
Rua João Teodoro	Mooca
Rua Dr Miguel Motta	Mooca
Rua Eugenio Freitas	Vila Maria / Vila Guilherme
Rua Leandro Ferreira	Vila Maria / Vila Guilherme
Travessa Emabaúba	Vila Maria / Vila Guilherme
Rua Maria Quedas	Vila Maria / Vila Guilherme
Rua Coronel Joaquim Ferreira de Souza	Santana / Tucuruvi
Rua Helena Sacramento	Santana / Tucuruvi
Rua Jardimirim	Santana / Tucuruvi
Rua Jardinésia	Santana / Tucuruvi
Travessa Neco	Santana / Tucuruvi



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras Concluídas

João Delgado	Freguesia do Ó / Brasilândia
Monte Alegre do Sul	Freguesia do Ó / Brasilândia
Raulino Gaudino	Freguesia do Ó / Brasilândia
Rodolfo Bardela	Freguesia do Ó / Brasilândia
Rua Tapendi e Rua Tacoativa	Pirituba / Jaraguá
Córrego Sitio Casa Pintada	São Miguel Paulista
Leonel Ferreira	Ermelino Matarazzo
Rua Heráclito Patriarca dos Santos	Ermelino Matarazzo
Rua Sancho Junqueira	Ermelino Matarazzo
Reverendo Izac Silvério	Ermelino Matarazzo
Rua Paulo Martin Garro	Itaim Paulista
Rua Afuá	Itaim Paulista
Rua Desembargador Fausto Whitaker Machado Alvim	Itaim Paulista
Rua Galvão Bueno	Sé
Rua Anjo Custódio	Aricanduva/ Vila Formosa
Rua Paulino Arena	Jacana / Tremembé

Total de obras concluídas: 28

# PRA 1 - Obras Concluídas Fotos



Rua João Delgado - Freguesia do Ó / Brasilândia – 15/08/14



Rua Raulino Galdino da Silva - Freguesia do Ó/Brasilândia – 02/06/14



Sarjetão na R. Augusto Montenegro – Jaçanã / Tremembé - 21/11/14



Vista da Travessa Leandro Ferreira – VI. Maria / VI. Guilherme – 12/02/14

# PRA 1 - Obras Concluída Fotos



Rua Jardimirim (Santana / Tucuruvi) - Antes 11/10/13



Rua Jardimirim (Santana / Tucuruvi) - Depois 16/05/14



Rua Jardinésia (Santana / Tucuruvi) – antes 10/10/13



Rua Jardinésia (Santana / Tucuruvi) – Depois 04/09/14

# PRA 1 - Obras Concluída Fotos



Recuperação do passeio na ilha da Rua São Teodoro - antes



Recuperação do passeio na ilha da Rua São Teodoro - depois



Travessa Neco - Santana/Tucuruvi - antes



Travessa Neco - Santana/Tucuruvi - depois

# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras em execução

Endereço	Subprefeitura
Rua Santa Cruz	Ipiranga
Av. Agua Funda	Jabaquara
Rua Ministro Alvaro de Souza Lima	Santo Amaro
Rua Visconde de Cairu	Mooca
Rua Canuto Saraiva	Mooca
Rua Orville Derby	Mooca
Avenida Presidente Altino	Lapa
Acesso a Policia Federal	Lapa
Rua Marcelo de Menezes	Vila Maria / Vila Guilherme
Rua Marcondes Buarque	Jaçanã / Tremembé
Rua Manoel Barbosa Reis	São Miguel Paulista
Rua Armando Cardoso Alves/Clube Desportivo	Penha
Rua Coatimirim	Penha
Córrego Afluenta J	Vila Prudente

# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras em execução

<b>Endereço</b>	<b>Subprefeitura</b>
Rua Estanislau Bonk Filho	Aricanduva / Vila formosa
Avenida Cipriano Rodrigues	Aricanduva / Vila formosa
Rua Almir Alves de Souza	Aricanduva / Vila formosa
Rua Pierrotinho	Aricanduva / Vila formosa
Rua Pataiba	Santana / Tucuruvi
Córrego Nadir Dias Figueiredo	Santana / Tucuruvi
Av. Santa Inês	Santana / Tucuruvi
Córrego Una	São Miguel Paulista
Rua Formoselha	Aricanduva / VI. Formosa / Carrão
Travessa Mario Mendes	Aricanduva / VI. Formosa / Carrão
Rua São Quirino	VI. Maria / VI. Guilherme
Córrego Jaboticabal 1	Ipiranga
Rua Cachoeira dos Antunes	Casa Verde

Total de obras em execução: 27

# PRA 1 - Obras em Execução - Fotos



Rua Marcondes Buarque (Jaçanã / Tremembé):  
Demolição e escavação do PV existente – 18/11/2014



Rua Paulino Arena (Jaçanã / Tremembé):  
Execução da rede de drenagem – 12/11/14



Av. Cipriano Rodrigues: Vista geral antes do início das obras  
05/11/2014



Av. Cipriano Rodrigues (depois): Execução de gabião  
margem direita – 21/11/2014

# PRA 1 - Obras em Execução - Fotos



Rua Coatimirim (Penha): Vista da área antes do início das obras – 25/11/2013



Assentamento de tubo do tubo do PV 23 ao PV 22 na Rua Brejo Novo – 21/11/2014



Travessia a ser executada entre a Rua Pierrotinho e a Rua Hamilton Prado – 30/10/2014




Rua Almir Alves de Souza: Laje de fundo do PV 18 na Rua Alfaró – 21/11/2014



# Curtume / Tiburtino

**Objeto:** Revisão de projeto executivo da canalização dos córregos Curtume e Tiburtino em atenção ao pedido da CPTM de mudança do projeto. Após, recursos para obra serão avaliados.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
  - Valor aprovado: R\$ 1.000.000,00
  - Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
  - Justificativa: adiado cronograma
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08

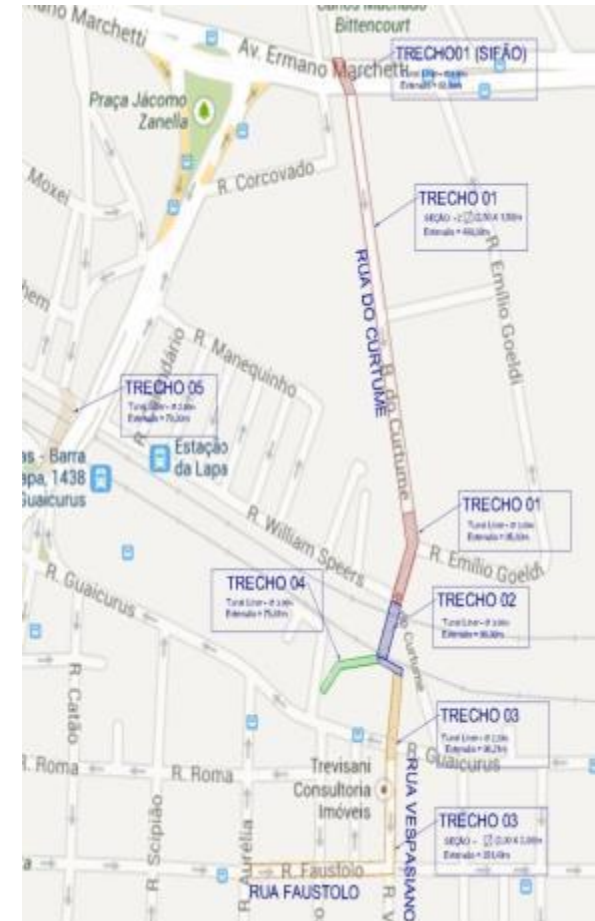

# Córrego Ponte Baixa - Desapropriação

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma. Total previsto 300 unidades

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 18.700.000,00
- Situação: Ações ajuizadas em fase de complementação (trecho abaixo da padaria) / ações novas em fase de ajuizamento (acima da padaria)
- Valores empenhados: R\$ 11.309.997
- Valores liquidados: R\$ 11.309.997
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Aricanduva – Desapropriação (R8)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado : R\$ 871.036,81
- Valor atualizado: R\$ 888.285,06
- Justificativa: atualizado valor da complementação, que é reajustado mensalmente, pois atrasou a liberação do recurso
  
- Situação: Recurso transferido para DESAP, aguarda depósito judicial
- Valores empenhados: R\$ 12.698,27
- Valores liquidados: R\$ 12.698,27
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Córrego do Cordeiro – Desapropriação (R5)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado: R\$ 15.000.000,00
- Valor pretendido atualizado: R\$ 7.674.578,87
- Justificativa: valor original calculado pela avaliação. Definido ajuizamento pelo ITBI, que neste caso foi menor.
  
- Situação: Ações a ajuizar. Recurso transferido para DESAP, aguarda depósito judicial.
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Córrego do Cordeiro – Desapropriação (R1)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado: R\$ 7.990.183,00
- Valor atualizado: R\$ 5.853.722,10
  
- Justificativa das alterações: necessidade de ajuizamento do R5 (DUP a vencer em dezembro), além do R1, já previsto antes
- Situação: R1: Ações ajuizadas aguardando para complementar / R5: a ajuizar
  
- Valores empenhados: R\$ 5.853.722,10
- Valores liquidados: R\$ 5.853.722,10
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Balanço Geral 2014 - Drenagem

<b>Detalhamento</b>	<b>Total Pretendido</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
Córrego Ponte Baixa - Taxa CAIXA	3.395,28	3.395,28	3.395,28
Córrego Ponte Baixa - material expropriatório	1.291.237,92	1.291.237,92	1.144.760,30
Córrego Ponte baixa - trabalho social REAJUSTE	125.862,85	125.862,85	102.935,70
Bacia do Córrego do Cordeiro - material expropriatório	24.045,84	24.045,84	24.045,84
Gerenciadora Lote 1	14.800.000,00	14.800.000,00	12.191.330,64
Gerenciadora Lote 2	11.800.000,06	11.800.000,06	9.522.395,88
Licenciamento Ambiental (FUPAM)	0,00	0,00	0,00
Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego Paciência	729.762,60	729.762,60	729.657,01
Projeto de Drenagem do Córrego Tremembe	27.007,56	27.007,56	0,00
Rapadura - Projeto Básico e Executivo do Córrego	36.782,27	36.782,27	0,00
Córrego do Ipiranga - Material Expropriatório	0,00	0,00	0,00
Morro do S - Projeto Básico	0,00	0,00	0,00
Córrego Ponte Baixa - obra	42.191.605,46	42.191.605,46	38.083.967,33
Córrego Ponte Baixa - enterramento de rede elétrica	1.034.596,88	1.034.596,88	0,00
Bacia do Córrego do Cordeiro - obra	56.698.130,82	56.698.130,82	55.824.206,95
PRA 1	36.366.391,70	36.366.391,70	35.961.144,26
Curtume / Tiburtino	0,00	0,00	0,00
Córrego Ponte Baixa - desapropriação	18.700.000,00	11.309.997,00	11.309.997,00
Aricanduva - desapropriação (R8)	888.285,06	12.698,27	12.698,27
Bacia do Córrego do Cordeiro - desapropriação (R5)	7.674.578,87	0,00	0,00
Bacia do Córrego do Cordeiro - desapropriação (R1)	5.853.722,10	5.853.722,10	5.853.722,10
<b>TOTAL Drenagem</b>	<b>198.245.405,27</b>	<b>182.305.236,61</b>	<b>170.764.256,56</b>

Data base da ultima posição orçamentária: 31/12/14



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**MOBILIDADE**

# Material Expropriatório e Projetos - Corredores

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório e projetos, que são utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 2.421.006,24
- Justificativa das alterações: na segunda reunião estava aprovado somente material expropriatório parcial (limitado ao teto SIURB). Necessário cobrir toda necessidade e também revisão de projetos que está sendo feita para reduzir as desapropriações.
- Situação: Material expropriatório em elaboração / projeto em fase de sub-rogação (da SPTRANS para SP-OBRAS)
- Valores empenhados: R\$ 2.421.006,24
- Valores liquidados: R\$ 473.193,84
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.39.00.08



# Obra - Corredor Berrini

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

- Valor do contrato: R\$ 45.288.227,09.
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte
- Situação: Obra em andamento
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Obra - Corredor Binário Santo Amaro

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na seqüência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapeceira/João Dias/Santo Amaro .

- Valor do contrato: R\$ 39.998.460,66
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 2.800.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma
- Situação: Em andamento
- Valores empenhados: R\$ 2.800.000,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



17/11/14 - Av. Adolfo Pinheiro, 63



17/11/14 - R. Antônio Elias Zogbi, 42

# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido em toda sua extensão.

- Valor do contrato: R\$ 213.598.686,17
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
  
- Valor atualizado: R\$ 0,00
  
- Justificativa das alterações: início postergado pelo atraso no licenciamento ambiental
- Situação: Não iniciado
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Inajar de Souza - Obra

- **Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor.
  - **Valor do contrato:** R\$ 169.751.131,88
  - Valor atualizado: R\$ 0,00
  - Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte (federal)
  - **Situação:** Obra em andamento
  - Valores empenhados: R\$ 0,00
  - Valores liquidados: R\$ 0,00
  - Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Leste Radial 1 - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 439.751.838,21
- Valor pretendido: R\$ 12.000.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma e fontes
- Situação: Obra iniciada
- Valores empenhados: R\$ 11.466.107,46
- Valores liquidados: R\$ 10.665.268,62
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Radial 2 - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 148.757.190,16
- Valor pretendido: R\$ 1.500.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma e fontes
- Situação: Obra não iniciada
- Valores empenhados: R\$ 44.563,15
- Valores liquidados: R\$ 44.563,15
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Itaquera – trecho 1 - Obra

**Objeto:** Execução das obras do Programa de Mobilidade Urbana do empreendimento 4.

- Valor do contrato: R\$ 150.406.618,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido: R\$ 3.000.000,00
- Situação: *Obras não iniciadas*
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Aricanduva - Obra

**Objeto:** Execução das obras do Programa de Mobilidade Urbana do empreendimento 3.

- Valor do contrato: R\$ 114.438,223,05
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 1.950.000,00
- Situação: aguarda recurso para assinatura do contrato
- Valores empenhados: R\$ 950.000,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor M'Boi Mirim - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor. Ampliação da extensão das plataformas. Substituição de abrigos. Readequação de plataformas.

- Valor do contrato: R\$ 98.494.741,69
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
  
- Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte (federal)
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Inajar de Souza - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 5.118.999,00
  
- Justificativa das alterações: recálculo das complementações
- Situação: 11 ações ajuizadas.
  
- Valores empenhados: R\$ 4.873.375,24
- Valores liquidados: R\$ 4.873.375,24
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Binário Santo Amaro

## Desapropriação

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 5.018.617,77
- Justificativa das alterações: necessidade de ajuizamento pelo vencimento da DUP
  
- Situação: 41 ações ajuizadas
- Valores empenhados: R\$ 4.982.167,38
- Valores liquidados: R\$ 4.982.167,38
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: revisão do cronograma
- Situação: Aguarda publicação do DUP
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Leste Radial 1 - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
  
- Situação: Material expropriatório em elaboração.
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Leste Radial 2 - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014
- Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: cobertura parcial na 2ª reunião pelo limite do teto SIURB
- Situação: material expropriatório em elaboração
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Balanço Geral 2014 - Mobilidade

Detalhamento	Total Pretendido	Empenhado	Liquidado
Material expropriatório e projetos - Corredores	2.421.006,24	2.421.006,24	473.193,84
Corredor Berrini – Obra	0,00	0,00	0,00
Corredor Binário Santo Amaro – Obra	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia – Obra	0,00	0,00	0,00
Corredor Inajar de Souza – Obra	0,00	0,00	0,00
Corredor Leste Radial 1 – Obra	12.000.000,00	11.466.107,46	10.665.268,62
Corredor Leste Radial 2 – Obra	1.500.000,00	44.563,15	44.563,15
Corredor Leste Itaquera - trecho 1 - Obra	3.000.000,00	0,00	0,00
Corredor Leste Aricanduva - Obra	1.950.000,00	950.000,00	0,00
Corredor M'Boi Mirim – Obra	0,00	0,00	0,00
Corredor Inajar de Souza - Desapropriações	5.118.999,43	4.873.375,24	4.873.375,24
Corredor Binário Santo Amaro – Desapropriações	5.018.617,77	4.982.167,38	4.982.167,38
Corredor Capão Redondo Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriação	0,00	0,00	0,00
Corredor Leste Radial 1 – Desapropriações	0,00	0,00	0,00
Corredor Leste Radial 2 – Desapropriações	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Mobilidade</b>	<b>33.808.623,44</b>	<b>27.537.219,47</b>	<b>21.038.568,23</b>



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM + MOBILIDADE**



# Balanço Geral 2014 – Drenagem + Mobilidade

DETALHAMENTO	TOTAL PRETENDIDO	EMPENHADO	LIQUIDADO
DRENAGEM	198.245.405,27	182.305.236,61	170.764.256,56
MOBILIDADE	33.808.623,44	27.537.219,47	21.038.568,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>232.054.028,71</b>	<b>209.842.456,08</b>	<b>191.802.824,79</b>



**PREFEITURA DE**  
**SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA**  
**E OBRAS**
