



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM**

# Córrego do Cordeiro - Desapropriação

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

## Desapropriação:

1 Lote - RCO-5                   DUP concluído

3 Lotes - RCO-1                DUP concluído

RCO 2, 3, 4 e 6 - nada consta

Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 7.990.183,00

**Aprovado R\$ 4.000.000,00 > A aprovar R\$ 3.990.183,00**

- Situação: Ações ajuizadas parcialmente.
- Valores empenhados: R\$ 3.958.666,92
- Valores liquidados: R\$ 3.958.666,92
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Obra da Bacia do Córrego Cordeiro

Objeto: Realizar intervenções de controle de cheias na bacia do Córrego do Cordeiro com o objetivo na redução das ocorrências de enchentes.

6 reservatórios, 4 caixas de equalização de vazão e canalização de córrego.

- Valor do contrato: R\$ 142.927.466,72
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 47.700.000,00
- **Aprovado R\$ 38.600.000,00 > A aprovar R\$9.100.000,00**
- Situação: Obra em execução
- Valores empenhados: R\$ 24.904.583,16
- Valores liquidados: R\$ 3.051.006,90
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Córrego do Cordeiro – Material Expropriatório

Objeto: O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 9.817,00
- Valor solicitado FUNDURB 2014: **R\$ 9.817,00**
- Situação: Em contratação
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.08

# Córrego Ipiranga – Material Expropriatório

Objeto: O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 20.000,00
- Valor solicitado FUNDURB 2014: **R\$ 20.000,00**
- Situação: Em contratação
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.08

# Morro do S – Projeto Básico


Objeto: Elaboração do Projeto básico de canalização do Córrego Morro do S.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 270.813,43
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.08

# Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego da Paciência

Objeto: Estudo de drenagem e projeto básico de canalização , geométrico, pavimentação estrutural, licenciamento ambiental, iluminação, sinalização viária, desvio de tráfego e paisagismo do córrego paciência

- Valor do contrato: R\$ 1.153.133,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 729.762,60
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 729.762,60
- Valores liquidados: R\$ 627.542,72
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

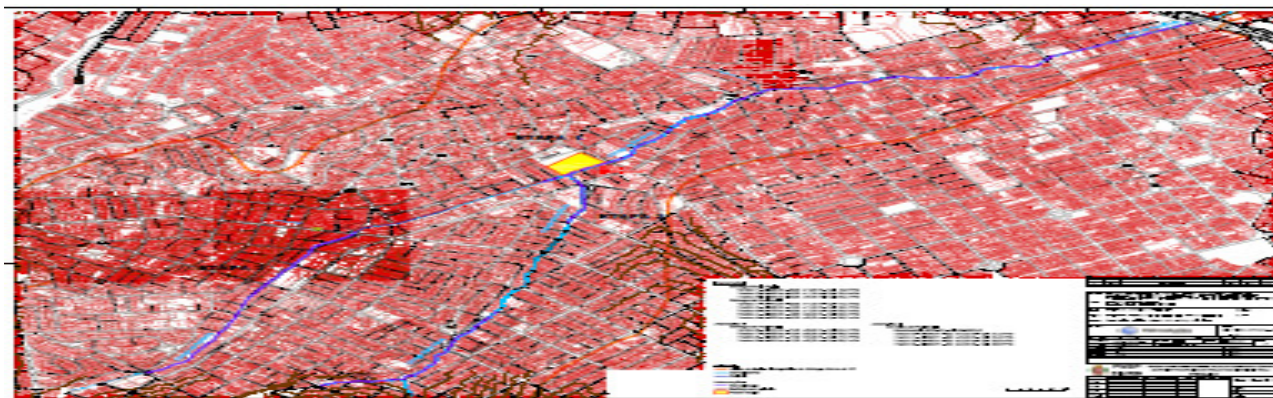



# Córrego Ponte Baixa - Desapropriação


Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

- Total previsto 300 unidades

Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 13.000.000,00

- Situação: Ações ajuizadas em fase de complementação.

- Valores empenhados: R\$ 8.119.774,04
- Valores liquidados: R\$ 8.119.774,04
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

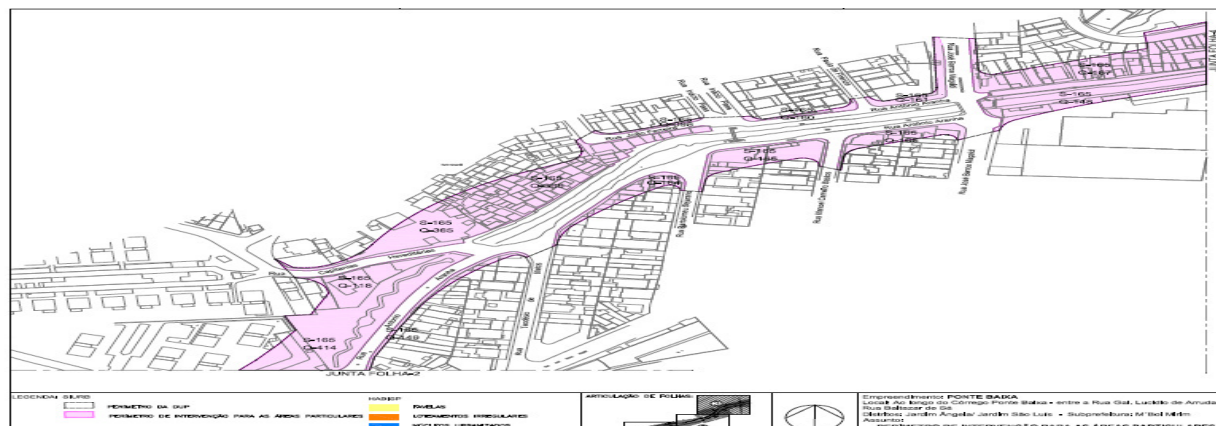



# Córrego Ponte Baixa - Enterramento de Rede

Objeto: Remanejamento de redes aéreas existentes para o modo subterrâneo para viabilizar as obras de canalização dos córregos Ponte Baixa e do jardim Letícia

- Valor solicitado FUNDURB (aprovado na reunião): R\$ 2.000.000,00
- Valor pretendido atualizado: R\$ 837.232,35 - Diferença de: R\$ (1.162.767,65)
- Justificativa: O valor apresentado era estimado e o atual corresponde ao orçamento recebido da Eletropaulo após reunião do FUNDURB
- Situação: Em contratação (AES Eletropaulo)
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Ponte Baixa - Material Expropriatório

Objeto: O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 1.291.237,92
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.291.237,92
- Situação: Material em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 1.291.237,92
- Valores liquidados: R\$ 335.771,52
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Obra do Córrego Ponte Baixa

Objeto: Execução de Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato: R\$ 399.375.476,80
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 10.191.605,46
- Situação: Obra em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 10.191.605,46
- Valores liquidados: R\$ 10.191,605,46
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Ponte Baixa – Trabalho Social Reajuste

Objeto: Reajustes referentes aos trabalhos sociais necessários

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 125.862,85
- Situação: Trabalho em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 62.931,43
- Valores liquidados: R\$ 14.648,40
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Taxa CEF Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Viabilizar prestação de contas para o PAC e garantir repasse do Governo Federal.

- Valor solicitado ao FUNDURB: R\$ 3.395,28
- Situação: Prestação de contas aprovada. Taxa paga.
  
- Valores empenhados: R\$ 3.395,28
- Valores liquidados: R\$ 3.395,28
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego Rapadura – Projeto Básico e Executivo


Objeto: Elaboração do Projeto básico e executivo de canalização do córrego Rapadura.

- Valor do contrato: R\$ 374.239,97
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 36.782,27
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 36.782,27
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego Tremembé - Projeto

**Objeto:** Projeto básico de Canalização de córregos associada à construção de 7 reservatórios de amortecimento de cheias (R-1, R-2, R-3A, R-3B, R-4, R-5 e R-6) e implantação de 6 parques lineares- ( $V = 217.000\text{m}^3$ )

- Valor do contrato: R\$ 604.962,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 4.015,12
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 4.015,12
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

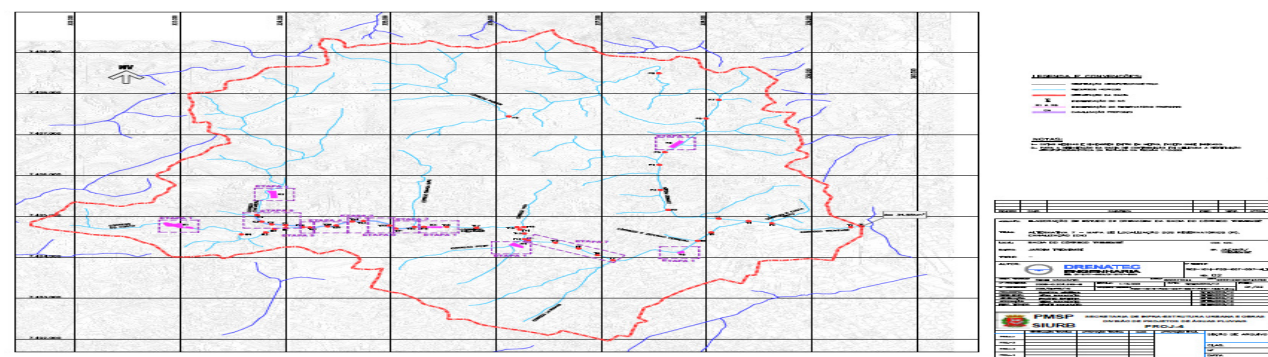



# Gerenciadora – Lote 1

Objeto: Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para Implantação de Programas de Infra-estrutura Urbana e de Edifícios Públicos.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 16.000.000,00
- Situação: Em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 5.636.363,64
- Valores liquidados: R\$ 3.959.970,01
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Gerenciadora – Lote 2


Objeto: Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para Implantação de Programas de Infra-estrutura Urbana e de Edifícios Públicos.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 16.000.000,00
- Situação: Em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 5.636.363,64
- Valores liquidados: R\$ 3.579.384,08
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Programa de Redução de Alagamentos PRA 2 – 1º etapa

Objeto: Inclui execução de galerias de águas pluviais, ampliação das captações existentes, recomposição de pavimento, contenção de margens e elaboração de projetos executivo e “as built” de 16 pontos de alagamento

- Valor do contrato: R\$ 28.985.328,68 (em licitação)
- Valor solicitado FUNDURB 2014 (aprovado na reunião): R\$ 24.179.328,68
- **Valor pretendido atual:** R\$ 0,00
- Justificativa: Após reunião, definiu-se pela troca do PRA-1 pelo PRA-2 na CAIXA. Portanto, o PRA-2 terá recursos federais.

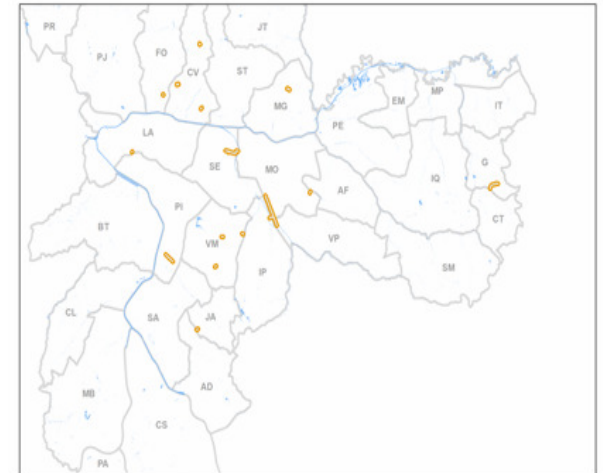

# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

Objeto: Inclui execução de galerias de águas pluviais, ampliação das captações existentes, recomposição de pavimento, contenção de margens e elaboração de projetos executivo e “as built” .

- Valor do contrato: R\$ 136.896.340,90
  - Valor solicitado FUNDURB (aprovado na reunião): R\$ 13.986.681,82
  - Valor pretendido atualizado: R\$ 36.460.988,68
  - Justificativa: Após reunião, definiu-se pela troca do PRA-1 pelo PRA-2 na CAIXA. Portanto, o PRA-1 não terá mais recursos federais e seu custo foi absorvido pela Municipalidade.
  - Situação: obra em andamento
- 
- Valores empenhados: R\$ 28.369.187,67
  - Valores liquidados: R\$ 0,00
  - Dotação orçamentária:
  - 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Córrego Limoeiro – Projeto Executivo

Objeto: Tendo em vista os problemas relacionados á drenagem do local, com freqüentes cheias em períodos de chuva e erosão das margens pelo transbordamento da calha original, faz-se necessário a contratação e execução de obras de canalização do Córrego Limoeiro, a partir da Rua Semente de Tudo até a Avenida Manoel dos Santos Braga.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.200.000,00
- Projeto aceito, valor não aprovado (além do limite da SIURB)

# Córrego Dois Irmãos – Obra + Projeto Executivo

Objeto: Tendo em vista os problemas relacionados à drenagem do local, com freqüentes cheias em períodos de chuva e erosão das margens pelo transbordamento da calha original, faz-se necessário a contratação e execução de obras de canalização do córrego Dois Irmãos, a partir de sua montante, na Avenida Luis Imparato até sua foz no Rio Tietê.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.450.000,00 não aprovado
- Projeto aceito, valor não aprovado (além do limite da SIURB)

# Córrego Rapadura - Desapropriação

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 5.000.000,00 não aprovado
- Projeto aceito, valor não aprovado (além do limite da SIURB)



# Córrego Rapadura – Obra + Projeto Executivo complementar

Objeto: Elaboração de projeto executivo complementar e execução de obras de canalização do Córrego Rapadura no trecho entre a Rua Visconde de Balsemao e sua foz no Rio Aricanduva.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.900.000,00
- Projeto aceito, valor não aprovado (além do limite da SIURB)

# Córrego Dois Irmãos – Desapropriação

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.400.000,00
- Projeto aceito, valor não aprovado (além do limite da SIURB)

# Balanço Geral 2014 - Drenagem

Bloco	Detalhamento	Autorizado Previamente	Valor apresentado na 1a reunião	Autoriz previam/e + ficha nova	Apresentado 2a reunião	
A	Córrego Ponte Baixa - obra	15.000.000,00	10.191.605,46	10.191.605,46	10.191.605,46	
	Córrego Ponte Baixa - taxa CAIXA	0,00	3.395,28	3.395,28	3.395,28	
	Córrego Ponte Baixa - desapropriação	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
	Córrego Ponte Baixa - material expropriatório	1.056.237,92	1.291.237,92	1.291.237,92	1.291.237,92	
	Córrego Ponte baixa - trabalho social REAJUSTE	0,00	125.862,85	125.862,85	125.862,85	
	Córrego Ponte Baixa - enterramento de rede elétrica	0,00	2.000.000,00	837.232,35	837.232,35	
	Bacia do Córrego do Cordeiro - obra	15.000.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	47.700.000,00	
	Bacia do Córrego do Cordeiro - desapropriação	0,00	4.000.000,00	3.990.183,00	7.990.183,00	
	Bacia do Córrego do Cordeiro - material expropriatório	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00	
	Gerenciadora Lote 1	6.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
	Gerenciadora Lote 2	6.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
	Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego Paciência	145.949,00	729.762,60	729.762,60	729.762,60	
	Projeto de Drenagem do Córrego Tremembe	4.015,12	4.015,12	4.015,12	4.015,12	
	Rapadura - Projeto Básico e Executivo do Córrego	0,00	36.782,27	36.782,27	36.782,27	
	Córrego do Ipiranga - Material Expropriatório	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Morro do S - Projeto Básico	0,00	270.813,43	270.813,43	270.813,43	
	PRA 1	0,00	13.986.681,82	36.460.988,68	36.460.988,68	
	PRA 2	0,00	24.179.328,68	0,00	0,00	
	<b>Subtotal Drenagem A</b>		<b>56.206.202,04</b>	<b>140.439.485,43</b>	<b>137.571.695,96</b>	<b>150.671.695,96</b>
		Córrego Limoeiro - Projeto Executivo	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Córrego Dois Irmãos - Obra + Projeto Executivo		0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
Córrego Rapadura - Desapropriação		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
Córrego Rapadura - Obra + Projeto Executivo Completo		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
Córrego Dois Irmãos - Desapropriação		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal Drenagem B</b>			<b>0,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Drenagem</b>		<b>56.206.202,04</b>	<b>151.389.485,43</b>	<b>137.571.695,96</b>	<b>150.671.695,96</b>	



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**MOBILIDADE**

# Obra - Corredor Berrini

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

- Valor do contrato: R\$ 45.288.227,09.
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.144.000,00
- Situação: Obra em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Obra - Corredor Binário Santo Amaro

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na seqüência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapequerica/João Dias/Santo Amaro .

- **Valor do contrato:** R\$ 39.998.460,66
- **Valor solicitado FUNDURB 2014 (Apresentado na reunião):** R\$ 424.000,00
- **Valor pretendido atualizado:** R\$ 1.144.000,00 Diferença de: R\$ 720.000,00
- **Justificativa:** O valor apresentado era composto somente de P0. Após reunião, constatou-se a necessidade de pagar também reajuste (inclusive da parte fonte 02, pois o PAC não paga reajuste).
- **Situação:** Em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Binário Santo Amaro

## Desapropriação

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 12.000.000,00
- Valor atual: R\$ 0,00
- Justificativa: cronograma posterior a setembro com possibilidade de redução neste momento para atendimento a SEHAB com posterior re-aprovação após melhor arrecadação do fundo.
- Situação: 41 processos montados, ações serão ajuizadas com base nos laudos antigos, valores de ITBI atribuídos por DESAP e matrículas atualizadas. Processos em SPObras para digitalização do material expropriatório a obra está em andamento.
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08



# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido em toda sua extensão.

- Valor do contrato: R\$ 213.598.686,17
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 3.552.000,00
- Situação: Em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriações

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 30.000.000,00
- Valor atual: R\$ 5.000.000,00
- Justificativa: cronograma majoritariamente após setembro com possibilidade de redução neste momento para atendimento a SEHAB com posterior re-aprovação após melhor arrecadação do fundo.
- Situação: Aguarda publicação do DUP
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Inajar de Souza - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor.

- Valor do contrato: R\$ 169.751.131,88
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 8.760.000,00
- Situação: Obra em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Corredor Inajar de Souza - Desapropriações

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor do contrato: R\$
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 8.000.000,00
- Situação: Reservas de verba publicadas em 04/04/14. Processos em DESAP para ajuizamento das 11 ações expropriatórias
  
- Valores empenhados: R\$ 4.777.765,58
- Valores liquidados: R\$ 4.777.765,58
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Corredor Leste Radial 1 - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 439.751.838,21
- Valor solicitado FUNDURB 2014 (Apresentado na reunião): R\$ 3.180.000,00
- Valor pretendido atual: R\$ 5.940.000,00    Diferença: R\$ 2.760.000,00
- Justificativa: O valor apresentado era composto somente de P0. Após reunião, constatou-se a necessidade de pagar também reajuste (inclusive da parte fonte 02, pois o PAC não paga reajuste).
- Situação: Obra em andamento
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08





# Corredor Leste Radial 1 - Desapropriações

Objeto: O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.


Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor do contrato: R\$
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 10.000.000,00
- Situação: Material expropriatório em elaboração.
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Leste Radial 2 - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 148.757.190,16
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 2.824.800,00
- Situação: Obra em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08

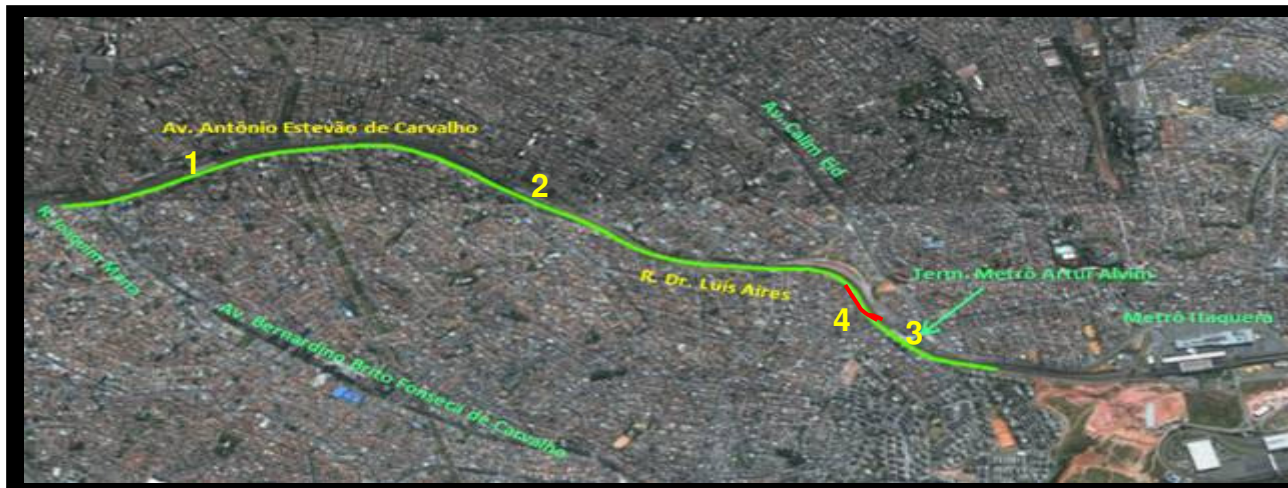

## Integração:

1. Estação Guilhermina Esperança (Linha 3 Metrô)
2. Estação Patriarca (Linha 3 Metrô)
3. Estação Artur Alvim (Linha 3 Metrô)

# Corredor Leste Radial 2 - Desapropriações

*Objeto:* O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014 (Apresentado na reunião): R\$ 30.000.000,00
- Valor atual: R\$ 23.284.394,19
- Justificativa: cronograma parcialmente após setembro com possibilidade de redução neste momento para atendimento a SEHAB com posterior re-aprovação após melhor arrecadação do fundo.
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08



# Corredor M'Boi Mirim - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor. Ampliação da extensão das plataformas. Substituição de abrigos. Readequação de plataformas.

- Valor do contrato: R\$ 98.494.741,69
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 3.312.000,00
- Situação: Obra em andamento
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Material Expropriatório - Corredores

Objeto: O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 14.300.000,00
- **Aprovado R\$ 2.367.109,85 > Não aprovado (além do limite) R\$ 11.932.890,15**
- Situação: Material expropriatório em elaboração.
  
- Valores empenhados: R\$ 921.006,24
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Balanço Geral 2014 - Mobilidade

Bloco	Detalhamento	Autorizado Previamente	Valor apresentado na 1a reunião	Autoriz previam/e + ficha nova	Apresentado 2a reunião
A	Corredor Inajar de Souza - Desapropriações	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Corredor Berrini – Obra	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
	Corredor Binário Santo Amaro – Obra	0,00	424.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
	Corredor Binário Santo Amaro – Desapropriações	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia – Obra	0,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00
	Corredor Capão Redondo Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriação	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00
	Corredor Inajar de Souza – Obra	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
	Corredor Leste Radial 1 – Obra	0,00	3.180.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00
	Corredor Leste Radial 1 – Desapropriações	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Corredor Leste Radial 2 – Obra	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	2.824.800,00
	Corredor Leste Radial 2 – Desapropriações	0,00	30.000.000,00	29.384.394,19	23.284.394,19
	Corredor M`Boi Mirim – Obra	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00
	Material expropriatório - Corredores	0,00	2.367.109,85	2.367.109,85	2.367.109,85
	<b>Subtotal Mobilidade A</b>	<b>0,00</b>	<b>115.563.909,85</b>	<b>118.428.304,04</b>	<b>75.328.304,04</b>
B	Material expropriatório - Corredores (Necessidade Complementar)	0,00	11.932.890,15	0,00	0,00
	<b>Subtotal Mobilidade B</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932.890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mobilidade</b>		<b>0,00</b>	<b>127.496.800,00</b>	<b>118.428.304,04</b>	<b>75.328.304,04</b>



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM + MOBILIDADE**

# Balanço Geral 2014 – Drenagem + Mobilidade

Grupo	Bloco	Detalhamento	Autorizado Previamente	Valor apresentado na 1a reunião	Autoriz previam/e + ficha nova	Apresentado 2a reunião
Drenagem	A	Subtotal Drenagem A	56.206.202,04	140.439.485,43	137.571.695,96	150.671.695,96
		Subtotal Drenagem B	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00
		<b>Total Drenagem</b>	<b>56.206.202,04</b>	<b>151.389.485,43</b>	<b>137.571.695,96</b>	<b>137.571.695,96</b>
Mobilidade	A	Subtotal Mobilidade A	0,00	115.563.909,85	118.428.304,04	75.328.304,04
	B	Subtotal Mobilidade B	0,00	11.932.890,15	0,00	0,00
		<b>Total Mobilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>127.496.800,00</b>	<b>118.428.304,04</b>	<b>75.328.304,04</b>

	A	Total Drenagem A + Mobilidade A	56.206.202,04	256.003.395,28	256.000.000,00	226.000.000,00
	B	Total Drenagem B + Mobilidade B	0,00	22.882.890,15	0,00	0,00
		<b>Total Drenagem e Mobilidade</b>	<b>56.206.202,04</b>	<b>278.886.285,43</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>226.000.000,00</b>

**Total da SIURB reduzido de R\$ 256 milhões para R\$ 226 milhões para atendimento imediato a SEHAB com posterior re-aprovação para SIURB após melhor arrecadação do fundo.**



# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**
