# Prestação de Contas Anual – SMSO

Execução dos Recursos - 2016

#### **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Mar/2017



# Prestação de Contas 2016 – SMSO - Aprovado x Execução

ОВЈЕТО	VALOR TOTAL APROVADO/ DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
Córrego Itaim (projeto)	544.613,98	537.937,94	227.997,67
Ponte Baixa	12.887.566,14	12.887.566,14	12.887.566,14
Córrego Freitas	936.574,67	936.574,67	-
Material Expropriatório Mobilidade	415.000,00	340.791,92	340.791,92
Corredor Binário Santo Amaro	350.000,00	350.000,00	302.674,44
Corredor M'Boi Cachoeirinha	1.566.200,90	1.566.200,90	90.032,50
Obra de Emergência - Avenida Ricardo Jafet com a Rua Ouvidor Peleja.	1.780.036,93	1.780.036,93	1.743.311,83
Obra de Emergência - Av. Professor Abraão de Morais	8.579.946,18	8.579.946,18	8.579.946,18
Obra de Emergência - Pontilhão sobre o Córrego Maria Paula.	787.759,80	787.759,80	685.829,43
Corredor M'Boi Mirim - Requalificação - DEA	2.638.493,75	2.638.493,75	2.638.493,75
Terminal Itaquera	11.920.120,00	11.920.120,00	11.920.120,00
CEUs (em conjunto com SMDU e SME)	51.400.000,00	51.400.000,00	50.142.135,41
SPOBRAS - Projetos Itaquera - DEA	646.354,04	646.354,04	646.354,04
Corredor Leste Itaquera 1 - DEA	787.445,06	787.445,06	787.445,06
TOTAL	95.240.111,45	95.159.227,33	90.992.698,37

# **CONTRATOS**

Execução 2016



# **CÓRREGO ITAIM (projeto)**

NOME	VALOR (R\$)	
Projeto Córrego Itaim	R\$ 544.613,98	
ESTÁGIO	AÇÃO	

Projeto em andamento

Estudos da bacia do Córrego Itaim e apresentação de alternativas para eliminação dos alagamentos, bem como elaboração de projetos funcional e executivo das obras prioritárias.

Empenhado	Liquidado
537.937,94	227.997,67

#### Projetos em andamento

CONTRATO 084/SIURB/2015

Valor do Contrato: R\$ 565.946,74

Processo: 2015-0.099.513-0

Empresa Contratada: Geómétrica Eng. de Projetos Ltda.

#### Fotos dos alagamentos na região do Córrego Itaim





#### **PONTE BAIXA**

NOME	VALOR (R\$)		11. 11. 1.
Ponte Baixa	12.887.566,14	Empenhado	Liquidado
ESTÁGIO	AÇÃO	12.887.566,14	12.887.566,14

Em andamento

Finalização das obras de drenagem e mobilidade e pagamento de ações desapropriatórias.

#### Contrato nº 014/SIURB/12

Valor do Contrato: R\$ 532.357.918

Processo: 2011-0.014.531-8 Empresa Contratada: CCCMJ



# **Drenagem – Freitas**

NOME VALOR (R\$)

Drenagem - Freitas 936.574,67

**ESTÁGIO** 

**AÇÃO** 

Em execução – Projetos Executivos Elaboração de Projetos Executivos, contemplando todos os documentos complementares, para o controle de cheias do Córrego Freiras e execução das obras.

Empenhado Liquidado

936.574,67


**Execução**: Projetos Executivos em andamento.

RDC Presencial nº 006/15/SIURB

Valor do Contrato: R\$ 112.050.840,11

Processo: 2015-0.113.934-3

Empresa: Consórcio DP Barros/FBS

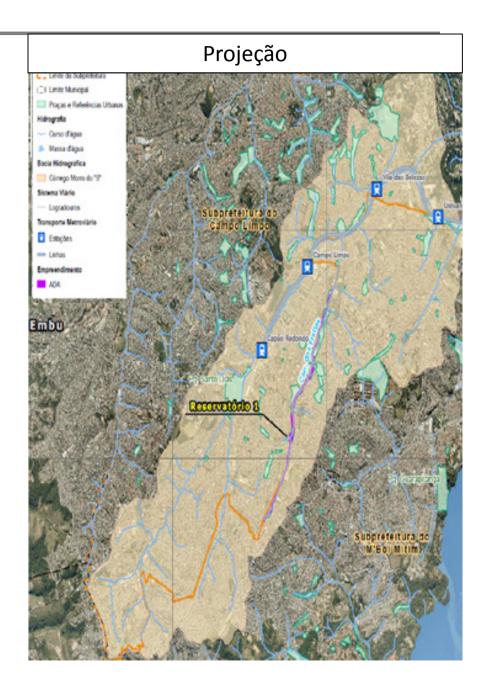

# Material Expropriatório – Programa Mobilidade Urbana

NOME	VALOR (R\$)	Empenhado	Liquidado
Material Expropriatório – Programa Mobilidade	415.000,00	340.791,92	340.791,92

ESTÁGIO AÇÃO

Contratos em andamento

Contratação de material expropriatório visando a implantação de corredores de ônibus no âmbito do Programa de Mobilidade Urbana.

#### **Detalhamento**

- Contrato 081/SIURB Corredor Radial Leste Processo 2015-0.260.543-7 R\$ 217.637,33
- Contrato 082/SIURB Corredor Aricanduva Processo 2015-0.260.539-9 -R\$ 41.359,25
- Contrato 083/SIURB Corredor Capão Redondo Processo 2015-0.281.058-8 R\$ 81.795,34

#### **Corredor Binário Santo Amaro**

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Binário Santo Amaro	350.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO
	Medição final do Contrato de

Em andamento – fase final

Medição final do Contrato de elaboração de projetos executivos e execução das obras do empreendimento 7 — Binário Santo Amaro, integrante do Programa de Mobilidade Urbana.

Empenhado	Liquidado
350.000,00	302.674,44

**CONTRATO** 048/SIURB/2013

Valor do Contrato: R\$ 47.870.597,57

Processo: 2013-0.136.189-1

Empresa Contratada: ENPAVI/CETENCO

## **FOTOS**



Largo 13 de Maio Av. Adolfo Pinheiro Largo Boneville

## M'BOI CACHOEIRINHA

NOME	VALOR (R\$)
Corredor M'Boi Mirim/Cachoeirinha	1.566.200,90
<b>ESTÁGIO</b>	AÇÃO


Em execução – Projetos Executivos Elaboração de projeto executivo e execução das obras de melhoramento e alargamento da Estrada M'boi Mirim, desde a Rua Riberalta até a Av. dos Funcionários Públicos e implantação do corredor de ônibus M'Boi Mirim.

Empenhado	Liquidado
1.566.200,90	90.032,50

**Execução**: Contrato recém assinado. Ordem de início ainda não emitida.

RDC PRESENCIAL № 010/15/SIURB Valor do Contrato: em contratação Processo: 2015-0.334.502-1

Projeção

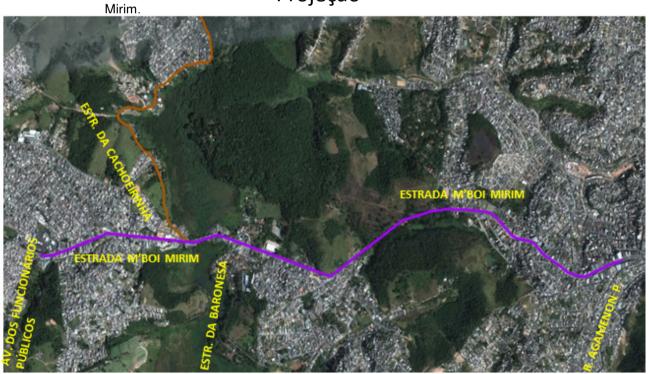

# Ipiranga (Abraão de Morais x Ouvidor Peleja)

NOME	VALOR (R\$)
lpiranga (Abraão de Morais x Ouvidor Peleja)	1.780.036,93
ESTÁGIO	AÇÃO

Concluída

Obras de recuperação da via que margeia o córrego e serviços complementares

Empenhado	Liquidado
1.780.036,93	1.743.311,83

Processo: 2016-0.043.428-9

**Contrato:** Emergencial

Empresa: FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A

**ORDEM DE INÍCIO**: 24/02/2016

PRAZO: 180 dias corridos

## **FOTOS**



Antes Depois

## Abraão de Morais

NOME	VALOR (R\$)
Abraão de Morais	8.579.946,18
ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	Recuperação do pontilhão no cruzamento da Av. Prof. Abraão de Morais x Rua Dom Bernardo Nogueira e serviços complementares.

Empenhado	Liquidado
8.579.946,18	8.579.946,18

Processo: 2016-0.133.950-6

**Contrato:** Emergencial

**Empresa:** ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

**ORDEM DE INÍCIO:** 09/06/2016

PRAZO: 180 dias corridos

## **FOTOS**



Antes Durante

#### Pontilhão Maria Paula

NOME VALOR (R\$)

Av. Gustavo Adolfo, pontilhão sobre o Córrego

787.759,80

Maria Paula.

ESTÁGIO AÇÃO

Concluída – medições finais

Obras de recuperação total do pontilhão sobre o Córrego Maria Paula. Empenhado Liquidado 787.759,80 685.829,43

Processo: 2016-0.144.445-8

**Contrato:** Emergencial

**Empresa:** CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

**EIRELI** 

**ORDEM DE INÍCIO: 23/06/2016** 

PRAZO: 90 dias corridos







# **Corredor M'Boi Mirim**

NOME	VALOR (R\$)	
Corredor M'Boi Mirim	2.638.493,75	
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento – fase final	DEA referente à reajuste do Contrato de execução das obras do empreendimento 6 – Corredor M´Boi Mirim, integrante do Programa de Mobilidade Urbana.	

Empenhado	Liquidado
2.638.493,75	2.638.493,75

#### CONTRATO 047/SIURB/2013

**Valor do Contrato:** R\$ 116.661.203,46

Processo: 2013-0.136.129-8

**Empresa Contratada**: ARVEK /DP BARROS



## **TERMINAL ITAQUERA E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2**

NOME	VALOR (R\$)	
Terminal Itaquera (Passarela)		Empen
Corredor Leste aquera 2 (trecho binário)	11.920.120,00	11.920.120,00
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	<ul> <li>Construção de passarela de interligação Terminal/Metrô/CPTM</li> </ul>	

Trecho de Corredor denominado Binário Av. Itaquera

Em andamento

NTRATO 051/SIURB/2013

or do Contrato: R\$ 456.360.434,19

ocesso: 2013-0.136.203-0

Empresa Contratada: Camargo Côrrea / Constran

## **FOTOS**



Terminal Itaquera Corredor Av. Itaquera Corredor Av. Líder

#### Centros Educacionais Unificados - CEU

NOME VALOR (R\$)

Centros Educacionais
Unificados - CEU

VALOR (R\$)

Empenhado

Liquidado

51.400.000,00

51.400.000,00

50.142.135,41

#### **ESTÁGIO**

Contratos em andamento

#### **DETALHAMENTO DA AÇÃO**

- R\$ 45,4 milhões necessários para continuidade das obras e serviços de engenharia dos seguintes CEUS:
  - CEU Parque Novo Mundo
  - CEU Freguesia Ó
  - CEU Vila Alpina/Vila Prudente
  - CEU José Bonifácio (São Pedro)
  - CEU Parque do Carmo
  - CEU São Miguel
  - CEU Carrão/Tatuapé
  - CEU Jose de Anchieta
- R\$ 6 milhões necessários para projetos executivos de 6 novos CEUS:
  - CEU Cidade Tiradentes
  - CEU Tremembé
  - CEU Campo Limpo
  - CEU Grajaú
  - CEU Pinheirinho D'Água
  - CEU Taipas

## **Centros Educacionais Unificados - CEU**

# FOTOS – Obras







Vila Prudente

Pq. Novo Mundo

Freguesia do Ó







São Pedro

Pq. do Carmo

Carrão





São Miguel

José de Anchieta

# **SPOBRAS - Projetos Itaquera - DEA**

NOME	VALOR (R\$)	Empenhado	Liquidado
Projetos Mobilidade	646.354,04	Linpolinado	Liquidado
Itaquera	3 10100 1,0 1	646.354,04	646.354,04

#### **ESTÁGIO**

Despesa de Exercício Anterior referente à execução de projetos executivos aos corredores Leste Itaquera.

#### **DETALHAMENTO DA AÇÃO**

**Processo:** 2014-0.313.896-2

Credor: São Paulo Obras - SPObras

**Objeto**: Despesas de exercícios anteriores – Pagamento de medição, relativas ao termo de Sub-Rogação SPTrans, projetos Terminal Rodoviário Satélite e Urbano de Itaquera - período de 01 a 31/12/2014, visando a prestação de serviços especializados de projetos e engenharia para desenvolvimento de estudos, laudos, projeto funcional, básico e executivo, estudos e licenciamentos ambientais e tecnologia da informação para o empreendimento Terminal Rodoviário Satélite e Urbano de Itaquera e reconfiguração do Sistema Viário Principal e

Acessos.

# **Corredor Leste Itaquera 1 - DEA**

NOME VALOR (R\$)

Corredor Leste Itaquera 1

REMPENHADO

Empenhado

787.445,06

787.445,06

ESTÁGIO

AÇÃO

Em andamento

DEA referente à reajuste do Contrato de execução das obras do Corredor Leste Itaquera - Trecho 1, integrante do Programa de Mobilidade Urbana.

**CONTRATO 045/SIURB/2013** 

Valor do Contrato: R\$ 150.406.618,68

Processo: 2013-0.136.235-9

Empresa Contratada: CARIOCA/HELENO & FONSECA



