

**Prestação de Contas parcial
2018 SMSO x FUNDURB**

Nov/2018

Prestação de Contas Parcial 2018 – SIURB

PLANO DE INVESTIMENTO FUNDURB 2018 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 09/11/2018

INTERVENÇÕES	APROVADO ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
Mobilidade (Corredores, Terminais e Gerenciamento)	43.314.002	38.450.959	11.052.500
<i>Itaquera I</i>	19.650.414	17.116.523	6.838.837
<i>Itaquera II</i>	3.568.656	1.568.656	55.217
<i>Capão Redondo</i>	4.637.689	4.637.689	0
<i>Terminal Itaquera</i>	10.737.879	10.737.879	1.245.986
<i>Carlos Caldeira - Mobilidade</i>	503.152	174.000	0
<i>Gerenciamento</i>	3.910.364	3.910.364	2.606.612
<i>Servs. Terceiros Pessoa Jurídica Mobilidade</i>	305.848	305.848	305.848
Viário	5.056.998	153.442	0
<i>Viário Complementar (ligações)</i>	906.998	153.442	0
<i>Projeto para criação de viário e implantação de viário entre o Parque Cocaia e Jardim Castro Alves sobre canal da Represa Billings - Substitutivo Câmara</i>	4.150.000	0	0
Pontes e Viadutos	2.000	0	0
<i>Nova Ligação Pirituba-Lapa</i>	1.000	0	0
<i>Projetos - Pontes e Viadutos Fase I</i>	1.000	0	0
Drenagem	10.491.000	2.491.000	777.450
<i>Córrego Cordeiro</i>	0		
<i>Requalificação e reurbanização do Vale do Anhangabaú</i>	2.255.843	2.255.843	777.450
<i>Carlos Caldeira - Drenagem</i>	235.157	235.157	0
<i>Intervenção no Córrego do Freitas - Substitutivo Câmara</i>	8.000.000	0	0
Próprios Municipais	1.001.000	1.000.000	1.000.000
<i>Fábrica do Samba</i>	1.001.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL	59.865.000	42.095.401	12.829.950

PLANO DE APLICAÇÃO REVISADO - SMSO X FUNDURB

nov/18

ação	dotação	valor solicitad	Acréscimo / Redução	Valor Atualizado
Corredor Itaquera I - Obras e Instalações	98.22.26.453.3009.1.099.44905100.08	9.311.558	7.589.965	16.901.523
Corredor Itaquera I - Aquisição de Áreas	98.22.26.453.3009.1.099.44906100.08	25.000		25.000
Corredor Itaquera I - Serviços de Terceiros PJ	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08	190.000	2.533.891	2.723.891
TOTAL CORREDOR ITAQUERA I		9.526.558	10.123.856	19.650.414
Corredor Itaquera II - Obras e Instalações	98.22.26.453.3009.1.099.44905100.08	8.119.455	-6.670.799	1.448.656
Corredor Itaquera II - Aquisição de Áreas	98.22.26.453.3009.1.099.44906100.08	-	2.000.000	2.000.000
Corredor Itaquera II - Serviços de Terceiros PJ	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08	120.000		120.000
TOTAL CORREDOR ITAQUERA II		8.239.455	-4.670.799	3.568.656
Terminal Itaquera II - Obras e Instalações	98.20.26.453.3009.1.095.44905100.08	15.271.770	-4.533.891	10.737.879
TOTAL TERMINAL ITAQUERA II		15.271.770	-4.533.891	10.737.879
Corredor Capão - Obras e Instalações	98.22.26.453.3009.1.099.44905100.08	5.556.855	-919.166	4.637.689
Corredor Capão - Aquisição de Áreas	98.22.26.453.3009.1.099.44906100.08	-		-
Corredor Capão - Serviços de Terceiros PJ	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08	-		-
TOTAL CORREDOR CAPÃO		5.556.855	-919.166	4.637.689
Corredor Carlos Caldeira Filho - Obras e Instalações	98.22.26.453.3009.1.099.44905100.08	1.509.000	-1.005.848	503.152
TOTAL CARLOS CALDEIRA		1.509.000	-1.005.848	503.152
Gerenciamento SP Obras - Serviços de Terceiros PJ	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08	3.910.364		3.910.364
TOTAL GERENCIAMENTO		3.910.364	0	3.910.364

PLANO DE APLICAÇÃO REVISADO - SMSO X FUNDURB

nov/18

ação	dotação	valor solicitação	Acréscimo / Redução	Valor Atualizado
Trabalho Social Obras de Mobilidade - Serviços de Terceiros PJ	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08	300.000	-300.000	-
Terminal Carrão - Material Expropriatorio	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08		242.797	242.797
Binário Santo Amato - Material Expropriatorio	98.22.26.453.3009.1.099.44903900.08		58.084	58.084
Adequação Viária na Serra das Divisões	98.22.26.453.3009.1.099.44906100.08		4.966	4.966
TOTAL Divs. Mobilidade		300.000	5.848	305.848
Viário Complementar (CEU Pq. Novo Mundo) - Serviços de Terceiros PJ	98.22.15.451.3009.5.100.44903900.08	906.998		906.998
TOTAL VIÁRIO COMPLEMENTAR		906.998	0	906.998
Viário entre Pq. Cocaia e Jd. Castro Alves	98.22.15.451.3009.1.071.44903900.08	4.150.000		4.150.000
TOTAL VIÁRIO PQ. COCAIA E JD. CASTRO ALVES		4.150.000	0	4.150.000
Requal.e Reurbanização do Vale do Anhangabaú	98.22.17.451.3005.5.013.44905100.08	1.000.000	1.255.843	2.255.843
TOTAL VALE DO ANHANGABAÚ		1.000.000	1.255.843	2.255.843
Corredor Carlos Caldeira Filho - Obras e Instalações	98.22.17.451.3005.5.013.44905100.08	1.491.000	-1.255.843	235.157
TOTAL CARLOS CALDEIRA		1.491.000	-1.255.843	235.157
Córrego do Freitas (Substitutivo Orçamento)	98.22.17.451.3005.1.072.44905100.08	10.000.000	-2.000.000	8.000.000
TOTAL CÓRREGO DO FREITAS		10.000.000	-2.000.000	8.000.000
Fábrica do Samba	98.22.15.452.3022.5.088.44905100.08	1.000.000		1.000.000
TOTAL FÁBRICA DO SAMBA		1.000.000	0	1.000.000
TOTAL GERAL		62.862.000	-3.000.000	59.862.000

Obs.: Temos R\$ 3.000,00 em dotações que foram abertas com valores simbólicos

Mobilidade

(Corredores, Terminais e Gerenciamento)



CORREDOR LESTE ITAQUERA 1 [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
------	-------------

Corredor Leste Itaquera 1	19.650.414
---------------------------	------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	- Continuidade e finalização das obras do Corredor
--------------	--

CONTRATO 045/SIURB/2013

Valor do Contrato: R\$ 150.406.618,68


Processo: 2013-0.136.235-9

Empresa Contratada: CARIOCA/HELENO & FONSECA

LIQUIDADO

6.838.837

Projeção

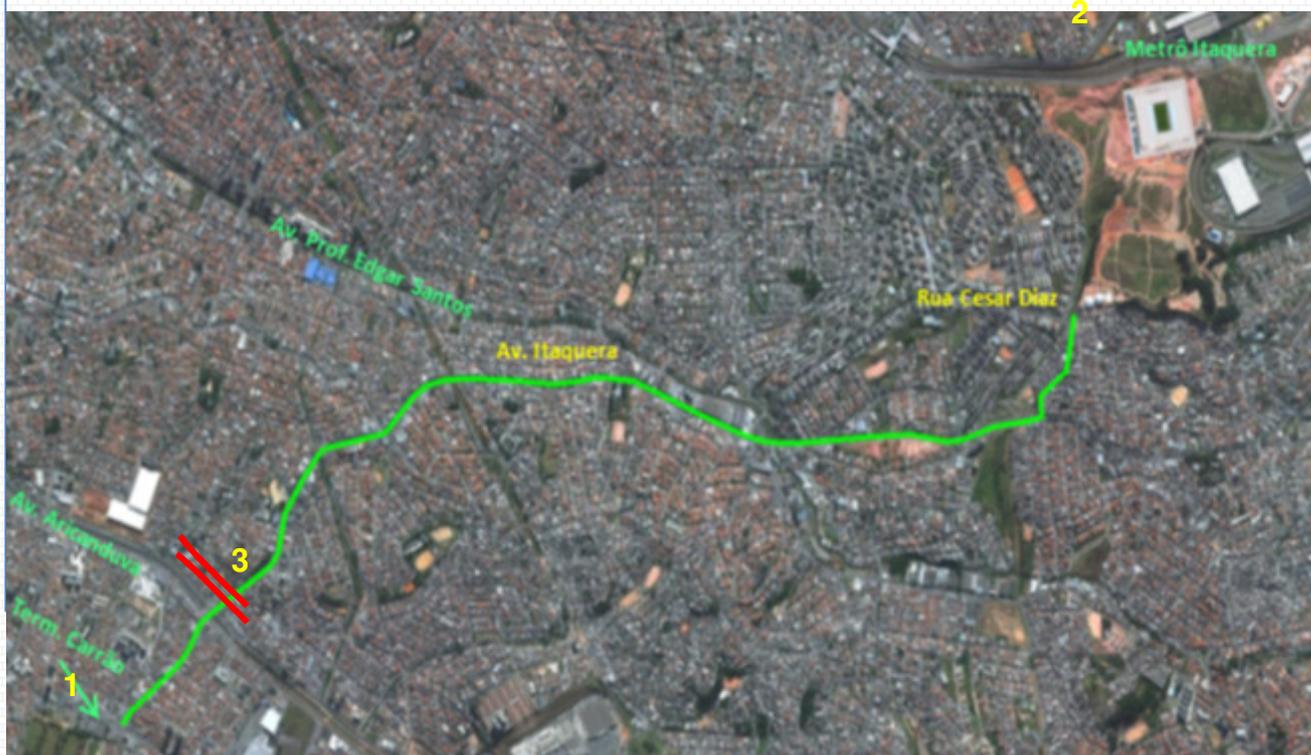

Integração:

1. Terminal de Ônibus Vila Carrão
2. Terminal / Estação Itaquera (Linha 3 Metrô / Linha 11 CPTM)

Composição da Obra:

3. Obra de arte: Viaduto Eixos 1 e 2 Av. Aricanduva sobre Av. Itaquera.

CORREDOR LESTE ITAQUERA 1 [30% mobilidade]

FOTOS:



Escavação para reforço do subleito



Execução de pavimento rígido



Execução de pavimento flexível

CORREDOR LESTE ITAQUERA 1 [30% mobilidade]



TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2 [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Terminal Itaquera Corredor Leste Itaquera 2	14.306.535
ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- Continuidade das obras do Terminal- Continuidade nas obras do Corredor denominado Leste Itaquera 2

CONTRATO 051/SIURB/2013
Valor do Contrato: R\$ 456.360.434,19
Processo: 2013-0.136.203-0
Empresa Contratada: Camargo Côrrea / Constran

LIQUIDADO
1.301.203

Projeção



TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2 [30% mobilidade]

FOTOS CORREDOR:



Demolição de pavimento flexível (asfalto) para abertura da caixa de construção da faixa do Corredor de Ônibus.



Abertura da caixa e escavação para construção da faixa do Corredor de Ônibus.

TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2 [30% mobilidade]

FOTOS CORREDOR:



Av. Itaquera antes da reconstrução.



Início da demolição para construção da faixa do corredor de Ônibus.

TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2 [30% mobilidade]

FOTOS TERMINAL:



Vista do bombeamento de água na área de escavação do terminal



Retirada de forma do bloco e viga de travamento

TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA 2 [30% mobilidade]

FOTOS TERMINAL:



Lançamento de concreto para construção da viga de coroamento



Vista do andaime para construção da viga de coroamento

CORREDOR CAPÃO REDONDO [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Capão Redondo	4.637.689

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Elaboração de projetos

CONTRATO 046/SMSO/2013
Valor do Contrato: R\$ R\$ 213.175.405,41
Processo: 2013-0.136.122-0
Empresa Contratada: Consórcio S.A. Paulista / Construbase

LIQUIDADO

-

Projeção



CARLOS CALDEIRA [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Carlos Caldeira	509.000 <<< Mobilidade 235.157 <<< Drenagem

CONTRATO 098/SIURB/2015
Valor do Contrato: R\$ 179.324.091,18
Processo: 2015-0.183.093-3
Empresa Contratada: CONSÓRCIO CG – JZ

ESTÁGIO	AÇÃO
Início de Projeto Executivo	Execução de projeto executivo e de obras de prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho, da estrada de Itapecerica até a estrada M'Boi Mirim, passagem inferior para ligação com a estrada M'Boi Mirim, dois viadutos sobre o futuro reservatório, reservatório de amortecimento de cheias, canalização do córrego Água dos Brancos (Capão Redondo) e sistema de micro-drenagem.

LIQUIDADO
-

Projeção



Gerenciamento e Trabalho Social

Gerenciamento:

- Gerenciamento SP Obras – Mobilidade Urbana : **R\$ 3.910.364**

LIQUIDADO
2.606.612

- ✓ **Prestação de serviços de diversas atividades, como à elaboração de planos de ação integrados para intervenções necessárias ao Programa de Mobilidade Urbana.**

Servs. Terceiros Pessoa Jurídica Mobilidade:

- Serviços terc. diversos ref. obras dos Corredores e Terminal: **R\$ 305.848**

LIQUIDADO
305.848

Viário



Viário [30% mobilidade p/ vias com faixa exclusiva de ônibus]

Viário R\$ 5.056.998 :


LIQUIDADO
-




Entorno CEU Novo Mundo



Entorno Hosp. Parelheiros

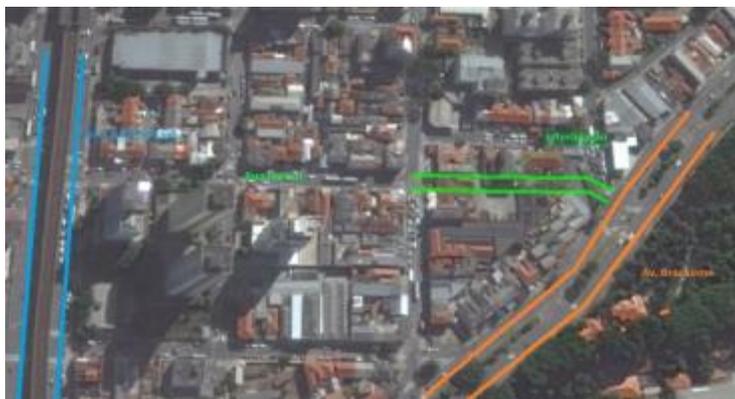

Duplicação Rua Darzan

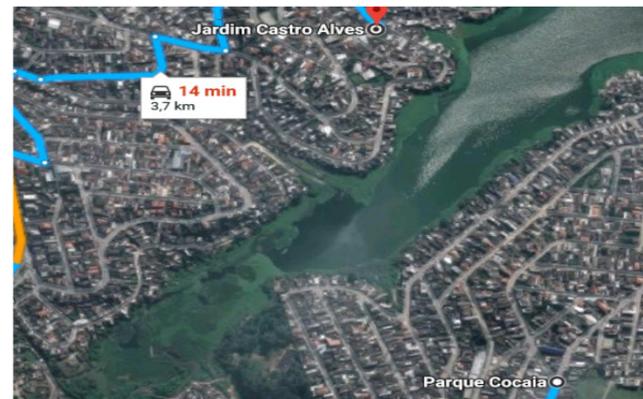

Viário entre Parque Cocaia e Jardim Castro Alves

SUBSTITUTIVO

Drenagem e Próprios Municipais



Drenagem e Próprios Municipais

Drenagem:

- Carlos Caldeira R\$ 235.157 - Reservatório de amortecimento de cheias, canalização do córrego Água dos Brancos (Capão Redondo) e sistema de micro-drenagem.

LIQUIDADO
-

- Requalificação e reurbanização do Vale do Anhangabaú R\$ 2.255.843

LIQUIDADO
777.450

- Intervenções no Córrego do Freitas R\$ 8.000.000

LIQUIDADO
-

Próprios Municipais:

- Continuidade das obras da Fábrica do Samba R\$ 1.001.000

LIQUIDADO
1.000.000



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
