

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Processo SEI 6020.2022/0035170-7



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Área Calma São Miguel)	R\$ 6.972.186,42	R\$ 6.284.178,54	R\$ 2.731.531,99	39,18%	MOB 2023
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras)	R\$ 12.763.616,87	R\$ 12.267.137,46	R\$ 601.546,57	4,71%	MOB 2023
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras)	R\$ 25.883.412,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	MOB 2023
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Cruzamento Elevado e Lombofaixa)	R\$ 82.094.326,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 58.494.199,65 (MOB 2022) R\$ 23.600.127,03 (MOB 2023)
Construção de Ciclovias	R\$ 21.826.984,26	R\$ 4.157.259,80	R\$ 657.560,01	3,01%	MOB 2023
Implantação de Corredores de Ônibus	R\$ 23.185.849,00	R\$ 23.185.849,00	R\$ 12.183.498,96	52,55%	MOB 2023
Implantação de Transporte Público Hidroviário	R\$ 3.201.041,67	R\$ 3.201.041,67	R\$ 1.645.540,30	51,41%	MOB 2023
Construção de Terminais de Ônibus	R\$ 112.267.075,06	R\$ 77.794.028,65	R\$ 67.948.104,78	60,52%	R\$ 99.700.000,00 (MOB 2021) R\$ 12.567.075,06 (MOB 2023)
Requalificação de do Pavimento de Paradas de Ônibus	R\$ 28.508.234,27	R\$ 28.508.234,27	R\$ 14.855.482,74	52,11%	MOB 2023
Dotações a manter	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	MOB 2023
TOTAL	R\$ 134.924.400,00	R\$ 78.092.538,77	R\$ 11.902.978,47	31,77%	

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

Situação inicial



Situação atual



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
R\$ 21.826.984,26	R\$ 4.157.259,80	R\$ 657.560,01	3,01%



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS (ED. PAULO FREIRE)

Situação inicial



Situação atual



IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
R\$ 23.185.849,00	R\$ 23.185.849,00	R\$ 12.183.498,96	52,55%

CORREDOR CELSO GARCIA



CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Obras – Trecho 1:

Em homologação.

Valor total aprovado:

R\$ 3.956.412,85

Valor liquidado/pago:

R\$ 1.603.213,89

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

Projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras:

- Contrato nº 2022/0195-01-00 - 25/06/2022
- Processo: 5010.2022/0002251-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Supervisão de obras e serviços ambientais:

- Contrato nº 2022/0421-01-00 - 09/12/2022
- Processo: 5010.2022/0005906-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 13.267.970,34

Valor liquidado/pago:

R\$ 8.169.258,75

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS)



Av. Líder, Outubro de 2023.

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024


Valor total aprovado:

R\$ 2.801.888,94

Valor liquidado/pago:

R\$ 1.703.754,60

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ

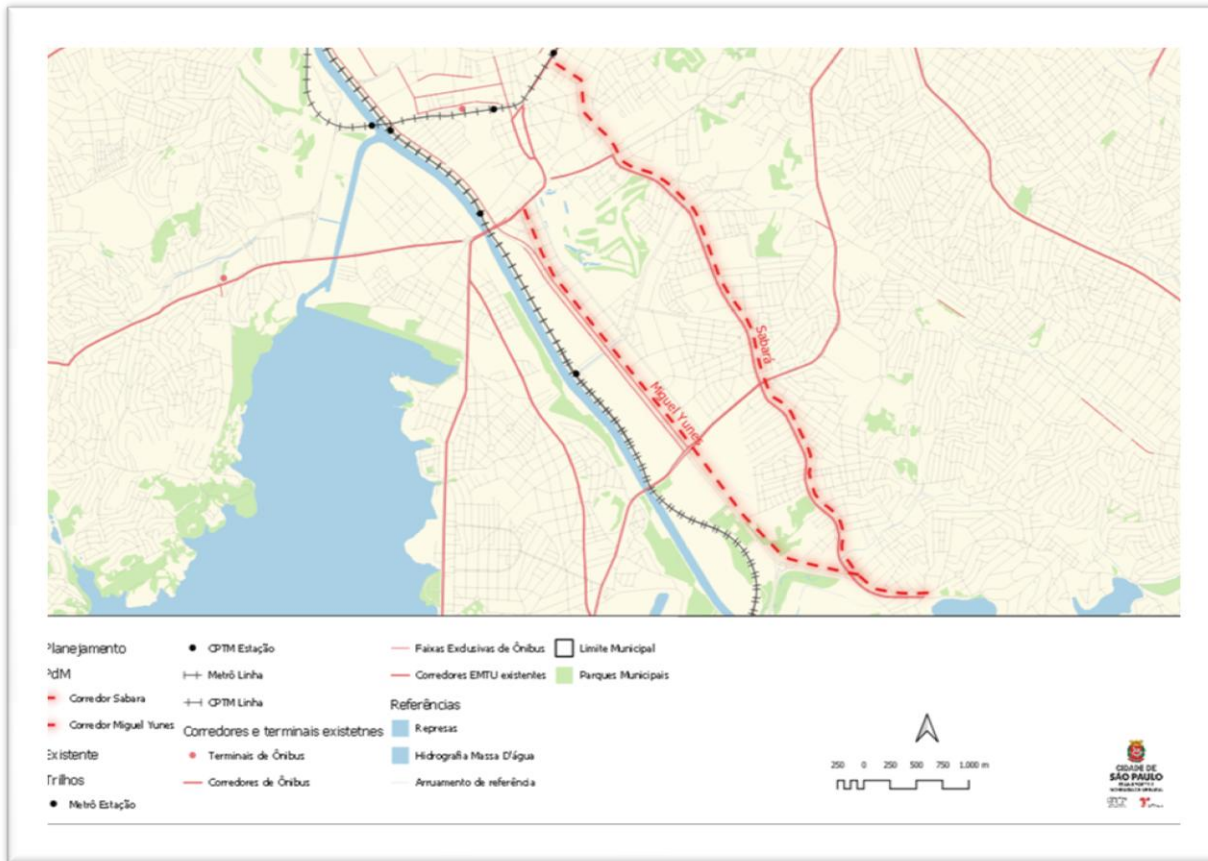

CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023
- Processo: 5010.2022/0021396-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Obras:

Em homologação.

Valor total aprovado:

R\$ 3.159.576,87

Valor liquidado/pago:

R\$ 707.271,72

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
R\$ 3.201.041,67	R\$ 3.201.041,67	R\$ 1.645.540,30	51,41%

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído 02/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído 03/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023


Valor total aprovado:

R\$ 3.201.041,67

Valor liquidado/pago:

R\$ 1.645.540,30

TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

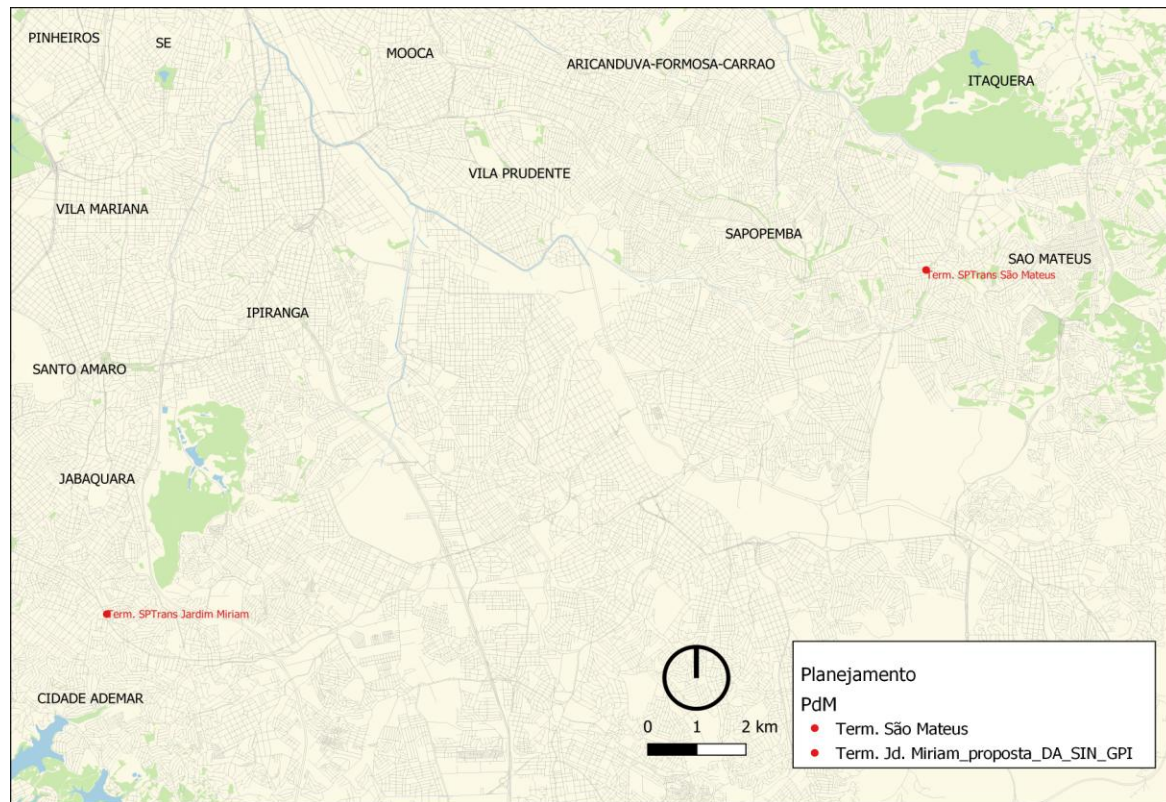

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Edital Licitação nº023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Valor total aprovado:

R\$ 4.196.564,23 (Projeto)
R\$ 1.000.000,00 (Depósitos judiciais para desapropriações)

Valor liquidado/pago:

R\$ 640.804,22 (Projeto)

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023



Valor total aprovado:

R\$ 8.370.510,83 (Projeto)
R\$ 98.700.000,00 (Depósitos judiciais para desapropriações)

Valor liquidado/pago:

R\$ 2.080.346,97 (Projeto)
R\$ 65.226.953,59 (Depósitos judiciais para desapropriações)

TERMINAL SÃO MATEUS

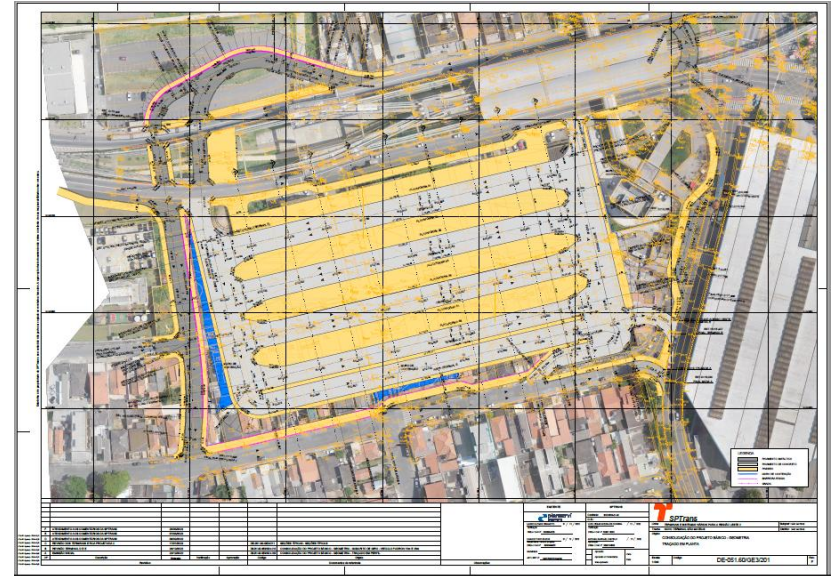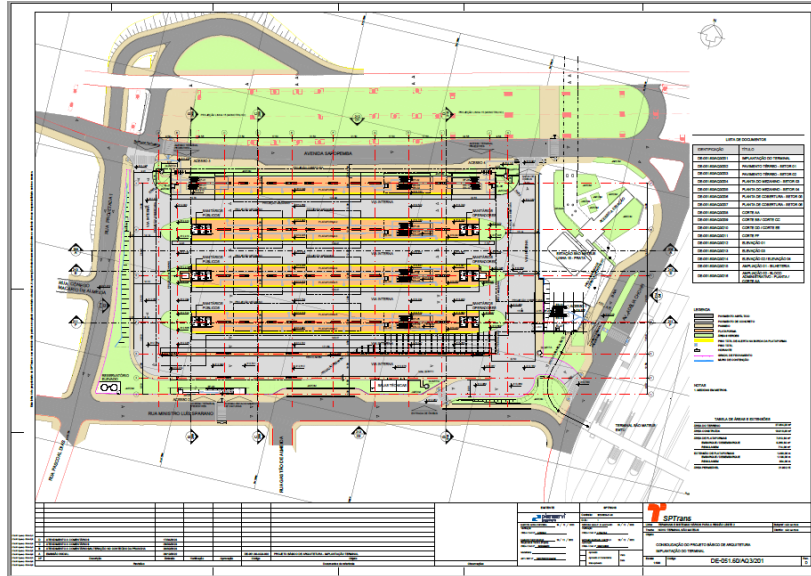

Consolidação do Projeto Básico - Terminal São Mateus - 1º semestre 2023

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Bloco de paradas nas Avenidas Rio das Pedras, Mateo Bei, Marechal Tito, Corifeu de Azevedo Marques, Vital Brasil e Dep. Emílio Carlos.

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
R\$ 25.083.811,27	R\$ 25.083.811,27	R\$ 14.855.482,74	59,22%




REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Latitude: -23.572582
Longitude: -46.724538
Elevação: 739.6343 m
Precisão: 59.3 m
Tempo: 27-04-2023 15:31
Av. Corifeu de Azevedo 1000



Latitude: -23.591418
Longitude: -46.489344
Altitude: 786.311 m
Precisão: 12.3 m
Tempo: 10-11-2023 15:33
Av. Mateo Bei 954

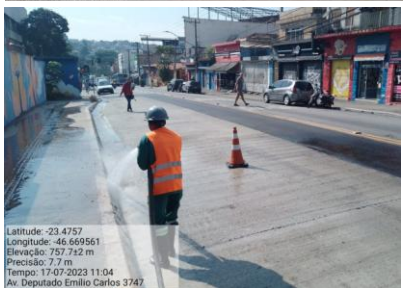

Latitude: -23.4757
Longitude: -46.669561
Elevação: 757.732 m
Precisão: 7.7 m
Tempo: 17-07-2023 11:04
Av. Deputado Emílio Carlos 3742



Av. Rio das Pedras, 246.



Latitude: -23.571118
Longitude: -46.709459
Elevação: 730.2641 m
Precisão: 16.9 m
Tempo: 09-05-2023 16:26
Av. Vital Brasil 569



Latitude: -23.572006
Longitude: -46.709111
Elevação: 729.4611 m
Precisão: 20.8 m
Tempo: 16-11-2023 09:51
Nota: Av. Vital Brasil, 139

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Previsão de conclusão das obras nas paradas das Avenidas Rio das Pedras, Mateo Bei, Marechal Tito, Corifeu de Azevedo Marques, Vital Brasil e Dep. Emílio Carlos no 2º semestre de 2023.

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 25.083.811,27

Valor liquidado/pago:

R\$ 14.855.482,74



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
