

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - 2019

PLANILHA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

Entrega: 18 de fevereiro de 2020

Execução orçamentária do FUNDURB (98.25)

Resumo por dotação orçamentária

RESUMO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDURB 2019

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Valor solicitado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
98.25.13.391.3001.5957.44903900.08	R\$ 1.258.151,81	R\$ 380.919,64	R\$ 380.919,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	R\$ 6.222.391,30	R\$ 3.086.710,61	R\$ 3.086.710,61	R\$ 70.770,56	R\$ 70.770,56	2,29%	2,29%
98.25.13.392.3001.5960.44903900.08	R\$ 1.430.937,02	R\$ 329.464,90	R\$ 329.464,90	R\$ 155.177,14	R\$ 155.177,14	47,10%	47,10%
98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	R\$ 4.717.813,24	R\$ 377.548,66	R\$ 377.548,66	R\$ 147.192,46	R\$ 147.192,46	38,99%	38,99%
	R\$ 13.629.293,37	R\$ 4.174.643,81	R\$ 4.174.643,81	R\$ 373.140,16	R\$ 373.140,16		

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado na Resolução SMDU.AOC.FUNDURB/007/2019

Item	Nome	Ação	Situação da ação	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
1	Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato	Reforma de manutenção predial da Biblioteca e da Praça	Caderno técnico em elaboração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
2	Arquivo Histórico Municipal e Cadopó/Torre da Memória	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra finalizada	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
		Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	100,00%	100,00%
3	Biblioteca Alceu Amoroso Lima	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	100,00%	100,00%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra finalizada	R\$ 37.498,64	R\$ 37.498,64	R\$ 32.308,57	R\$ 32.308,57	86,16%	86,16%
4	Biblioteca Anne Frank e Teatro Décio de Almeida Prado (Centro Cultural da Diversidade)	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 3.622,17	R\$ 3.622,17	78,37%	78,37%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 87.233,29	R\$ 87.233,29	R\$ 42.060,00	R\$ 42.060,00	48,22%	48,22%
5	Biblioteca Lenyra Fraccaroli	Conservação da cobertura e acessibilidade	Obra em execução	R\$ 264.064,22	R\$ 264.064,22	R\$ 155.177,14	R\$ 155.177,14	58,76%	58,76%
6	Biblioteca Nuto Sant'anna	Reforma do forro e conservação	Aguardando início de nova licitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
7	Centro Cultural Vila Formosa (Biblioteca Paulo Setubal e Teatro Zanoni Ferrite)	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 65.400,68	R\$ 65.400,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 2.622,17	R\$ 2.622,17	56,73%	56,73%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
8	Biblioteca Prefeito Prestes Maia e Teatro Leopoldo Froes (Centro Cultural Santo Amaro)	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 98.083,00	R\$ 98.083,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CVMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 3.622,17	R\$ 3.622,17	78,37%	78,37%
9	Casa da Imagem	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 3.622,17	R\$ 3.622,17	78,37%	78,37%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
10	Casa de Cultura Brasilândia	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11	Casa de Cultura Campo Limpo	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma para implantação de plataforma elevatória	Elaboração de caderno técnico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12	Casa de Cultura Ermelino Matarazzo	Reforma geral	Elaboração de caderno técnico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
13	Casa de Cultura Freguesia do Ó - Salvador Ligabue	Reforma para implantação de plataforma elevatória	Elaboração de caderno técnico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
14	Casa de Cultura Guaianases	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Requalificação predial	Elaboração de caderno técnico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
15	Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
16	Casa de Cultura Hip Hop Sul	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
17	Casa de Cultura M'Boi Mirim	Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 40.017,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
18	Casa de Cultura Cidade Ademar	Contratação de projeto executivo	Elaboração de caderno técnico	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
19	Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça	Reforma de manutenção predial	Aguarda início de nova licitação	R\$ 414.711,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
20	Casa de Cultura São Mateus	Projeto de requalificação	Elaboração de caderno técnico	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
21	Casa de Cultura Vila Guilherme	Obras de adequação para acessibilidade e implantação de plataforma elevatória	Elaboração de caderno técnico	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
22	Casa de Cultura Butantã	Reforma para implantação de plataforma elevatória	Elaboração de caderno técnico	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
23	Casa de Cultura Ipiranga - Chico Science	Obras de adequação para acessibilidade e implantação de plataforma elevatória	Elaboração de caderno técnico	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
24	Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas	Laudos para verificação de trincas	Laudos em execução	R\$ 48.870,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 40.017,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
25	Casa de Cultura São Rafael	Requalificação predial	Elaboração de caderno técnico	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Construção de espaço da primeira infância - instalação de parklet	Elaboração de edital	R\$ 40.017,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
26	Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso	Serviços corretivos para obtenção de AVCB/CSECP - contratação de CMAR	Aguarda início de nova licitação	R\$ 77.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma do Estúdio de gravação - Contrapartida de convênio SICONV	Em fase de prorrogação do pré convênio	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.023,65	R\$ 4.023,65	R\$ 1.893,37	R\$ 1.893,37	47,06%	47,06%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Edital em elaboração	R\$ 109.756,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Contratação de laudo para reforma da trinca no espaço de convivência	Laudos em execução	R\$ 20.134,90	R\$ 7.145,84	R\$ 7.145,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
27	Centro Cultural da Penha	Reforma do palco	Aguarda início da licitação	R\$ 93.904,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Elaboração de edital	R\$ 57.373,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
28	Centro Cultural Olido	Retrofit e implantação da Galeria do DJ	Elaboração de edital	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
29	Centro Cultural São paulo	Projeto de segurança contra incêndio	Aguardando atualização do orçamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
30	Centro Cultural Tendal da Lapa	Projeto de Segurança elétrica	Aguarda início de nova licitação	R\$ 104.432,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
31	Centro Cultural Vila Formosa	Requalificação geral	Aguarda início da licitação	R\$ 168.178,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
32	Chácara Lane	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudo em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	100,00%	100,00%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra finalizada	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 28.710,56	R\$ 28.710,56	99,00%	99,00%
33	Edifício Sampaio Moreira	Obras de Restauro - segunda etapa	Obra em execução	R\$ 2.937.000,00	R\$ 2.156.294,92	R\$ 2.156.294,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Em andamento	R\$ 293.647,64	R\$ 293.647,64	R\$ 293.647,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
34	Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA)	Laudo e reforma de cobertura	Laudo em execução	R\$ 200.000,00	R\$ 32.772,00	R\$ 32.772,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
35	Museu da Cidadania e dos Direitos Humanos	Contratação da SP Obras para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para as atividades relativas ao gerenciamento e à elaboração de projeto executivo para a implantação do Museu da Cidadania e Direitos Humanos	Projeto em execução	R\$ 406.165,81	R\$ 406.165,81	R\$ 406.165,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
36	Polo Cultural e Criativo Vila Itororó	Reforma do telhado do galpão aberto ao público	Elaboração de caderno técnico	R\$ 136.830,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
37	Praça das Artes	2ª fase das obras da Praça das Artes	Aguarda reserva de recursos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
38	Sítio da Ressaca	Obra emergencial	Encerrado	R\$ 23.424,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
39	Solar da Marquesa de Santos	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 75.956,50	R\$ 75.956,50	R\$ 75.956,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
40	Teatro Alfredo Mesquita	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 51.479,18	R\$ 63.473,74	R\$ 63.473,74	R\$ 42.688,12	R\$ 42.688,12	67,25%	67,25%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
41	Teatro Arthur Azevedo	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma do forro, cobertura e reparos em geral	Obra em execução	R\$ 54.504,17	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Aguardando atualização do orçamento	R\$ 113.616,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
42	Teatro Cacilda Becker	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 59.983,00	R\$ 67.491,24	R\$ 67.491,24	R\$ 11.031,16	R\$ 11.031,16	16,34%	16,34%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
43	Teatro Décio de Almeida Prado	Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
44	Teatro Flávio Império	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21,63%	21,63%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 38.086,45	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 18.671,71	R\$ 18.671,71	61,22%	61,22%
		Serviços de engenharia elétrica para substituição do transformador	Edital em elaboração	R\$ 46.871,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
45	Teatro João Caetano	Projeto executivo para AVCB, Acessibilidade e Segurança	Obra finalizada	R\$ 190.000,00	R\$ 165.660,09	R\$ 165.660,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Adequação do piso da platéia para fixação de novas poltronas	Aguardando início de licitação	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
46	Teatro Paulo Eiró	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudo em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 3.622,17	R\$ 3.622,17	78,37%	78,37%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 37.400,00	R\$ 37.400,00	R\$ 37.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Obra de reforma para recuperação de cabine primária	Aguarda início de nova licitação	R\$ 59.756,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
47	Equipamentos da SMC	Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Aguarda formalização do contrato	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Aguarda formalização do contrato	R\$ 153.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
				R\$ 13.629.293,37	R\$ 4.174.643,81	R\$ 4.174.643,81	R\$ 373.140,16	R\$ 373.140,16		

Item	Nome	Ação	Situação da ação	VALOR SOLICITADO EM NOVEMBRO/2019	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor reservado	% de liquidação do valor empenhado
46	Teatro Paulo Eiró	Laudos técnicos de 16 equipamentos para obtenção AVCB e CSECP - prorrogação de contrato	Laudos em execução	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 4.622,17	R\$ 3.622,17	R\$ 3.622,17	78,37%	78,37%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	Obra em execução	R\$ 37.400,00	R\$ 37.400,00	R\$ 37.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB, CSECP, CMAR para 9 equipamentos	Aguarda início de nova licitação	R\$ 63.300,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Obra de reforma para recuperação de cabine primária	Aguarda início de nova licitação	R\$ 59.756,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
47	Equipamentos da SMC	Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Aguarda formalização do contrato	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
		Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Aguarda formalização do contrato	R\$ 153.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
				R\$ 13.629.293,37	R\$ 4.174.643,81	R\$ 4.174.643,81	R\$ 373.140,16	R\$ 373.140,16		

2. Arquivo Histórico Municipal e Cadopô/Torre da Memória

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (finalizada)



Serviços de elétrica



Guarda-corpos



Instalação de SPDA



Serviços de elétrica




Instalação de SPDA



Instalação de SPDA

3. Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (finalizada)

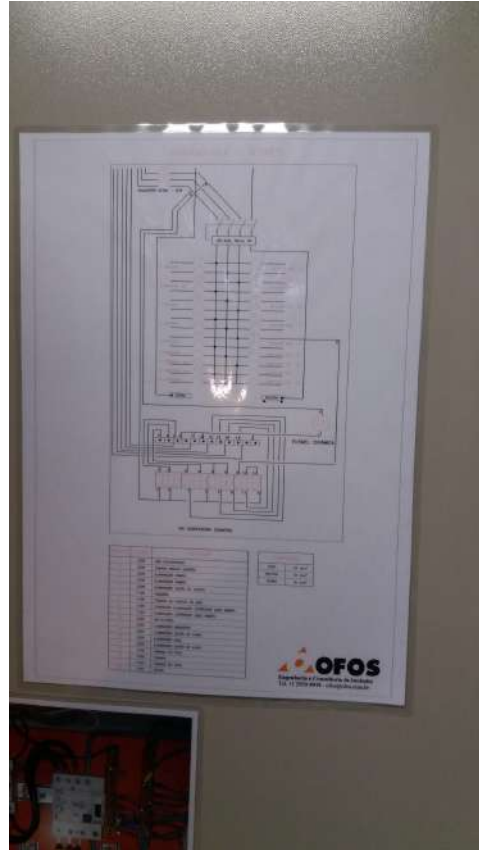

Serviços de elétrica

4. Biblioteca Anne Frank e Teatro Décio de Almeida Prado (Centro Cultural da Diversidade)

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Instalação de esguicho com engate rápido na plateia do Teatro Décio de Almeida Prado



Instalação do SPDA na Biblioteca e no Teatro



Instalação de esguicho com engate rápido



Instalação do SPDA na Biblioteca e no Teatro

5. Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Reforma e acessibilidade (em andamento)



Troca de esquadrias e portas e pintura



Pintura externa



Pintura interna, piso reformado e elétrica



Raspagem e aplicação de resina



Estrutura/cobertura (durante)



Estrutura/cobertura (depois)

7. Centro Cultural Vila Formosa (Biblioteca Paulo Setúbal e Teatro Zanoni Ferrite)

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Central de alarme



Sirene



Quadro elétrico



Hidrante



Detectores de incêndio



Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

8. Biblioteca Prefeito Prestes Maia e Teatro Leopoldo Fróes (Centro Cultural Santo Amaro)

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Hidrante



Iluminação de emergência



Quadro elétrico



Quadro elétrico

33. Edifício Sampaio Moreira

Obras complementares - 2º fase (em andamento)



Instalação do elevador de serviço



Fechamento da escada de emergência



Instalação de perfis metálicos - Estrutura de fechamento da escada de emergência



Aplicação de pintura intumescente



Instalação de balancins



Restauração e recomposição da fachada posterior esquerda.

40. Teatro Alfredo Mesquita

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Aterramento



Sinalização de emergência



Serviços de elétrica



Iluminação

41. Teatro Arthur Azevedo

Reforma do forro, cobertura e reparos em geral (em andamento)



Reforma do forro do saguão de entrada



Reforma do forro da plateia



Reforma do forro da plateia



Reforma do forro da plateia

42. Teatro Cacilda Becker

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Serviços de elétrica



Serviços de elétrica



Instalação de barra antipânico



Instalação de mangueira, esguicho e chave de engate

44. Teatro Flávio Império

Serviços corretivos para obtenção de AVCB (em andamento)



Serviços de elétrica



Iluminação cênica



Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e equipotencialização - Aterramento do gradil



Instalação elétrica no reservatório e SPDA
