

# PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO - 2020

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

### 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 27/11/2020

### 3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

<b>CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO</b>	<b>TIPO DE DESPESA</b>	<b>TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 005/2020 (10/07/2020)</b>	<b>TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 009/2020 (02/08/2020)</b>	<b>TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 010/2020 (04/11/2020)</b>	<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>TOTAL LIQUIDADADO</b>	<b>TOTAL PAGO</b>
5403	Obras	130.597.822	130.597.821	130.597.821	122.002.860	75.435.636	70.498.233
Construção de Habitação de Interesse Social	Serviços Técnicos	9.197.710	9.197.710	9.197.710	9.193.684	9.193.039	9.193.039
	Aquisição de Imóveis	36.362.184	52.421.666	52.421.666	25.085.857	24.770.876	24.770.600
<b>TOTAL</b>		<b>176.157.716</b>	<b>192.217.197</b>	<b>192.217.197</b>	<b>156.282.401</b>	<b>109.399.551</b>	<b>104.461.872</b>

<b>NOME</b>	<b>PAGO (R\$)</b>
-------------	-------------------

HELIÓPOLIS / GLEBA G  
– CONDOMÍNIO B E  
HELIÓPOLIS / SABESP  
2 – COND. 4 E 5


**12.217.705**

<b>ESTÁGIO</b>	<b>AÇÃO</b>
----------------	-------------

EM ANDAMENTO


GLEBA G: 54 uh's  
SABESP 2: 120 uh's



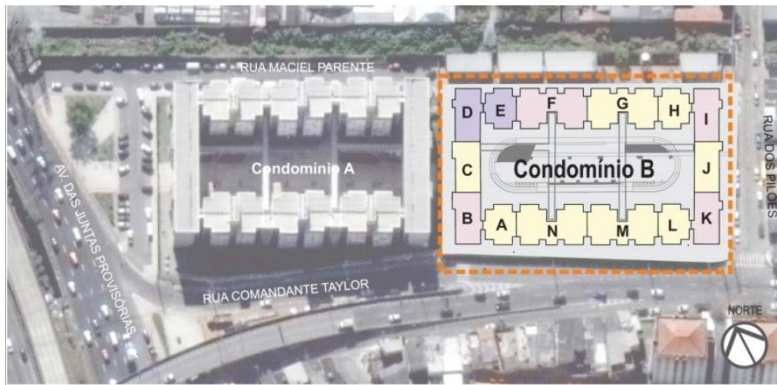

Heliópolis - Gleba G - Condomínio B: localização e implantação



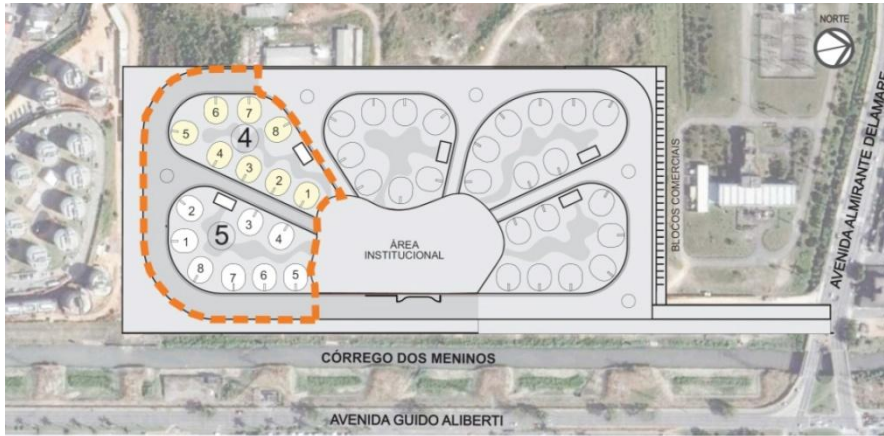

Heliópolis - Sabesp 2 - Condomínios 4 e 5: localização e implantação



Vista Condomínio 4



Vista Condomínio 5



Condomínio 4 - Estruturas



**NOME**

**PAGO (R\$)**

PARAISÓPOLIS /  
SANFONA – FASE 1

4.611.501

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

ENTREGUE

50 UNIDADES  
HABITACIONAIS



**NOME**

**PAGO (R\$)**

BAMBURRAL / LIDIANE

**9.703.531**

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

BAMBURRAL: 234 uh's  
LIDIANE: 125 uh's  
(Cond. 2)








Vista Panorâmica



Vista interna Bloco D

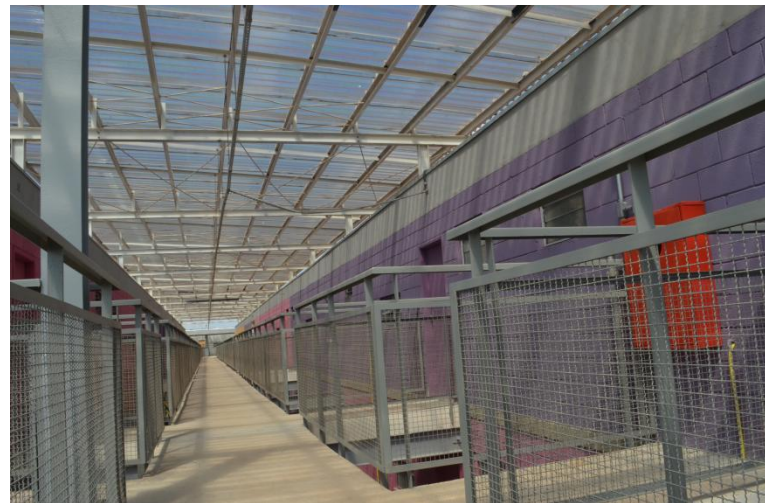

Cobertura e Passarela Bloco D



**NOME**

**PAGO (R\$)**

PONTE DOS REMÉDIOS

7.044.456

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

181 UNIDADES  
HABITACIONAIS



Vista Panorâmica – Torre F1 e Torre F2



Montagem de Pilares Torre A Quadra 4



Fundação Torre B



**NOME**

**PAGO (R\$)**

ALTO DA ALEGRIA

2.070.857

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

56 UNIDADES  
HABITACIONAIS



Execução das instalações hidráulicas da laje de transição Cond. 6A



Área de implantação e muro de contenção Cond. 6B



**NOME**

**PAGO (R\$)**

CHÁCARA DO CONDE /  
FASE1

24.145.505

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

562 UNIDADES  
HABITACIONAIS





**NOME**

**PAGO (R\$)**

VIELA DA PAZ

10.543.830

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

216 UNIDADES  
HABITACIONAIS



**NOME**

**PAGO (R\$)**

ESPANHA

160.845

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

EQUIPAMENTO  
PÚBLICO





<b>NOME</b>	<b>PAGO (R\$)</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS	7.834.812

<b>ESTÁGIO</b>	<b>AÇÃO</b>
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO DE OBRAS

<b>NOME</b>	<b>PAGO (R\$)</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS	1.358.227
<b>ESTÁGIO</b>	<b>AÇÃO</b>
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO SOCIAL

**NOME**

**PAGO (R\$)**

JOSÉ DIAS

13.394.457

**ESTÁGIO**

**AÇÃO**

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE  
MÓVEIS







<b>NOME</b>	<b>PAGO (R\$)</b>
COMANDANTE TAYLOR	3.580.000
<b>ESTÁGIO</b>	<b>AÇÃO</b>
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

