

Prestação de Contas Parcial Plano de Investimentos 2019

19/Nov/2019



Prestação de Contas Parcial - Plano de Investimentos 2019 – SIURB


Posição em 18/11:

OAE's (Pontes, viadutos, túneis, etc). Recurso Liberado em Out/19.

Secretaria	Objeto	CLASSIF.	NOVA RESOLUÇÃO 2019	2017 + 2018 + 2019 (NOVA RESOLUÇÃO)	Liquidado
SIURB	Anhangabau	1 - LIVRE	43.650.000,00	43.650.000,00	10.311.335,97
SIURB	Gerenciamento Anhangabaú	1 - LIVRE	4.350.000,00	4.350.000,00	
SIURB	Minhocão	1 - LIVRE	8.500.000,00	8.500.000,00	
SIURB	Gerenciamento Minhocão	1 - LIVRE	850.000,00	850.000,00	
SIURB	Gerenciamento (Corredores, OAE's, Pirituba-Lapa, etc)	1 - LIVRE	7.962.550,00	7.962.550,00	7.154.049,94
SIURB	Viário complementar	1 - LIVRE	1.100.000,00	1.100.000,00	
SIURB	FMDT - OAE Obras	1 - LIVRE	22.564.300,78	22.564.300,78	
SIURB	FMDT - OAE Inspeção	1 - LIVRE	12.841.365,02	12.841.365,02	
SIURB	Passarelas - Obras de Recuperação da Passarela José Granadeiro Guimarães	1 - LIVRE	489.236,10	489.236,10	
SIURB	Fábrica do Samba	1 - LIVRE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.410.473,30
SIURB	Contenção Talude - EMERGÊNCIA - Contenção do Talude da Rua Maria Antonia - LADALARDO	1 - LIVRE	9.500.000,00	9.500.000,00	
SIURB	Pirituba-Lapa	2 - MOB	92.154.315,34	114.070.003,79	34.660.972,96
SIURB	Itaquera 1	2 - MOB		6.709.188,00	508.305,75
SIURB	Itaquera 2	2 - MOB		5.650.812,00	0,00
SIURB	Terminal Itaquera	2 - MOB		12.593.194,00	0,00
SIURB	Projetos	2 - MOB	7.096.556,54	7.096.556,54	74.842,38
	<i>Ponte Grauna-Gaivotas [MOB]</i>		<i>2.044.556,54</i>	<i>2.044.556,54</i>	<i>74.842,38</i>
	<i>Corredor Capão Redondo [MOB]</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	<i>Corredor Radial Leste</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	<i>Corredor Aricanduva [MOB]</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	<i>Corredor Chucr Zaidan [MOB]</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
	<i>Av Itapeçica [MOB]</i>		<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
	<i>Av Imirim [MOB]</i>		<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
	<i>Av Amador Bueno [MOB]</i>		<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
	<i>Av Santo Amaro [MOB]</i>		<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
	<i>Av Interlaços [MOB]</i>		<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
SIURB	Trabalho Social	2 - MOB	600.000,00	600.000,00	
SMPR/SIURB	Calçadas da Rota da PEC - Calçadas do Centro I	2 - MOB	16.000.000,00	16.000.000,00	
SMPR/SIURB	Calçadas da Rota da PEC - Rota da Sé	2 - MOB	17.946.280,00	17.946.280,00	
SMT	Ciclovias	2 - MOB		35.127.403,76	
SMT	FMDT - Requal. Ciclovias	2 - MOB	60.931.832,29	60.931.832,29	
TOTAL			308.536.436,07	390.532.722,28	54.119.980,30

Plano de Investimentos 2019 – SIURB – **Obra em execução**

Fotos Ligação Pirituba-Lapa:

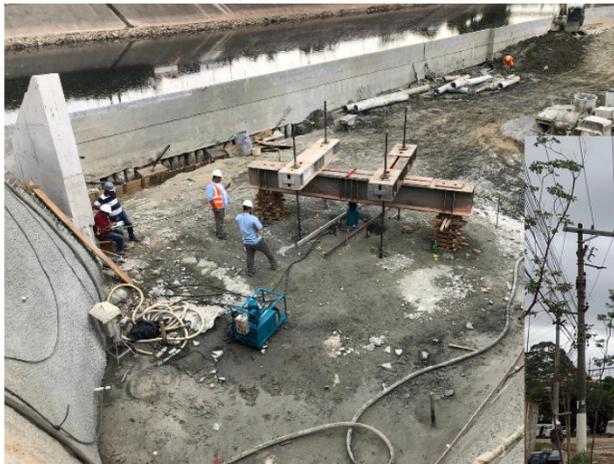

Prova de carga estática – Estaca Raiz ap3



Estaca Raiz ap2



Estaca Raiz

Plano de Investimentos 2019 – SIURB – **Obra em execução**

Fotos Requalif. Vale do Anhangabaú :



TESTE DE PISO



Plano de Investimentos 2019 – SIURB - **Obra em execução**

Fotos Requalificação do Anhangabaú :



EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO



TUBOS DE PEAD, POÇO DE VISITA , E GALERIA TÉCNICA

Plano de Investimentos 2019 – SIURB - **Obra em execução**

Fotos Ponte da Vila Maria:



Plano de Investimentos 2019 – SIURB - **Obra em execução**

Fotos Ponte Jaguaré:



Plano de Investimentos 2019 – SIURB - **Obra em execução**

Fotos Viaduto Alcântara Machado:



Plano de Investimentos 2019 – SIURB - **Obra em execução**

Fotos Viaduto Miguel Mofarrej:



Plano de Investimentos 2019 – SIURB – **Em Licitação**

Fotos Viaduto Marginal Pinheiros – T5:



Plano de Investimentos 2019 – SIURB – **Em Licitação**

Passarela José Granadeiro Guimarães – Em licitação:



Foto 1 – Vista superior da implantação indicando a localização da passarela, foto obtida pela internet.



Foto 2 – Vista antiga da passarela, Dr. José Granadeiro Guimarães, antes de sua remoção, foto obtida pela internet.



Foto 5 – Vista da rampa de acesso a passarela lado Planalto paulista



Foto 6 – Vista da rampa de acesso a passarela lado Moema

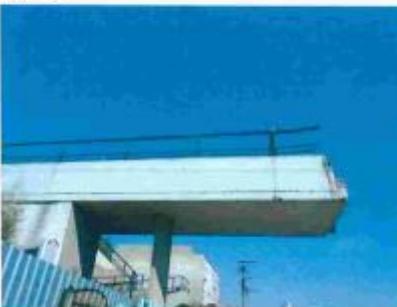


Foto 3 – Vista atual da passarela, Dr. José Granadeiro Guimarães, lado, Planalto paulista



Foto 4 – Vista atual da passarela, Dr. José Granadeiro Guimarães, lado Moema,



Foto 7 – Vista da face inferior da laje e lateral esquerda no trecho 02 da passarela, lado Planalto paulista.



Foto 8 – Vista do piso do trecho existente da passarela lado Moema



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

