

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO



OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHO	LIQUIDADO/PAGO	REALIZADO
PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (Área Calma São Miguel)	R\$ 6.972.186,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (PACOTES 1, 2, ROTAS ACESSÍVEIS E TRAVESSIAS SEGURAS)	R\$ 12.763.616,87 (Liberado 11/07/22)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	R\$ 137.040.082,35 (R\$87.478.953,18 – Liberado 11/07/22)	R\$ 17.121.766,08	R\$ 15.407.885,47	90 %
IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS	R\$ 29.008.588,61 (MOB 2022)	R\$ 29.008.588,61	R\$ 1.815.843,68	6,3%
IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	R\$ 2.053.627,39 (MOB 2022)	R\$ 2.053.627,39	R\$ 0,00	0%
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS	R\$ 12.308.177,03 (MOB 2021, MOB 2020)	R\$ 9.067.722,46	R\$ 0,00	0%
REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES E VIÁRIOS DE ÔNIBUS	R\$ 19.816.725,05 (MOB 2020)	R\$ 19.816.725,05	R\$ 0,00	0%
TOTAL	R\$219.963.303,72	R\$ 77.068.429,59	R\$ 17.223.729,15	8,3%

OBJETO	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO/PAGO	REALIZADO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	R\$ 137.040.082,35	R\$ 17.121.766,08	R\$ 15.407.885,47	90 %



SÃO PAULO

MOBILIDADE E TRÂNSITO

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	LIQUIDADO/PAGO
CAP PACHECO E CHAVES	1643	R\$212,438.84	0,00
BOSQUE DA SAUDE - BRAS GONCALVES - FRANCISCO DIAS	1324	R\$171,192.34	0,00
DOM MACARIO - NICOLAU ALBERTO - LUIS AUGUSTO	1644	R\$212,568.14	0,00
FRANCA -ANTONIO - OSVALDO - INHAIBA	1553	R\$200,801.90	0,00
CISPLATINA - PADRE MARCHETTI	1339	R\$173,131.83	0,00
NOSSA SRA DA SAÚDE	1559	R\$201,577.69	0,00
ABRAÃO DE MORAIS - RICARDO JAFET	3159	R\$408,456.66	0,00
LUCAS OBES - MUNICIPALIDADES - GRANDE SAO PAULO - FRANCISCO MESQUITA	1296	R\$167,571.96	0,00
AGOSTINHO GOMES	1221	R\$157,874.51	0,00
MANIFESTO	1889	R\$244,246.48	0,00
SANTA CRUZ - GENTIL DE MOURA - SALVADOR SIMOES - LEOPOLDINA	910	R\$117,662.41	0,00
BANDEIRANTES - AFFONSO D'ESCRAGNOLLE - MARIA MALUF - TANCREDO NEVES	9853	R\$1,273,986.53	0,00
JOSÉ DOS REIS	548	R\$70,856.05	0,00
AMPARO	686	R\$88,699.36	0,00



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR	LIQUIDADO/PAGO
SALIM FARAH MALUF	2986	R\$386,087.87	0,00
APUCARANA - TIJUCO - SERRAT - CANUTO ABREU	2461	R\$318,205.71	0,00
PLATINA	1153	R\$149,082.15	0,00
PONTE TATUAPE - MICHELON - FRANCISCO LEOPOLDO - GALILEU GAIA	1478	R\$191,104.44	0,00
AIRTON PRETINI	645	R\$83,398.08	0,00
ASTARTE	734	R\$94,905.73	0,00
MENEZHINI - RIO DAS PEDRAS - ADHEMAR P DE BARRO	965	R\$124,773.88	0,00
MIGUEL ABRAHAO - ARICANDUVA	888	R\$114,817.83	0,00
ESTADO 3	1045	R\$135,117.82	0,00
RADIAL LESTE 2	2602	R\$336,436.92	0,00
RIBEIRO DE LIMA	431	R\$55,728.02	0,00
JOAO BOEMER - JOSE MONTEIRO - CLOVIS ARTHUR	1889	R\$244,246.48	0,00
CARLOS DE CAMPOS	706	R\$91,285.34	0,00
CONCEICAO - GERALDO BERTI - MILTON TAVARES	863	R\$111,585.34	0,00
GUILHERME	220	R\$28,445.86	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	LIQUIDADO/PAGO
MARIA CÂNDIDA	2348	R\$303,594.88	0,00
CANHONEIRA MEARIM - ALBERTO BYINGTON - MERE AMEDEA	3311	R\$428,110.16	0,00
OSAKA - SGTO MIGUEL - TENENTE AMARO	1856	R\$239,979.60	0,00
ROLAND GARROS	1303	R\$168,477.06	0,00
JARDIM JAPÃO	1416	R\$183,087.88	0,00
YORIMOTO - GUEIXAS	1053	R\$136,152.22	0,00
JOÃO FAGUNDES - PASSARELA SOBRE A DUTRA - JOSÉ MARIA FERNANDES	1916	R\$247,737.56	0,00
MARIA JOSE BARONE FERNANDES	1480	R\$191,363.04	0,00
FÁBIO PAVANI	530	R\$68,528.66	0,00
WALDEMAR ROBERTO	285	R\$36,850.32	0,00
ADHERBAL STRESSER - ASDRUBAL DA CUNHA - WALTER CARLSON	268	R\$34,652.23	0,00
CAMARGO 2	532	R\$68,787.26	0,00
SAPETUBA	461	R\$59,606.82	0,00
CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - VITAL BRASIL	5597	R\$723,688.48	0,00
BENJAMIN MANSUR - MARTINHO CLARO - DOMINGOS BARBIERI	1297	R\$167,701.26	0,00



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	LIQUIDADADO/PAGO
SANTA MARINA	770	R\$99,560.50	0,00
EDGAR FACÓ - PONTE DO PIQUERI - ERMANO MARCHETTI	2221	R\$287,173.86	0,00
GAGO COUTINHO - JOHN HARRISON DRONSFIELD - MALVIN JONES	1993	R\$257,693.61	0,00
POTSDAM - BRENTANO	1137	R\$147,013.36	0,00
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	94	R\$12,154.14	0,00
GUAIPA	1654	R\$213,861.13	0,00
MAJOR PALADINO	373	R\$48,228.66	0,00
QUEIROZ FILHO	1155	R\$149,340.75	0,00
JÁCOMO ZANELLA - ELIAS NAGIB BREIM - VIADUTO DA LAPA	697	R\$90,121.65	0,00
GASTÃO VIDIGAL - LATERAL DO VIADUTO	290	R\$37,496.81	0,00
PROFA VIRGILIA - ALCINDO BUENO	1500	R\$193,949.03	0,00
SANTA INES - VOLUNTARIOS DA PATRIA	1886	R\$243,858.58	0,00
MARIA AMALIA - MAMUD RAHD	4598	R\$594,518.43	0,00
MANUEL GAYA	1852	R\$239,462.40	0,00
DUMONT VILLARES - MARIA LAET	2792	R\$361,003.79	0,00
JOSE PARADA - ADVINCOLA - RUYTEMBERG - JOAO CREFF	922	R\$119,214.00	0,00
DUARTE DE AZEVEDO	1020	R\$131,885.34	0,00
ANTONIO CESAR NETO	780	R\$100,853.50	0,00
BENJAMIN PEREIRA	1660	R\$214,636.93	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	LIQUIDADO/PAGO
Viaduto Bresser	1090	R\$707,488.92	R\$ 636.261,80
José Maria Whitaker	1681	R\$510,320.11	0,00
República do Líbano	650	R\$397,220.52	R\$ 354.221,59
Rui Barbosa - Treze de Maio - Santo Antônio	2270	R\$820,578.44	0,00
Dom Pedro I	1550	R\$1,262,912.33	R\$ 991.145,56
Educador Paulo Freire	220	R\$160,183.67	0,00
Viaduto Itinguçu - Júlio Sayago	1100	R\$206,179.72	0,00
Nagib Farah Maluf	2250	R\$1,007,137.46	0,00
João Batista Conti	1600	R\$570,324.83	0,00
Miguel Yunes	1450	R\$91,427.66	R\$ 774.415,77
Jacu Pêssego 2 (Laranja da China)	910	R\$373,415.20	0,00
Sena Madureira	2870	R\$1,156,349.89	R\$ 1.309.198,83
Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi - Dona Avelina	1209	R\$316,972.47	R\$ 972.937,56
Raimundo Pereira de Magalhães - Miguel de Castro - Cabo Adão Pereira - Manuel Barbosa	2120	R\$877,993.96	0,00
Ponte Cidade Universitária	485	R\$440,337.38	R\$ 1.049.376,27



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	LIQUIDADADO/PAGO
Jaguaré	610	R\$485,682.47	R\$ 570.142,26
Gastão Vidigal - Ponte dos Remédios	1400	R\$479,339.82	R\$ 1.139.700,56
Ponte Jaguaré	1500	R\$620,200.94	R\$ 1.056.988,28
Praça Campo de Bagatelle	820	R\$422,063.24	R\$ 652.307,32
Tiradentes - Santos Dumont	715	R\$1,149,778.02	R\$ 728.468,58
Abraão Ribeiro	600	R\$414,885.91	0,00
Ponte da Freguesia do Ó - Comendador Martineli	1000	R\$833,573.74	0,00
Alvarenga	2425	R\$1,519,277.38	0,00
Mutinga	1531	R\$766,573.29	0,00
Ordem e Progresso - Ponte do Limão	1000	R\$621,201.32	0,00
Armando Arruda Pereira	1474	R\$639,392.92	0,00
Carlos Caldeira	3532	R\$1,612,645.35	0,00
Radial Leste	2971	R\$2,322,621.10	0,00
Indianópolis	3517	R\$1,913,888.91	R\$ 2.622.212,17
Eng Alberto de Zagottis - Octales Marcondes Ferreira	1777	R\$989,051.34	R\$ 1.205.037,42
Nações Unidas 1	1201	R\$627,494.04	R\$ 812.488,53
Nações Unidas 2	843	R\$315,204.27	R\$ 532.982,97

METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
650	R\$ 354.221,59	Em execução	República do Líbano	Av. República do Líbano	VILA MARIANA

Situação inicial



Situação atual

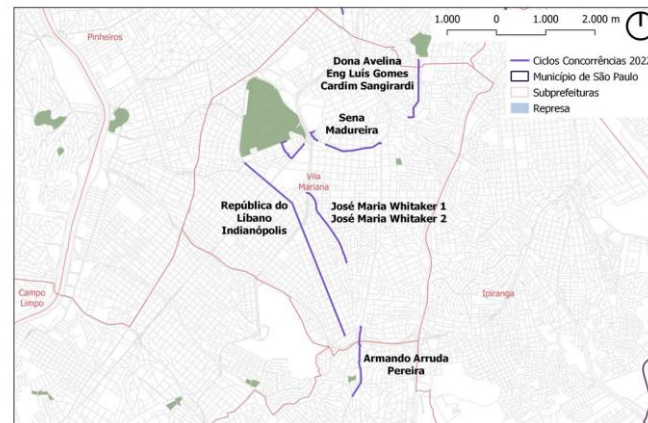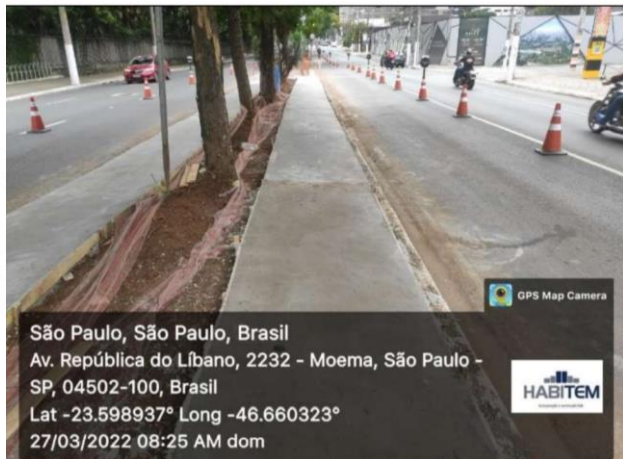


METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
2870	R\$ 1.309.198,83	Em execução	Sena Madureira	Av. Sena Madureira	VILA MARIANA

Situação inicial




Situação atual

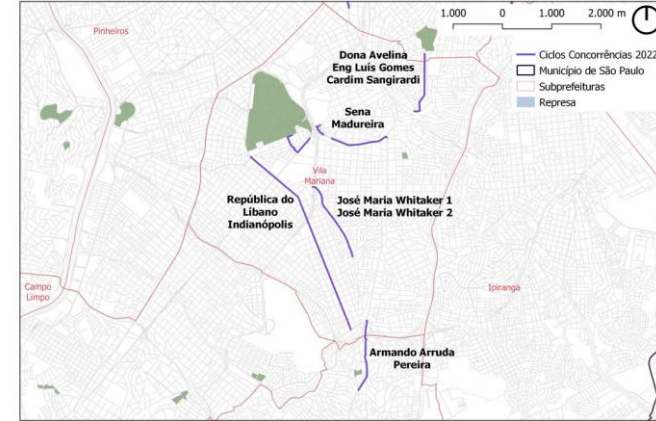

METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
3517	R\$ 2.622.212,17	Em execução	Indianópolis	Av. Indianópolis	VILA MARIANA

Situação inicial

Situação atual

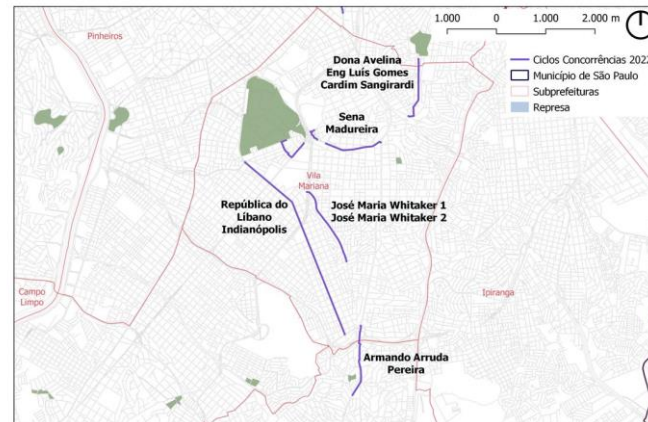

CORREDOR CELSO GARCIA



CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Contratada a consolidação do projeto básico e elaboração do projeto executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00
- Publicação D.O. - 12/04/2022
- Ordem de Serviço - Maio/22
- Prazo 12 meses

Valor total aprovado:
R\$ 4.950.000,00

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

Contratado projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras:

- Contrato nº 2022/0195-01-00
- Publicação D.O. - 25/06/2022
- Ordem de Serviço - Junho/22
- Prazo 15 meses

Em procedimento licitatório para supervisão de obras e serviços ambientais:

- Empresa homologada, em assinatura de contrato.

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Contratada consolidação do projeto básico, elaboração do projeto executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00
- Publicação D.O. - 22/07/2022
- Ordem de Serviço - Agosto/22
- Prazo 12 meses

Valor total aprovado:
R\$ 16.600.000,00



CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS)



CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Contratada elaboração dos Elementos

Técnicos Expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00
- Publicação D.O. - 04/05/2022
- Ordem de Serviço - Maio/22
- Prazo 240 dias

Em procedimento licitatório para
Consolidação de Projeto Básico e

Desenvolvimento de Projeto Executivo:

- Empresa homologada, em assinatura
de contrato.

Em fase de preparação do edital de

Projeto Executivo e Estudos Ambientais.

Valor total aprovado

R\$ 3.505.536,65

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ

CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

Situação atual:

Em procedimento licitatório para
Consolidação de Projeto Básico e
Desenvolvimento de Projeto Executivo:
- Abertura do Envelope - 21/11/2022

Em fase de preparação do edital de
Projeto Executivo e Estudos Ambientais.


Valor total aprovado
R\$ 3.953.051,96



Planejamento	● CPTM Estação	— Faixas Exclusivas de Ônibus	□ Limite Municipal
EdM	—+— Metrô Linha	— Corredores EMTU existentes	■ Parques Municipais
— Corredor Sabará	—+— CPTM Linha	Referências	
— Corredor Miguel Yunes	Corredores e terminais existentes	— Represas	
Existente	● Terminais de Ônibus	— Hidrografia Massa D'água	
Trilhos	— Corredores de Ônibus	— Arruamento de referência	
● Metrô Estação			



TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

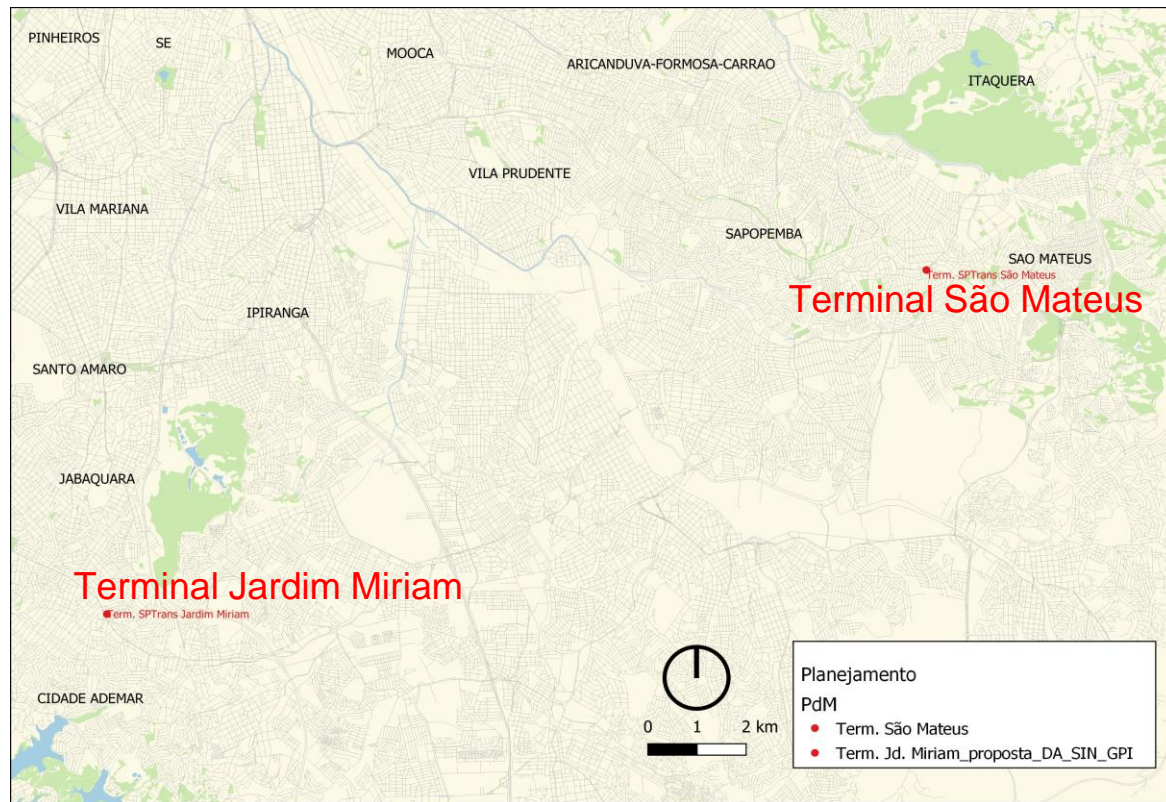

Terminal Jardim Miriam:

Situação atual:

Em procedimento licitatório para contratação do Projeto Funcional, Projeto Básico e elaboração de Estudos Ambientais e Territoriais

- Abertura do Envelope - 09/11/2022

Valor total aprovado

(T. Jardim Miriam)

R\$ 1.936.450,33

Terminal São Mateus:

Situação atual:

Contratação da consolidação do projeto básico, desenvolvimento do projeto executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Contrato nº 2022/0329-01-00
- Publicação D.O. - 06/10/2022
- Ordem de Serviço - Outubro/22
- Prazo 12 meses

Valor total aprovado

(T. São Mateus)

R\$ 10.371.726,70

AQUÁTICO



AQUÁTICO

DUP Terminal/Atracadouro COCAIA -
Publicação D.O. - 10/02/2022. Decreto
61.043/2022.

DUP Viários de Acesso COCAIA
- Publicação D.O. - 09/08/2022.
Decreto nº 61.682/2022.

DUP Terminal/Atracadouro PEDREIRA
- Publicação D.O. - 06/07/2022. Decreto
61.518/2022.

Assinado Termo de Cooperação com a
USP Nº 2022/0367-01-00 - 18/07/2022

Contratada elaboração dos Elementos
Técnicos Expropriatórios -
Terminal/Atracadouro Cocaia:
- Contrato nº 2022/0438-01-00
- Publicação D.O. - 12/08/2022
- Ordem de Serviço - Julho/22
- Prazo 07 meses

Contratada elaboração dos Elementos
Técnicos Expropriatórios -
Terminal/Atracadouro Pedreira:
- Contrato nº 2022/0515-01-00
- Publicação D.O. - 28/09/2022
- Prazo 07 meses

Valor total aprovado
R\$ 2.053.627,39

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Contrato: 2022/0350-01-00

Situação atual:

Início das obras nas paradas da Av. Corifeu de Azevedo Marques, em Novembro/2022.

Valor total aprovado
R\$ 17.331.105,54

Projeto para requalificação do pavimento do Expresso Tiradentes



Referências: Arranjo de referência Subprefeitura
 Hidrografia Massa C/Segu Limite Municipal



Projeto para requalificação do pavimento do Expresso Tiradentes (Trecho entre Estação Metro Pedro II e complexo viário Evaristo Comolatti)

Contrato: 2022/0351-01-00

Situação atual:
Início de projeto em Novembro/2022.

Valor total aprovado
R\$ 324.934,10



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
