

# Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Processo SEI 6020.2022/0035170-7



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

<b>OBJETO DO GASTO</b>	<b>APROVADO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Área Calma São Miguel)	R\$ 6.972.186,42	R\$ 6.284.178,54	R\$ 2.731.531,99	39,0%
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras)	R\$ 12.763.616,87	R\$ 12.267.137,46	R\$ 65.758,72	0,52%
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras)	R\$ 25.883.412,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Construção de Ciclovias	R\$ 21.826.984,26	R\$ 4.157.259,80	R\$ 441.300,60	10,6%
Implantação de Corredores de Ônibus	R\$ 23.185.849,00	R\$ 23.185.849,00	R\$ 8.709.247,18	37,5%
Implantação de Transporte Público Hidroviário	R\$ 3.201.041,67	R\$ 3.201.041,67	R\$ 1.408.685,43	44,0%
Construção de Terminais de Ônibus	R\$ 12.567.075,06	R\$ 12.567.075,06	R\$ 2.141.473,37	17,0%
Requalificação de do Pavimento de Paradas de Ônibus	R\$ 28.508.234,00	R\$ 28.508.234,00	R\$ 8.128.396,83	28,5%
<b>TOTAL</b> (+ 16.000,00 como dotações a manter)	<b>R\$ 134.924.400,00</b>	<b>R\$ 90.170.775,80</b>	<b>R\$ 23.626.394,12</b>	<b>26,2%</b>



## Obras de redesenho urbano para segurança viária (Área Calma São Miguel)

<b>APROVADO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO/PAGO</b>	<b>REALIZADO</b>
R\$ 6.972.186,42	R\$ 6.284.178,54	R\$ 2.731.531,99	39,0%

# OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

Situação inicial



Situação atual



# Construção de Ciclovias

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO/PAGO	REALIZADO
R\$ 21.826.984,26	R\$ 4.157.259,80	R\$ 441.300,60	10,6%

# CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA (ED. PAULO FREIRE)

## Situação inicial



## Situação atual



# IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO
R\$ 23.185.849,00	R\$ 23.185.849,00	R\$ 8.709.247,18	37,5%

# CORREDOR CELSO GARCIA



**CORREDOR CELSO GARCIA:**

**Situação atual:**

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

**Valor total aprovado:**

R\$ 3.367.892,49

**Valor liquidado/pago:**

R\$ 971.080,1



# CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



## CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

### Situação atual:

Projeto de paisagem e desvio tráfego e execução das obras:

- Contrato nº 2022/0195-01-00 - 25/06/2022
- Processo: 5010.2022/0002251-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Supervisão de obras e serviços ambientais:

- Contrato nº 2022/0421-01-00 - 09/12/2022
- Processo: 5010.2022/0005906-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

## CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

### Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

**Valor total aprovado:**

R\$ 13.323.311,62

**Valor liquidado/pago:**

R\$ 6.087.549,6



# CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS)



Av. Líder X Praça Francisco Manuel Lopes, Julho, 2023.

# CORREDOR MIGUEL YUNES



## CORREDOR MIGUEL YUNES:

### Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

**Valor total aprovado:**

R\$ 3.020.928,96

**Valor liquidado/pago:**

R\$ 1.137.536,67

# CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ



## CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

### Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023
- Processo: 5010.2022/0021396-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

**Valor total aprovado:**

R\$ 3.617.732,14

**Valor liquidado/pago:**

R\$ 513.080,81

# IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

**APROVADO**

**EMPENHADO**

**LIQUIDADO**

**REALIZADO**

R\$ 3.201.041,67

R\$ 3.201.041,67

R\$ 1.408.685,43

44,0%

# IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



## TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído 02/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído 03/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023



**Valor total aprovado:**

**R\$ 3.201.041,67**

**Valor liquidado/pago:**

**R\$ 1.408.685,43**

# IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

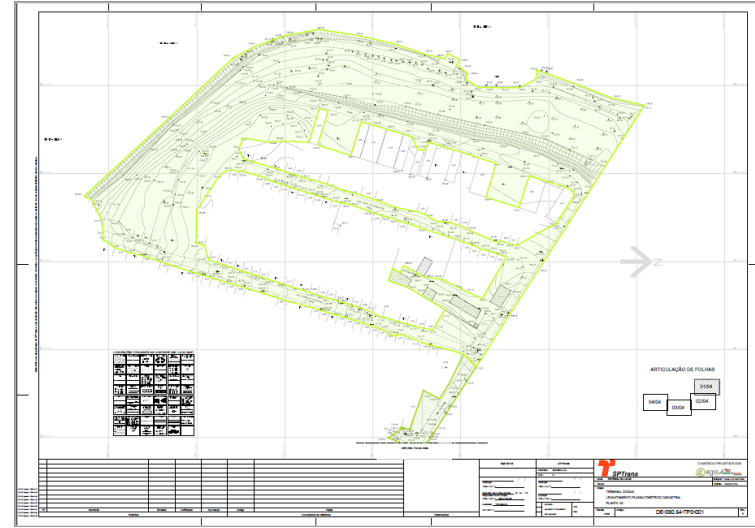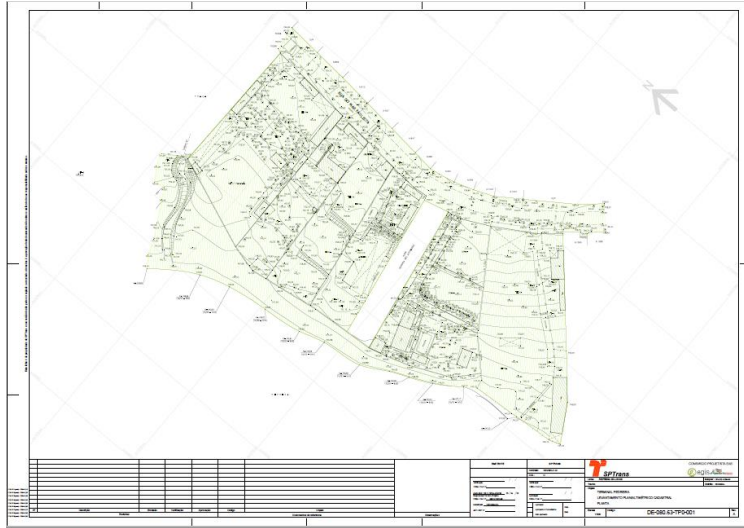

Levantamento planialtimétrico e cadastral dos Terminais Cocaia, Pedreira e viários de acesso - 1º semestre 2023.





# CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

**APROVADO**

**EMPENHADO**

**LIQUIDADO**

**REALIZADO**



R\$ 12.567.075,06

R\$ 12.567.075,06

R\$ 2.141.473,37

17,0%

# TERMINAL SÃO MATEUS

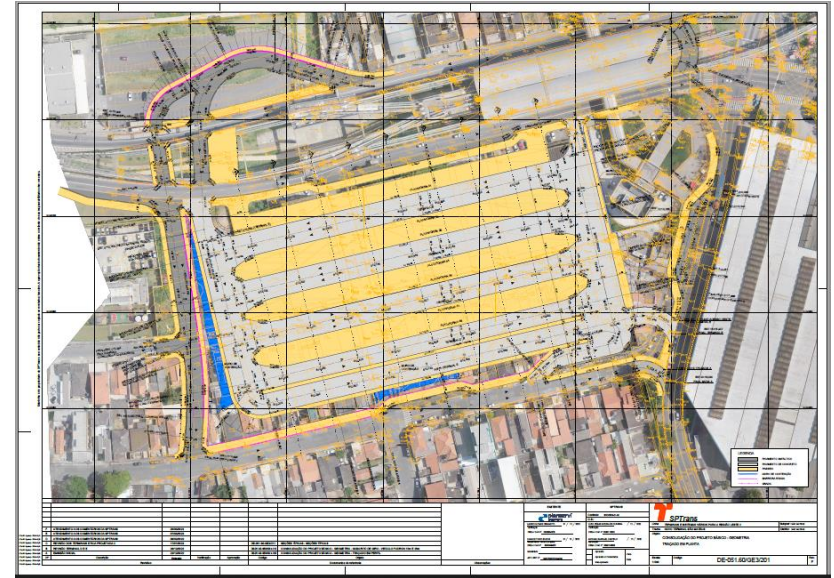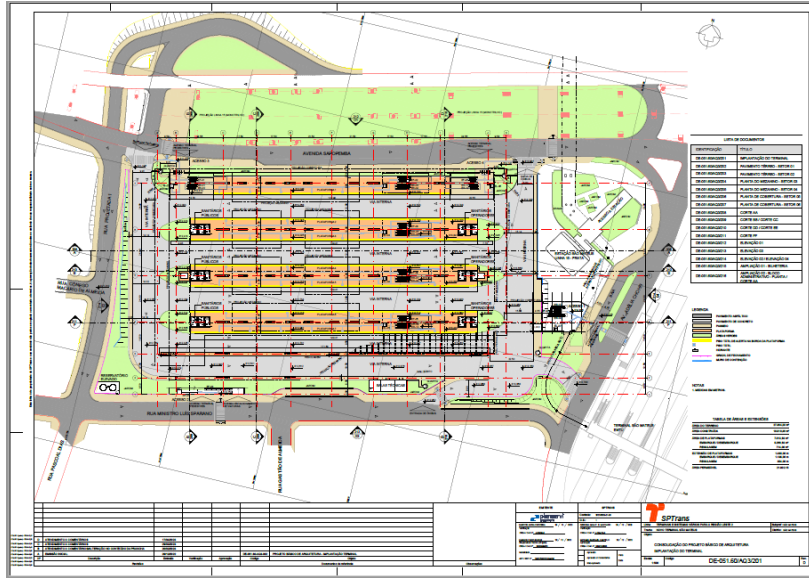

Consolidação do Projeto Básico - Terminal São Mateus - 1º semestre 2023


# REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO/PAGO	REALIZADO
R\$ 28.508.234,00	R\$ 28.508.234,00	R\$ 8.128.396,83	28,5%

# REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Corifeu de Azevedo Marques, 674, Av. Vital Brasil, 684, Abril/Maio de 2023.

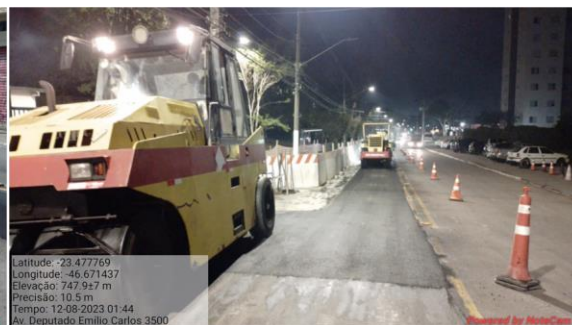

Av. Deputado Emilio Carlos, 3747 e 3500, Julho de 2023.

## REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

### Situação atual:

Conclusão das obras nas paradas da Av. Corifeu de Azevedo Marques.

Início das obras nas paradas da Av. Vital Brasil no 1º semestre de 2023.

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

**Valor total aprovado:**

R\$ 28.508.234,00

**Valor liquidado/pago:**

R\$ 8.128.396,83



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**
