

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - SVMA NOVEMBRO/2022




PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2022

VALORES EM [R\$]

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Implantação do Parque Linear Aristocrata	1.500.000,00	1.457.153,67	874.184,99	874.184,99
TOTAL	1.500.000,00	1.457.153,67	874.184,99	874.184,99

Parque Linear Aristocrata | Capela do Socorro - Grajaú

NOME	VALOR FUNDURB PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO	PAGAMENTO	EXECUÇÃO	
				EMPENHADO	PAGO
Obras de Implantação do Parque Linear Aristocrata	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.457.153,67	R\$ 874.184,99	97%	60%
SITUAÇÃO	AÇÃO			SEI	
Em andamento	Obras de implantação do Parque Linear Aristocrata e sua abertura ao público.			6027.2020/0003615-6	

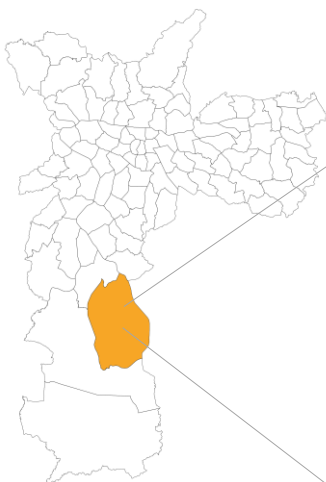

Contrato 023/SVMA/2021
 Ordem de Início: 26/07/2021
 Valor do Contrato: R\$ 4.144.461,84
 Valor do Contrato: R\$ 5.121.699,07
 Execução: R\$ 3.598.289,07
 Execução Total: 70%

Parque Linear Aristocrata | Capela do Socorro - Grajaú



Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – setembro/2021

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – dezembro/2021

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – agosto/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – outubro/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – outubro/2022
