

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Processo SEI 6020.2021/0026163-3




OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (Área Calma São Miguel)	R\$ 6.972.186,42	R\$ 2.529.052,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras)	R\$ 12.763.616,87 (Liberado 11/07/22)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Construção de Ciclovias	R\$ 137.040.382,35 (R\$87.478.953,18 – Liberado 11/07/22)	R\$ 107.308.500,29	R\$ 20.684.064,37	R\$ 20.684.064,37	15,09%
Implantação de Corredores de Ônibus	R\$ 29.008.588,61 (MOB 2022)	R\$ 29.008.588,61	R\$ 7.842.482,25	R\$ 7.842.482,25	27,04%
Implantação de Transporte Público Hidroviário	R\$ 2.053.627,39 (MOB 2022)	R\$ 2.053.627,39	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	0,46%
Construção de Terminais de Ônibus	R\$ 12.308.177,03 (MOB 2021, MOB 2020)	R\$ 5.307.195,90	R\$ 233.901,36	R\$ 233.901,36	1,90%
Requalificação de Corredores e Viários de Ônibus	R\$ 19.816.725,05 (MOB 2020)	R\$ 19.816.725,05	R\$ 1.629.922,17	R\$ 1.629.922,17	8,22%
TOTAL	R\$ 219.963.303,72	R\$ 166.023.689,66	R\$ 30.399.870,15	R\$ 30.399.870,15	13,82%



PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 6.972.186,42	R\$ 2.529.052,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

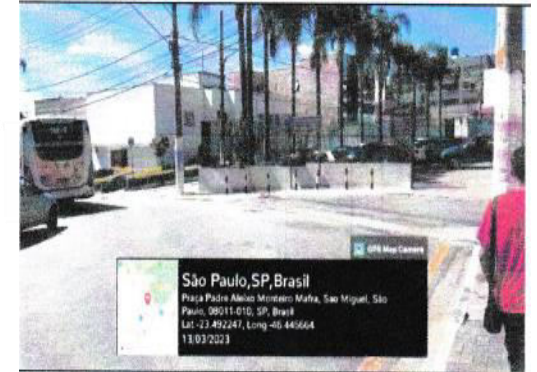

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 137.040.382,35 (R\$87.478.953,18 – Liberado 11/07/22)	R\$ 107.308.500,29	R\$ 20.684.064,37	R\$ 20.684.064,37	15,09%



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
CAP PACHECO E CHAVES	1643	R\$212,438.84
BOSQUE DA SAUDE - BRAS GONCALVES - FRANCISCO DIAS	1324	R\$171,192.34
DOM MACARIO - NICOLAU ALBERTO - LUIS AUGUSTO	1644	R\$212,568.14
FRANCA - ANTONIO - OSVALDO - INHAIBA	1553	R\$200,801.90
CISPLATINA - PADRE MARCHETTI	1339	R\$173,131.83
NOSSA SRA DA SAÚDE	1559	R\$201,577.69
ABRAÃO DE MORAIS - RICARDO JAFET	3159	R\$408,456.66
LUCAS OBES - MUNICIPALIDADES - GRANDE SAO PAULO - FRANCISCO MESQUITA	1296	R\$167,571.96
AGOSTINHO GOMES	1221	R\$157,874.51
MANIFESTO	1889	R\$244,246.48
SANTA CRUZ - GENTIL DE MOURA - SALVADOR SIMOES - LEOPOLDINA	910	R\$117,662.41
BANDEIRANTES - AFFONSO D'ESCRAGNOLLE - MARIA MALUF - TANCREDO NEVES	9853	R\$1,273,986.53
JOSÉ DOS REIS	548	R\$70,856.05
AMPARO	686	R\$88,699.36

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
SALIM FARAH MALUF	2986	R\$386,087.87
APUCARANA - TIJUCO - SERRAT - CANUTO ABREU	2461	R\$318,205.71
PLATINA	1153	R\$149,082.15
PONTE TATUAPE - MICHELON - FRANCISCO LEOPOLDO - GALILEU GAIA	1478	R\$191,104.44
AIRTON PRETINI	645	R\$83,398.08
ASTARTE	734	R\$94,905.73
MENEGHINI - RIO DAS PEDRAS - ADHEMAR P DE BARRO	965	R\$124,773.88
MIGUEL ABRAHAO - ARICANDUVA	888	R\$114,817.83
ESTADO 3	1045	R\$135,117.82
RADIAL LESTE 2	2602	R\$336,436.92
RIBEIRO DE LIMA	431	R\$55,728.02
JOAO BOEMER - JOSE MONTEIRO - CLOVIS ARTHUR	1889	R\$244,246.48
CARLOS DE CAMPOS	706	R\$91,285.34
CONCEICAO - GERALDO BERTI - MILTON TAVARES	863	R\$111,585.34
GUILHERME	220	R\$28,445.86



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
MARIA CÂNDIDA	2348	R\$303,594.88
CANHONEIRA MEARIM - ALBERTO BYINGTON - MERE AMEDEA	3311	R\$428,110.16
OSAKA - SGTO MIGUEL - TENENTE AMARO	1856	R\$239,979.60
ROLAND GARROS	1303	R\$168,477.06
JARDIM JAPÃO	1416	R\$183,087.88
YORIMOTO - GUEIXAS	1053	R\$136,152.22
JOÃO FAGUNDES - PASSARELA SOBRE A DUTRA - JOSÉ MARIA FERNANDES	1916	R\$247,737.56
MARIA JOSE BARONE FERNANDES	1480	R\$191,363.04
FÁBIO PAVANI	530	R\$68,528.66
WALDEMAR ROBERTO	285	R\$36,850.32
ADHERBAL STRESSER - ASDRUBAL DA CUNHA - WALTER CARLSON	268	R\$34,652.23
CAMARGO 2	532	R\$68,787.26
SAPETUBA	461	R\$59,606.82
CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - VITAL BRASIL	5597	R\$723,688.48
BENJAMIN MANSUR - MARTINHO CLARO - DOMINGOS BARBIERI	1297	R\$167,701.26



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
SANTA MARINA	770	R\$99,560.50
EDGAR FACÓ - PONTE DO PIQUERI - ERMANO MARCHETTI	2221	R\$287,173.86
GAGO COUTINHO - JOHN HARRISON DRONSFIELD - MALVIN JONES	1993	R\$257,693.61
POTSDAM - BRENTANO	1137	R\$147,013.36
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	94	R\$12,154.14
GUAIPA	1654	R\$213,861.13
MAJOR PALADINO	373	R\$48,228.66
QUEIROZ FILHO	1155	R\$149,340.75
JÁCOMO ZANELLA - ELIAS NAGIB BREIM - VIADUTO DA LAPA	697	R\$90,121.65
GASTÃO VIDIGAL - LATERAL DO VIADUTO	290	R\$37,496.81
PROFA VIRGILIA - ALCINDO BUENO	1500	R\$193,949.03
SANTA INES - VOLUNTARIOS DA PATRIA	1886	R\$243,858.58
MARIA AMALIA - MAMUD RAHD	4598	R\$594,518.43
MANUEL GAYA	1852	R\$239,462.40
DUMONT VILLARES - MARIA LAET	2792	R\$361,003.79
JOSE PARADA - ADVINCOLA - RUYTEMBERG - JOAO CREFF	922	R\$119,214.00
DUARTE DE AZEVEDO	1020	R\$131,885.34
ANTONIO CESAR NETO	780	R\$100,853.50
BENJAMIN PEREIRA	1660	R\$214,636.93

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
VIADUTO BRESSER	1090	R\$707,488.92
JOSÉ MARIA WHITAKER	1681	R\$510,320.11
REPÚBLICA DO LÍBANO	650	R\$397,220.52
RUI BARBOSA - TREZE DE MAIO - SANTO ANTÔNIO	2270	R\$820,578.44
DOM PEDRO I	1550	R\$1,262,912.33
EDUCADOR PAULO FREIRE	220	R\$160,183.67
VIADUTO ITINGUÇU - JÚLIO SAYAGO	1100	R\$206,179.72
NAGIB FARAH MALUF	2250	R\$1,007,137.46
JOÃO BATISTA CONTI	1600	R\$570,324.83
MIGUEL YUNES	1450	R\$91,427.66
JACU PÊSSEGO 2 (LARANJA DA CHINA)	910	R\$373,415.20
SENA MADUREIRA	2870	R\$1,156,349.89
ENG LUÍS GOMES CARDIM SANGIRARDI - DONA AVELINA	1209	R\$316,972.47
RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES - MIGUEL DE CASTRO - CABO ADÃO PEREIRA - MANUEL BARBOSA	2120	R\$877,993.96
PONTE CIDADE UNIVERSITÁRIA	485	R\$440,337.38

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	APROVADO
JAGUARÉ	610	R\$485,682.47
GASTÃO VIDIGAL - PONTE DOS REMÉDIOS	1400	R\$479,339.82
PONTE JAGUARÉ	1500	R\$620,200.94
PRAÇA CAMPO DE BAGATELLE	820	R\$422,063.24
TIRADENTES - SANTOS DUMONT	715	R\$1,149,778.02
ABRAÃO RIBEIRO	600	R\$414,885.91
PONTE DA FREGUESIA DO Ó - COMENDADOR MARTINELI	1000	R\$833,573.74
ALVARENGA	2425	R\$1,519,277.38
MUTINGA	1531	R\$766,573.29
ORDEM E PROGRESSO - PONTE DO LIMÃO	1000	R\$621,201.32
ARMANDO ARRUDA PEREIRA	1474	R\$639,392.92
CARLOS CALDEIRA	3532	R\$1,612,645.35
RADIAL LESTE	2971	R\$2,322,621.10
INDIANÓPOLIS	3517	R\$1,913,888.91
ENG ALBERTO DE ZAGOTTIS - OCTALES MARCONDES FERREIRA	1777	R\$989,051.34
NAÇÕES UNIDAS 1	1201	R\$627,494.04
NAÇÕES UNIDAS 2	843	R\$315,204.27

METROS**PAGO****SITUAÇÃO****ESTRUTURA****ENDEREÇO****SUBPREFEITURA**

650

R\$ 354.221,59

EM EXECUÇÃO

REPÚBLICA DO LÍBANO


AV. REPÚBLICA DO
LÍBANO

VILA MARIANA

Situação inicial



Situação atual

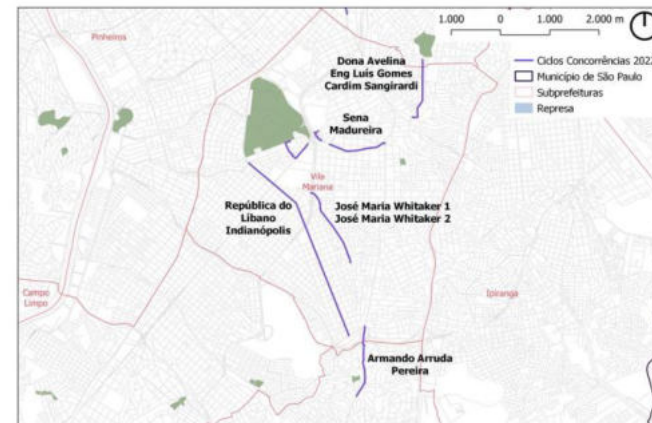

METROS**PAGO****SITUAÇÃO****ESTRUTURA****ENDEREÇO****SUBPREFEITURA**

2870


R\$ 1.335.26,26

EM EXECUÇÃO

SENA MADUREIRA

AV. SENA MADUREIRA

VILA MARIANA

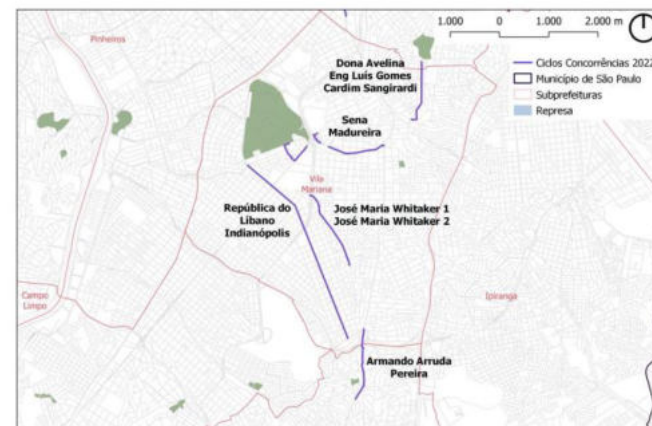Situação inicial**Situação atual**

METROS

PAGO

SITUAÇÃO

ESTRUTURA

ENDEREÇO

SUBPREFEITURA

3517

R\$ 2.660.885,14

EM EXECUÇÃO

INDIANÓPOLIS


AV. INDIANÓPOLIS

VILA MARIANA

Situação inicial



Situação atual

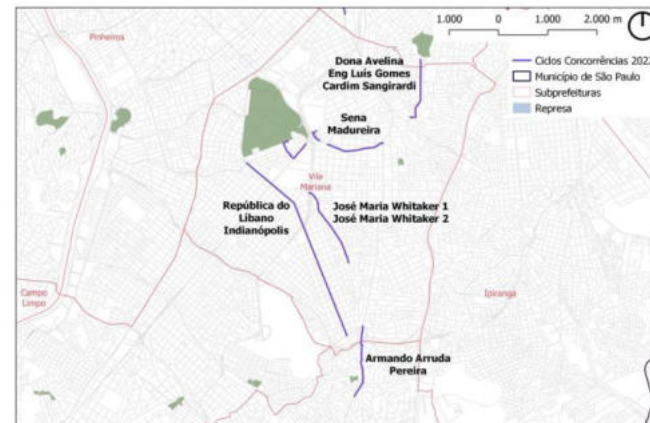


IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 29.008.588,61 (MOB 2022)	R\$ 29.008.588,61	R\$ 7.842.482,25	R\$ 7.842.482,25	27,04%



CORREDOR CELSO GARCIA

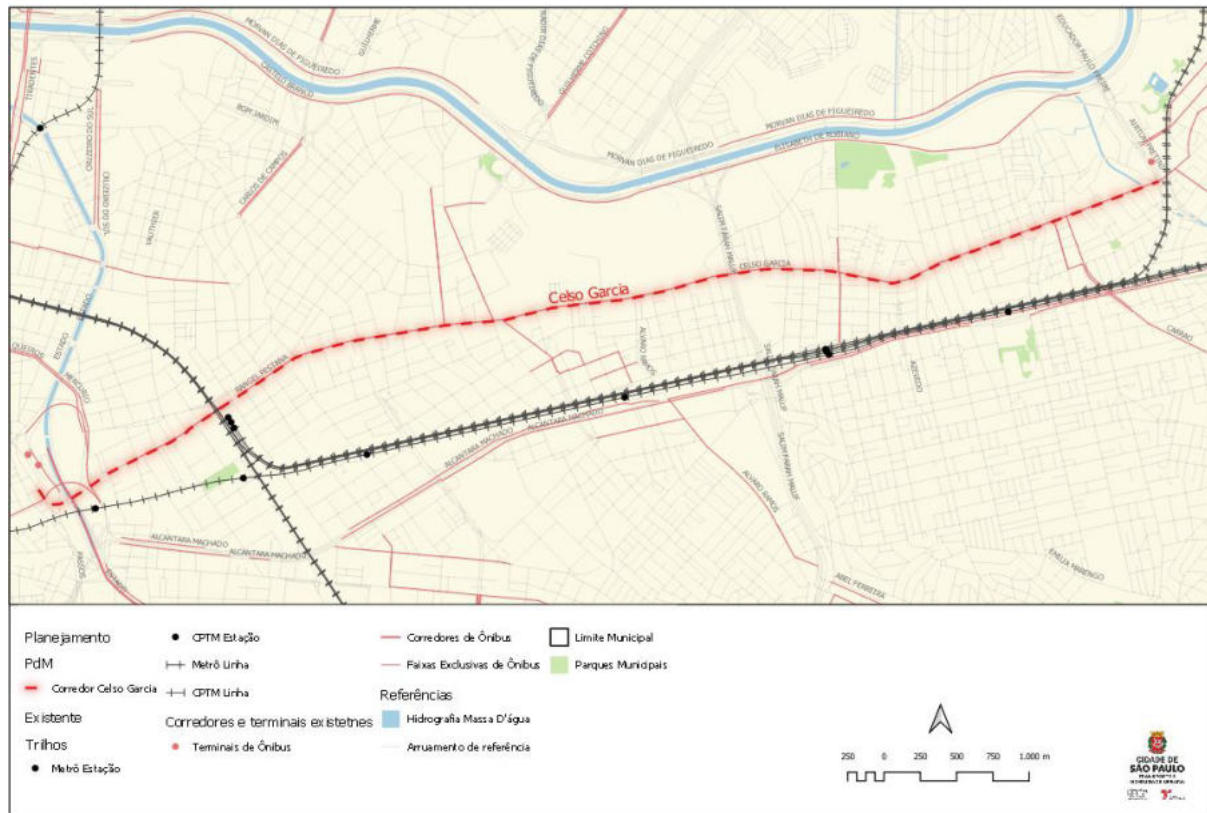

CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 4.950.000,00

Valor liquidado:

R\$ 3.088.648,15

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

Projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras:

- Contrato nº 2022/0195-01-00 - 25/06/2022
- Processo: 5010.2022/0002251-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Supervisão de obras e serviços ambientais:

- Contrato nº 2022/0421-01-00 - 09/12/2022
- Processo: 5010.2022/0005906-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 16.600.000,00

Valor liquidado:

R\$ 4.699.215,85

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS)



Av. Itaquera - Líder (Dezembro/2022)

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor total aprovado:

R\$ 3.505.536,65

Valor liquidado:

R\$ 9.818,25

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ



CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023
- Processo: 5010.2022/0021396-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor total aprovado:

R\$ 3.953.051,96

Valor liquidado:

R\$ 44.800,00

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 2.053.627,39 (MOB 2022)	R\$ 2.053.627,39	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	0,46%



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído 02/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído 03/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 2.053.627,39


Valor liquidado:

R\$ 9.500,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 12.308.177,03 (MOB 2021, MOB 2020)	R\$ 5.307.195,90	R\$ 233.901,36	R\$ 233.901,36	1,90%

TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

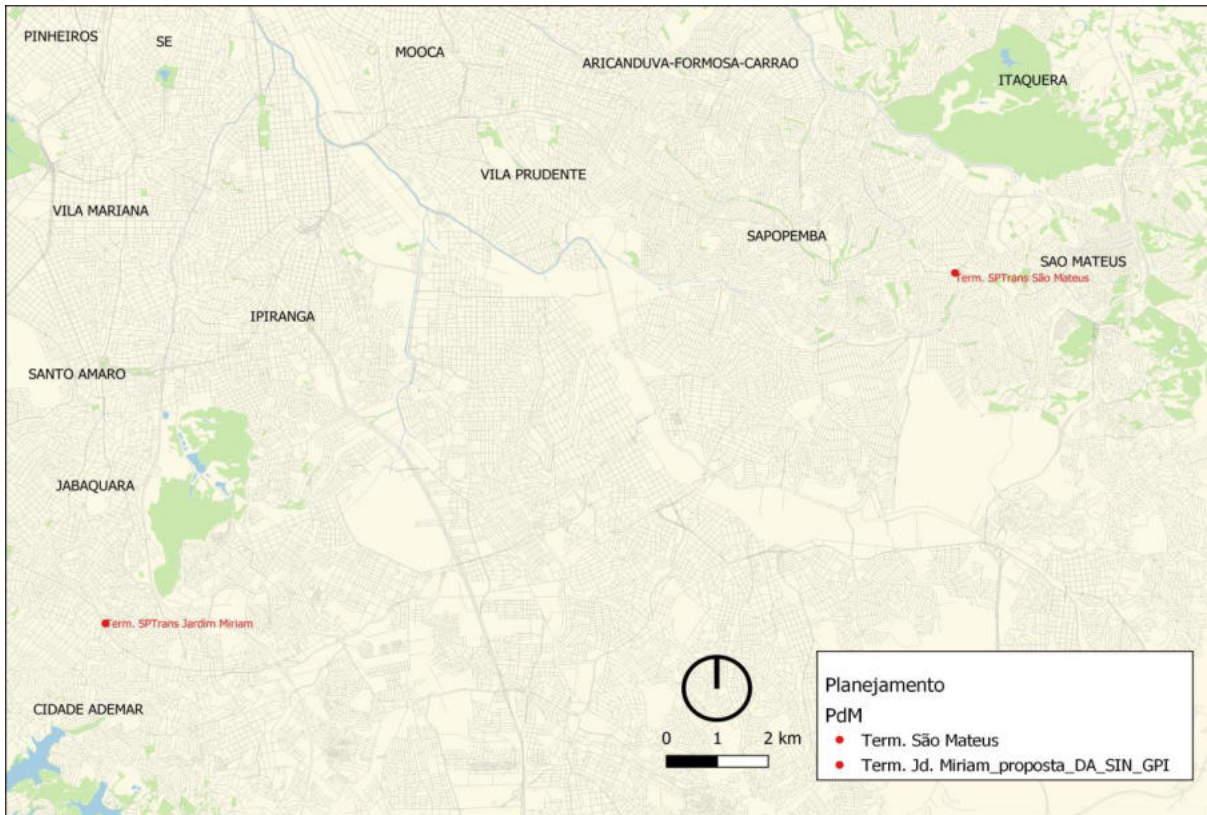

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Edital Licitação nº023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Valor total aprovado:

R\$ 1.936.450,33

Valor liquidado/pago:

R\$ 0,00

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 10.371.726,70

Valor liquidado:

R\$ 233.901,36

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Início das obras nas paradas da Av. Corifeu de Azevedo Marques, em Novembro/2022

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Previsão conclusão: 1º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 17.331.105,54


Valor liquidado:

R\$ 1.604.380,67

Av. Corifeu de Azevedo Marques (Dezembro/2022)



PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DO EXPRESSO TIRADENTES

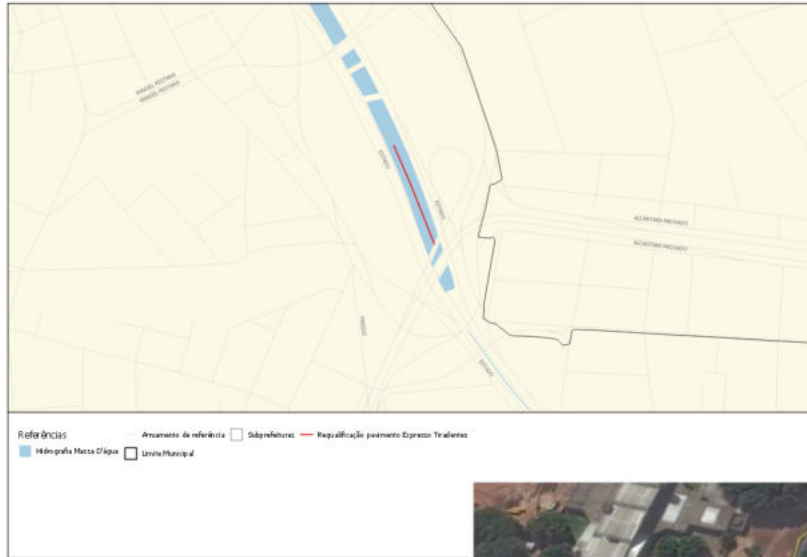

PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DO EXPRESSO TIRADENTES

(Trecho entre Estação Metrô Pedro II e Complexo Viário Evaristo Comolatti)

Situação atual:

Início de projeto em Novembro/2022

- Contrato nº 2022/0351-01-00
- Processo: 5010.2022/0017118-3
- Contrato rescindido 03/2023

Valor total aprovado:

R\$ 324.934,10

Valor liquidado:

R\$ 25.541,50



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
