

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Processo SEI 6020.2022/0035170-7



OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Área Calma São Miguel) (3757)	R\$ 6.972.186,42	R\$ 6.284.178,54	R\$ 1.881.955,15	R\$ 0,00	27,0%
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras) (3757)	R\$ 12.763.616,87	R\$ 1.698.557,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Obras de redesenho urbano para segurança viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e Travessias seguras) (3757)	R\$ 25.883.412,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 21.826.984,26	R\$ 2.647.603,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 38.185.849,23	R\$ 38.185.849,23	R\$ 5.538.393,72	R\$ 3.278.877,13	14,5%
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 3.201.041,67	R\$ 3.201.041,67	R\$ 767.321,83	R\$ 512.385,96	24,0%
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 12.567.075,06	R\$ 12.567.075,06	R\$ 1.577.404,01	R\$ 959.915,75	12,6%
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 13.508.234,04	R\$ 13.508.234,04	R\$ 2.137.903,76	R\$ 976.909,75	15,8%
(+ 16.000,00 como dotações a manter) TOTAL	R\$ 134.924.400,00	R\$ 78.092.538,77	R\$ 11.902.978,47	R\$5.728.088,59	8,8%

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 6.972.186,42	R\$ 6.284.178,54	R\$ 1.881.955,15	R\$ 0,00	27,0%

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (ÁREA CALMA SÃO MIGUEL)

Situação inicial



Situação atual



PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (PACOTES 1, 2, ROTAS ACESSÍVEIS E TRAVESSIAS SEGURAS)

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 12.763.616,87	R\$ 1.698.557,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%



OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA (PACOTES 1, 2, ROTAS ACESSÍVEIS E TRAVESSIAS SEGURAS)

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 25.883.412,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%




CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 21.826.984,26	R\$ 2.647.603,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%

IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 38.185.849,23	R\$ 38.185.849,23	R\$ 5.538.393,72	R\$ 3.278.877,13	14,5%

CORREDOR CELSO GARCIA

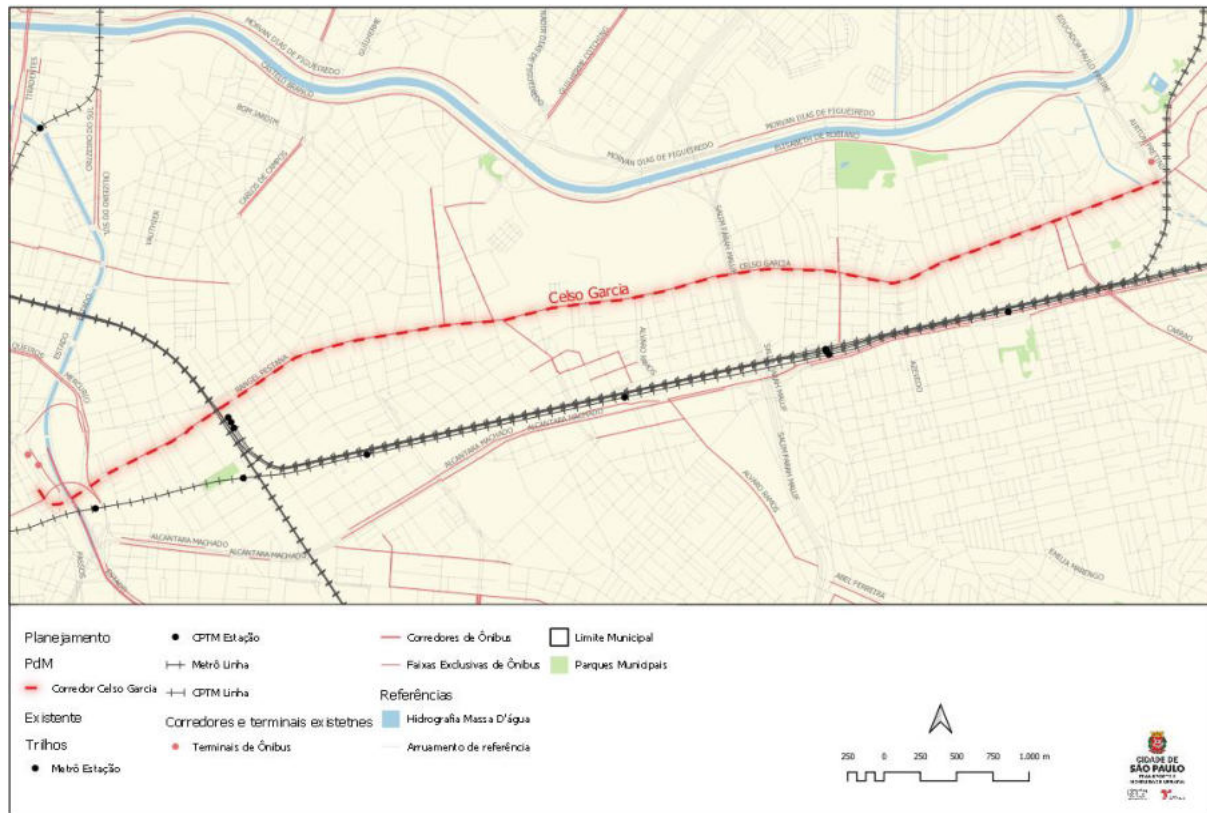

CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 3.367.892,49

Valor liquidado/pago:

R\$ 772.076,50

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

Projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras:

- Contrato nº 2022/0195-01-00 - 25/06/2022
- Processo: 5010.2022/0002251-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Supervisão de obras e serviços ambientais:

- Contrato nº 2022/0421-01-00 - 09/12/2022
- Processo: 5010.2022/0005906-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 13.323.311,62

Valor liquidado/pago:

R\$ 3.762.682,43



CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS)



Av. Líder X Praça Francisco Manuel Lopes, 1º trimestre 2023

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor total aprovado:

R\$ 3.020.928,96

Valor liquidado/pago:

R\$ 914.702,20

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ



CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023
- Processo: 5010.2022/0021396-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor total aprovado:

R\$ 3.617.732,14

Valor liquidado/pago:

R\$ 88.932,59

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 3.201.041,67	R\$ 3.201.041,67	R\$ 767.321,83	R\$ 512.385,96	24,0%

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído 02/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído 03/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023


Valor total aprovado:

R\$ 3.201.041,67

Valor liquidado/pago:

R\$ 767.321,83

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

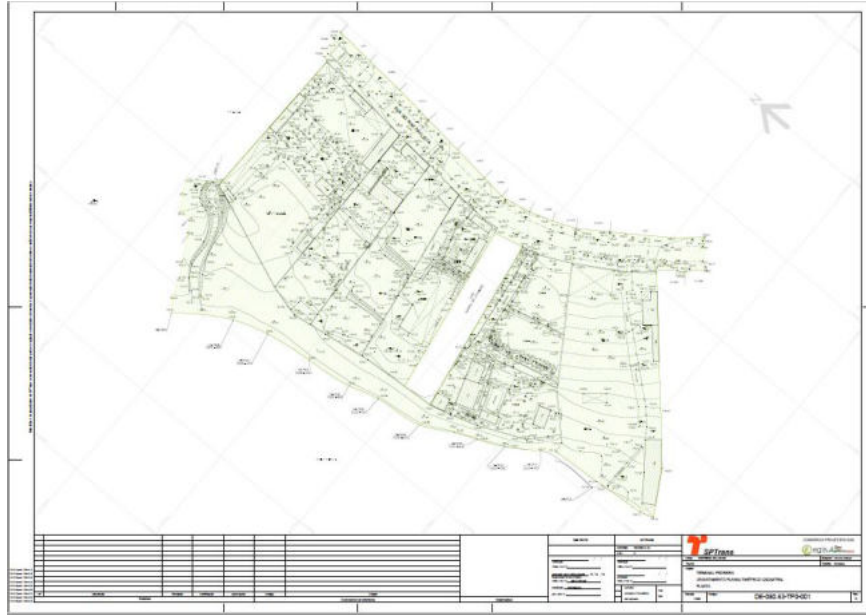


Levantamento planialtimétrico e cadastral dos Terminais Cocaia, Pedreira e viários de acesso - 1º semestre 2023

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 12.567.075,06	R\$ 12.567.075,06	R\$ 1.577.404,01	R\$ 959.915,75	12,6%



TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

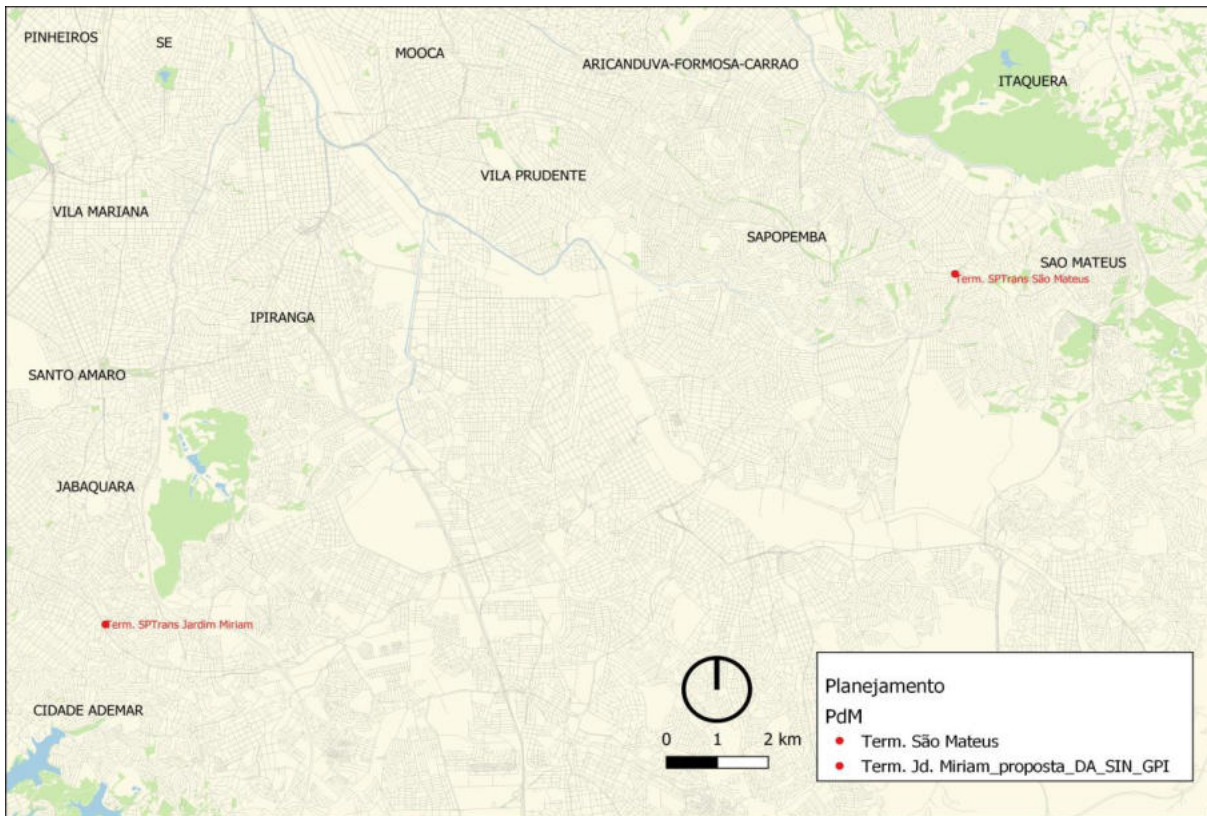

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Edital Licitação nº023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Estudos e projetos de realocação, contrato geral de gerenciamento e compatibilização de projetos:

- Contrato nº 2022/0156-01-00 – 17/09/2022
- Processo: 5010.2021/0012778-6

Valor total aprovado:

R\$ 4.196.564,23

Valor liquidado/pago:

R\$ 640.804,22

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023



Valor total aprovado:

R\$ 8.370.510,83

Valor liquidado/pago:

R\$ 936.599,79

TERMINAL SÃO MATEUS

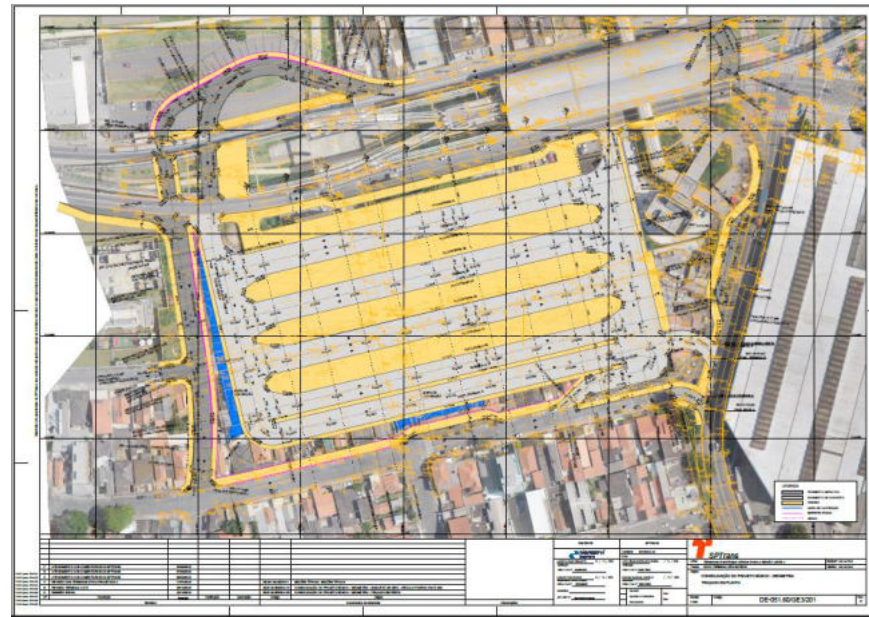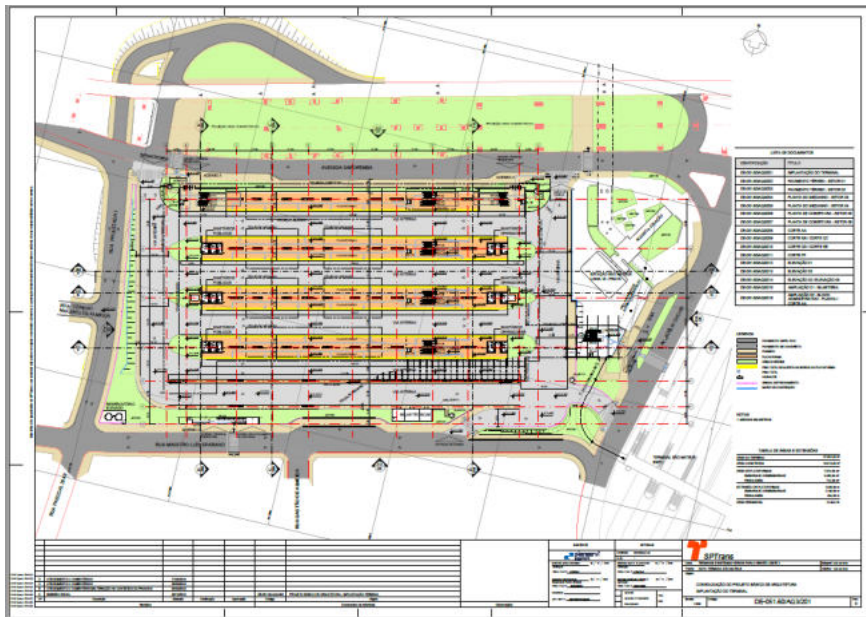



Consolidação do Projeto Básico - Terminal São Mateus - 1º semestre 2023

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	REALIZADO
R\$ 13.508.234,04	R\$ 13.508.234,04	R\$ 2.137.903,76	R\$ 976.909,75	15,8%



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

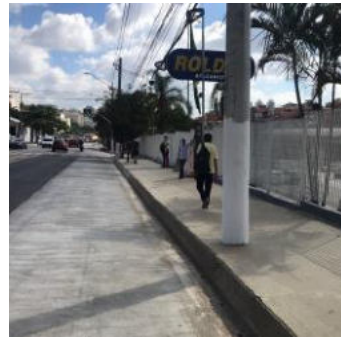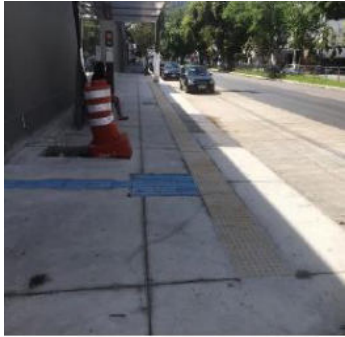

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 150, 3200, 2654 - 1º semestre 2023



Av. Vital Brasil, 108 e 593 - 1º semestre 2023

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Conclusão das obras nas paradas da Av. Corifeu de Azevedo Marques.

Início das obras nas paradas da Av. Vital Brasil no 1º semestre de 2023.

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023

Valor total aprovado:

R\$ 13.508.234,00

Valor liquidado/pago:

R\$ 2.137.903,76



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
