

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - 2020

PLANILHA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

Entrega: 28 de maio de 2021

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

PROPOSTA DE PLANO DE APLICAÇÃO FUNDURB 2020 - SMC						EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Item	Tipo	Equipamento cultural	Ação	Meta Vinculada	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
1	Administrativo	Sampaio Moreira	Obras de Restauro - segunda etapa	Meta 22	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.758.317,57	R\$ 2.918.816,93	R\$ 2.697.889,63	R\$ 2.697.889,63	92%	96%
			SP Obras Gerenciamento	Meta 22	R\$ 280.000,00	R\$ 152.005,84	R\$ 152.005,78	R\$ 152.005,80	R\$ 152.005,80	100%	54%
2	Biblioteca	Biblioteca Nuto Sant'Anna	Reforma do forro; conservação		R\$ 86.995,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
3	Centro Cultural	Centro Cultural Vila Formosa (Biblioteca Paulo Setúbal e Teatro Zanoni Ferrite)	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP		R\$ 13.004,27	R\$ 13.004,27	R\$ 10.865,77	R\$ 10.865,77	R\$ 10.865,77	100%	84%
TOTAL					R\$ 3.180.000,00	R\$ 2.923.327,68	R\$ 3.081.688,48	R\$ 2.860.761,20	R\$ 2.860.761,20		

Obs.: Os dados utilizados são referentes ao Relatório de Empenho detalhado.

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)


Execução orçamentária por dotação

Dotação	Solicitado (R\$)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020					
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de Liquidação do Valor Reservado	% de Liquidação do Valor Empenhado
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	R\$ 280.000,00	R\$ 152.005,84	R\$ 152.005,78	R\$ 152.005,80	R\$ 152.005,80	100%	100%
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	R\$ 100.000,00	R\$ 13.004,27	R\$ 10.865,77	R\$ 10.865,77	R\$ 10.865,77	84%	100%
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.758.317,57	R\$ 2.918.816,93	R\$ 2.697.889,63	R\$ 2.697.889,63	98%	92%
TOTAL	R\$ 3.180.000,00	R\$ 2.923.327,68	R\$ 3.081.688,48	R\$ 2.860.761,20	R\$ 2.860.761,20	97,86%	92,83%

Obs.: Os dados utilizados são referentes ao Relatório de Empenho detalhado.

1. Sampaio Moreira

Obra de restauro e requalificação

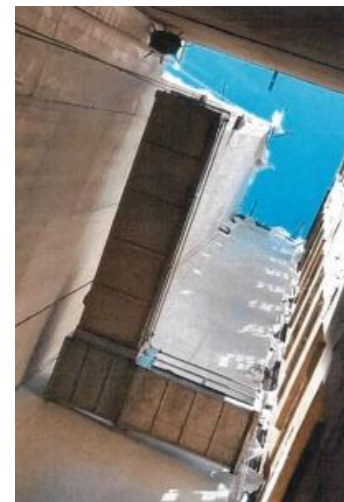

2. Centro Cultural Vila Formosa

Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP



Hidrantes



Detectores



Central de alarmes



Sirene



Sinalização



SPDA



Quadro elétrico
