

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 31 DE OUTUBRO 2018**

## **SEHAB**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

## RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS ATÉ 31/10/2018 SEHAB - TOTAL

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL APROVADO	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 7/2018	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3354 Construção de Habitação de Interesse Social	Obras	51.862.289	53.538.029	50.161.017	27.047.872	27.047.872
	Serviços Técnicos	3.998.489	4.499.750	3.369.644	2.503.803	2.503.803
	Aquisição de Imóveis		822.000			
	Aquisição de Imóveis	58.608.000	102.271.634	45.746.719	45.740.019	45.740.019
		<b>91.608.000</b>	<b>161.131.413</b>	<b>99.277.380</b>	<b>75.291.695</b>	<b>75.291.695</b>


(\*) acrescido de recurso 2016 liberado para Obras

## RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS ATÉ 31/10/2018 SEHAB – EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL APROVADO E REVISADO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3354 Construção de Habitação de Interesse Social	Aquisição de Imóveis 2016	7.340.739	7.340.739	7.334.039	7.334.039
	Aquisição de Imóveis 2017	36.322.895	19.906.628	19.901.628	19.901.628
	Aquisição de Imóveis 2018	58.608.000	18.499.352	18.490.487	18.490.487

Aquisição de Imóveis	2016	São João 588	7.334.039,00
	2017	Rua Aurora, 515/519.	5.553,59
		Projeto Redenção	67.021,74
		Rua Catumbi, 588	3.891.115,41
		Pça das Bandeiras 31	6.582.294,50
		Rua José Bonifácio, 383	9.355.643,00
	2018	FORTE DO RIO BRANCO I	12.710.487,00
		General Rondon	5.780.000,00

NOME	EMPENHADO PAGO
Heliópolis Sabesp 2	28.884.710 17.334.057
ESTÁGIO	AÇÃO
Em obra	360 UH

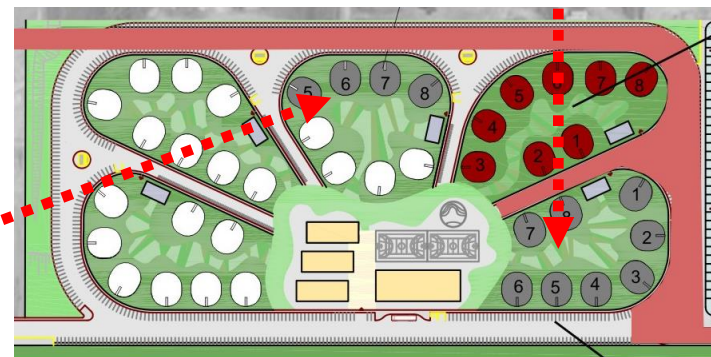

# Heliópolis / Gleba G – Condomínio B

NOME	EMPENHADO PAGO
------	----------------


HELÍÓPOLIS / GLEBA G – CONDOMÍNIO B	6.415.527 29.899
--	---------------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

EM OBRAS	INÍCIO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
----------	--



**CONDOMÍNIO B  
(221 UHS)**

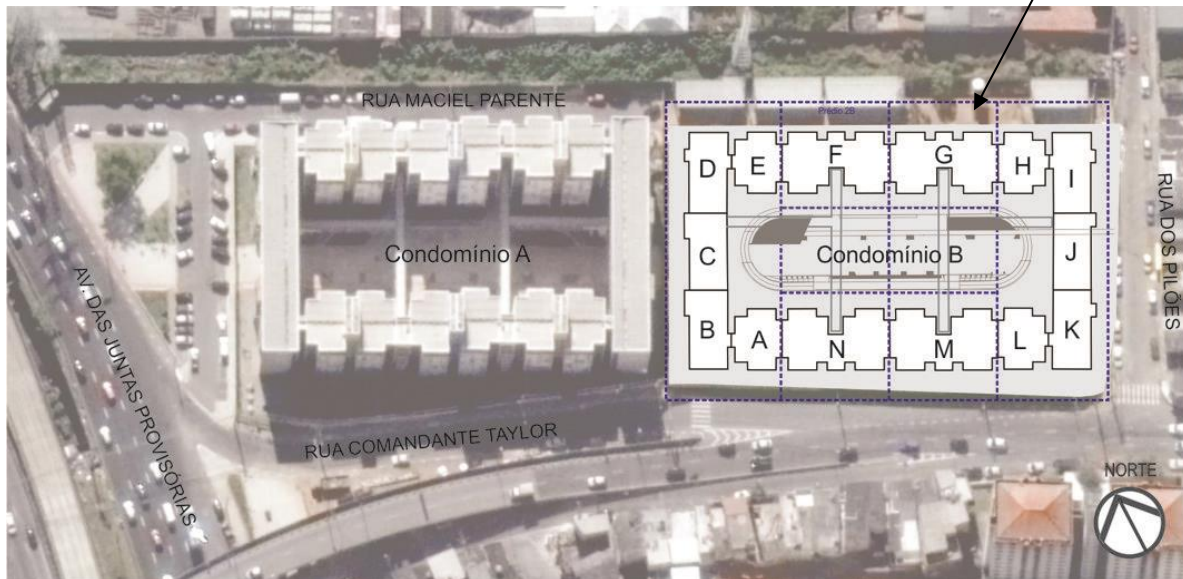

NOME	EMPENHADO PAGO
------	----------------

VIELA DA PAZ	10.436.588 5.567.398
--------------	-------------------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

EM ANDAMENTO	CONTINUIDADE DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
--------------	---



**CONDOMÍNIOS A1 (108 UHS)  
E (46 UHS) + URBANIZAÇÃO**



NOME	EMPENHADO PAGO
PARAISÓPOLIS	4.924.190 1.222.727
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	CONTINUIDADE DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS



**CONDOMÍNIO M  
(50 UHS)**

