

OUÇ FARIA LIMA

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO
14 de junho de 2016
LEI 13.769/2004



- I. **Verificação de Presença;**

- II. **Leitura e Aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária (05/04/2016) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.**

- III. **Informes Gerais:**
 - **Aspectos Financeiros;**
 - **Aspectos Orçamentários;**
 - **Aspectos Territoriais;**
 - **Andamento das Intervenções.**


Aspectos Financeiros

Receitas	31/05/2016
Outorga Onerosa	465.321.920,86
Leilão de Cepac	1.233.513.237,37
Cepac Colocação Privada	140.971.609,42
Outras Entradas	18.008.514,71
Receita Financeira Líquida	438.253.748,83
TOTAL RECEITAS	2.296.069.031,19


Despesas	
Obras e Serviços	929.281.909,36
Transporte Coletivo - Metrô	200.000.000,00
Habitação de Interesse Social	323.206.737,48
Reurbanização Real Parque	267.305.822,37
Aluguel social	7.355.800,00
Gerenciamento	21.550.536,77
Ciclopassarela Panorama	173.019,54
Desapropriação - HIS Coliseu	18.392.134,82
Desapropriação - HIS Real Parque	8.429.423,98
Outras Desapropriações	185.726.783,25
Taxa de Administração	96.732.473,80
Outras Despesas	8.650.879,66
TOTAL DESPESAS	1.743.598.783,55
SALDO HIS	61.133.446,66
SALDO FINAL	552.470.247,64

Aspectos Orçamentários

OUTORGA ONEROSA / CEPAC	FASE	ORÇAMENTO 2016	VALOR EMPENHADO 2016
SALDO em 31/05/16 R\$ 552.470.247,64			
Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e Remoção das Favelas Real Parque, Coliseu e Panorama			
Real Parque 2a Etapa - HIS	em execução	17.100.000,00	17.100.000,00
Coliseu HIS	a licitar	30.000.000,00	0
Reconversão Urbana Largo da Batata Fase 3			
Reconversão Urbana Largo da Batata Fase 3	em execução	80.000.000,00	742.468,39
Ciclovias			
Ciclovía Faria Lima	em execução	3.000.000,00	3.000.000,00
Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro			
Requalificação Av. Santo Amaro	em execução	80.000.000,00	16.245.771,24
Desapropriação	em execução	150.000.000,00	53.766.704,12
	SUBTOTAL		90.854.943,75
Taxas de Administração			
São Paulo Obras		14.943.875,00	10.211.351,23
São Paulo Urbanismo		24.142.602,00	14.905.769,70
	TOTAL		115.972.064,68

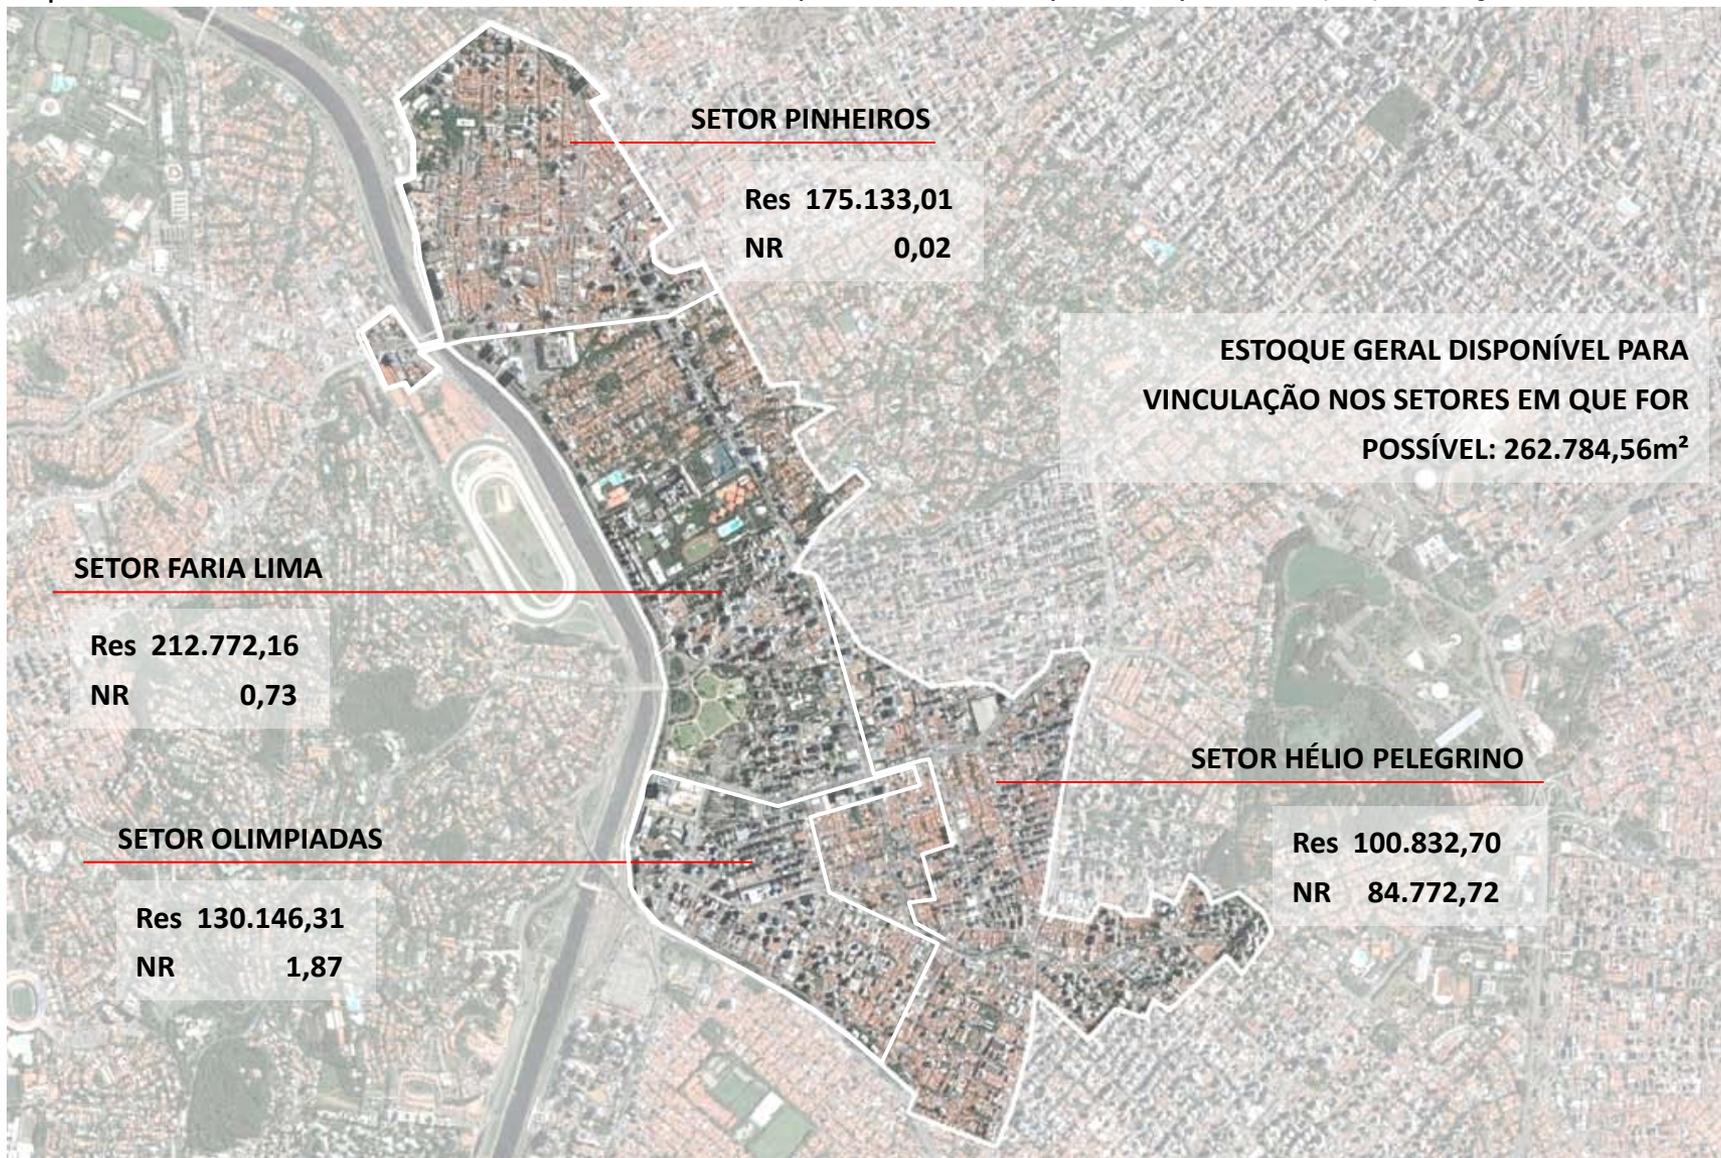

Aspectos Territoriais

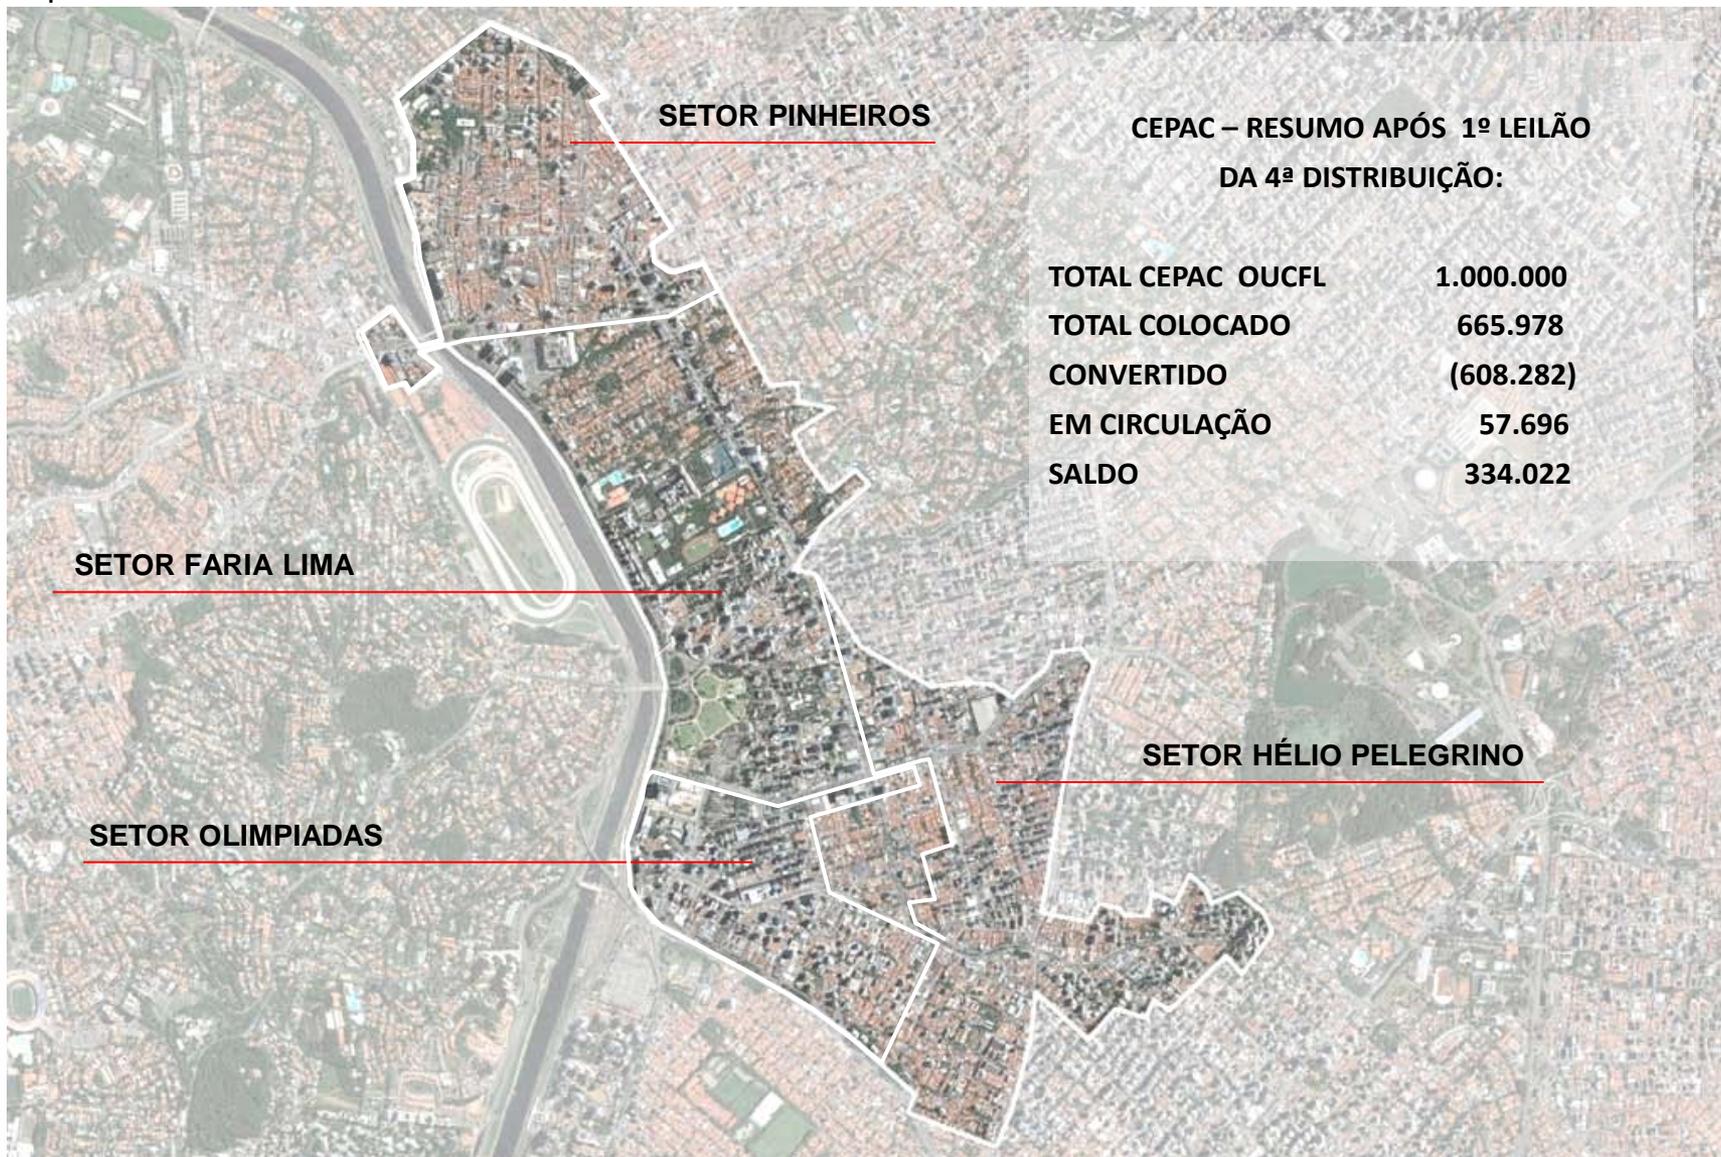

Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

**Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e
Remoção das Favelas Real Parque, Coliseu e Panorama
HIS Real Parque – Fase II**

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004

Anexo 2 item V

Lei 15.519/2011

3. LOCALIZAÇÃO



4. RESPONSÁVEL

SEHAB

5. ANDAMENTO

Atual

Intervenção contemplada na 4ª Distribuição de CEPAC;

Número total de Unidades: 1.246;

Unidades remanescentes a entregar: 112;

Entrega final prevista para julho/2016;

Continuam obras adicionais previstas em contrato relativas ao entorno do conjunto (3R);

Finalização do suporte de auxílio aluguel a partir da entrega final de unidades.

13.09.13 Contrato SEHAB nº008/2013

5. ANDAMENTO



Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

**Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e
Remoção das Favelas Real Parque, Coliseu e Panorama
HIS Coliseu**

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004
Anexo 2 item V
Lei 15.519/2011

3. LOCALIZAÇÃO



4. RESPONSÁVEL

SEHAB

5. ANDAMENTO

Atual Intervenção contemplada na 4ª Distribuição de CEPAC;
Ações expropriatórias ajuizadas, em fase de pagamento;
Rua Coliseu desafetada;
Conselho Gestor de ZEIS está composto (Portaria Nº 40/SEHAB-G/2015);
Projeto legal elaborado pela COHAB aprovado na PMSP/SEL;
Licitação da obra em condução pela SEHAB paralisada novamente: TCM enviou novos questionamentos;
SEHAB deve aguardar para programar remoção (impacto no auxílio-aluguel).

19.05.14 Publicação do Decreto de Interesse Social (DIS Nº 55.125).



Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

**Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e
Remoção das Favelas Real Parque, Coliseu e Panorama
HIS Panorama**

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004

Anexo 2 item V

Lei 15.519/2011

3. LOCALIZAÇÃO



4. RESPONSÁVEL

SEHAB

5. ANDAMENTO

Maio/2016 Trabalhos sociais na área foram retomados visando cadastramento e selagem.

07.06.16 Os trabalhos voltaram a ser interrompidos pela própria comunidade.



Proposta ilustrativa

Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase 3

Reforma de logradouros, iluminação pública, passeios, paisagismo, drenagem e infraestrutura para enterramento de redes.

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004

Anexo 2 itens XI

Instrução CVM 401 Artigo 13

Itens IV, V, VI e VIII

3. LOCALIZAÇÃO



4. RESPONSÁVEL

SIURB/SP OBRAS

5. ANDAMENTO

- Atual Intervenções no viário – diversas ruas – processos encaminhados para empenho e elaboração de contratos.
- 13.06.16 Reunião para definição do cronograma de instalação dos equipamentos.
- 09.06.16 Iniciada imissão na posse das desapropriações Eugênio/Butantã/Amaro.
- 06.06.16 Mobiliário Urbano: contrato assinado com a empresa Delta.

5. ANDAMENTO

Intervenções

4A – R. Costa Carvalho

Reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4B – Av. das Nações Unidas

Adequação geométrica para acesso seguro ao Terminal de Ônibus Pinheiros

4C – R. Amaro Cavalheiro e R. Pascoal Bianco

Reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4D – R. Eugênio de Medeiros

Conclusão do acesso ao Terminal Pinheiros, reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4E – R. Bartolomeu Zunega

Reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4F – R. João Elias Saad

Reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4G – R. Dr. Manoel C. F. de Almeida

Conclusão do bolsão para manutenção de pontos finais de ônibus, reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4H – R. Butantã

Implantação de duas faixas exclusivas para interligação de corredores, reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4I – R. Jorge Rizzo

Reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4J – R. Cardeal Arcoverde

Implantação de uma faixa exclusiva para interligação de corredores, reurbanização e obras de infraestrutura e pavimentação

4K – Largo da Batata

Mobiliário urbano



Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro

Obras e serviços


2. BASE LEGAL

Lei 16.242/2015

Lei 14.193/2006

Lei 13.769/2004 Anexo 2

3. LOCALIZAÇÃO

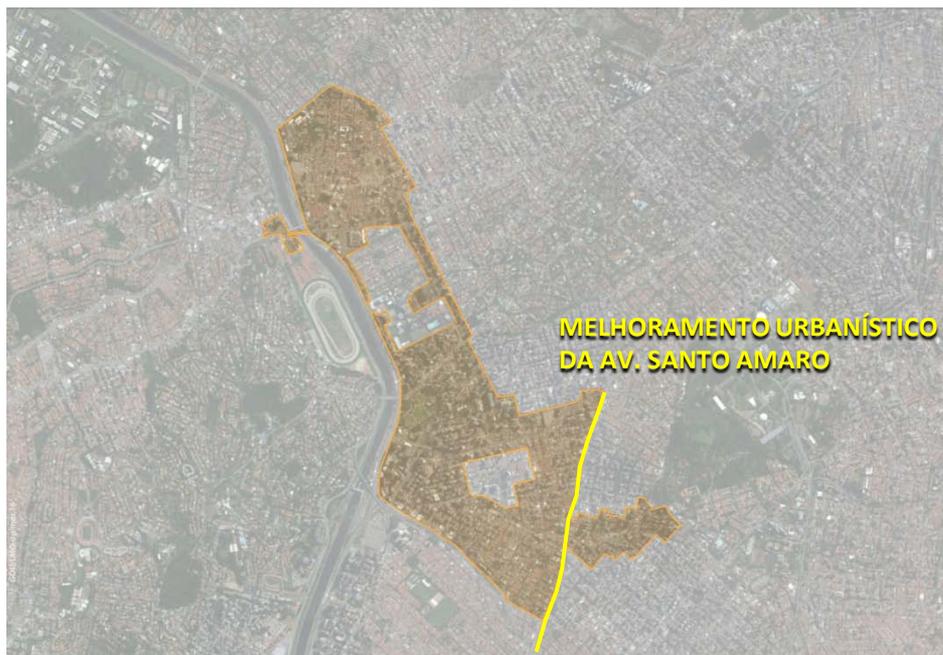

4. RESPONSÁVEL

SP Urbanismo/SIURB

5. ANDAMENTO

Atual

Objeto da concorrência: elaboração dos projetos executivos e execução das obras de requalificação / reforma do Corredor de ônibus do trecho Av. Pres. Juscelino Kubistchek até Av. Dos Bandeirantes;

Empresa vencedora: Consórcio Souza Compec/ Coplan;


Ordem de Serviço nº 01/2016 (projetos e serviços de meio ambiente);

Liminar judicial em razão de ação movida por empresa participante do certame licitatório pode paralisar o andamento.

Reuniões do Grupo de Gestão

05.04.16 28ª Reunião – validação do projeto.

19.03.14 21ª Reunião Ordinária: apresentação da Proposta de Intervenção.



Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

Passarela do conjunto das pontes Eusébio Matoso e Bernardo Goldfarb

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004

Anexo 2 – itens II, IV e VIII

3. LOCALIZAÇÃO



4. RESPONSÁVEL

SPTrans

5. ANDAMENTO

Atual Início de definições para elaboração do processo licitatório;
Termo de referência elaborado;
Planilha de quantidades e preços finalizada;
Protocolada solicitação à EMAE para transposição do Rio Pinheiros.

Reuniões do Grupo de Gestão

05.04.16 28ª Reunião – validação do projeto.

10.02.15 24ª Reunião – apresentação da proposta da execução da passarela.

Andamento das Intervenções

1. INTERVENÇÃO

Ciclovias


Melhoramentos urbanísticos, obras e instalações

2. BASE LEGAL

Lei 13.769/2004

Anexo 2 item VIII

3. LOCALIZAÇÃO

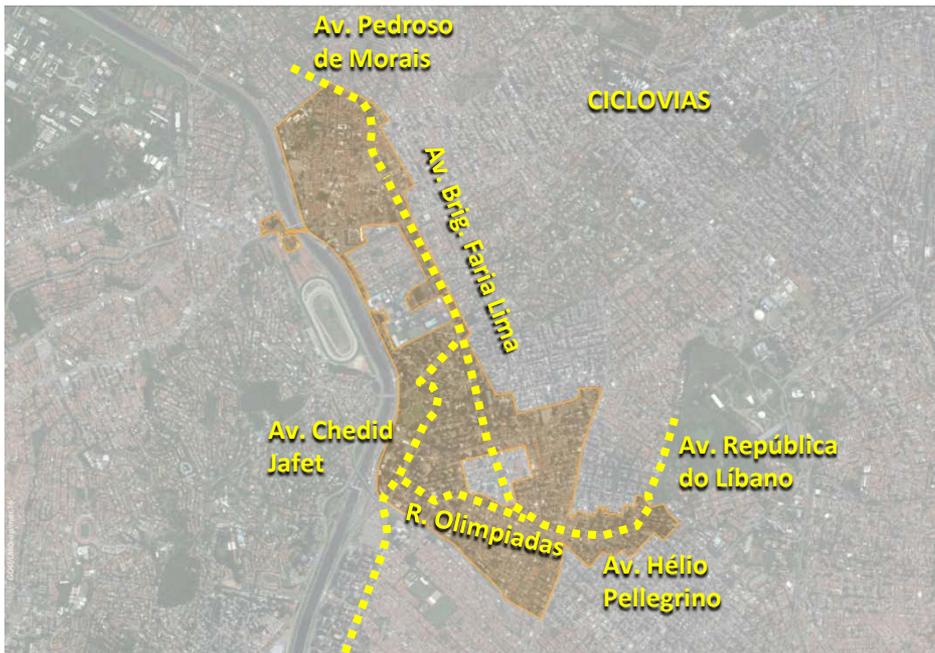

4. RESPONSÁVEL

SMSP/SIURB

5. ANDAMENTO

Atual

O Eixo principal está finalizado, sendo executados pequenos ajustes necessários ao bom funcionamento da ciclovia. As ramificações estão em fase de finalização nos serviços de sinalização.

5. ANDAMENTO

O trajeto proposto interligando o CEAGESP ao Parque do Ibirapuera, possui cerca de 18 quilômetros, distribuídos da seguinte maneira:

Eixo principal

Av. Dr. Gastão Vidigal
Av. Prof. Fonseca Rodrigues
Av. Pedroso de Moraes
Av. Brigadeiro Faria Lima
Av. Hélio Pellegrino
Rua Inhambu
Av. República do Líbano

Ramificações

Av. Queirós Filho da Praça Apecatu até a Estação CPTM Villa Lobos / Jaguaré.
Av. Arruda Botelho
Av. Prof. Manuel José Chaves
Av. Prof. Frederico Hermann Jr.
Rua Natingui
Av. Rebouças entre a Av. Brigadeiro Faria Lima e a estação Hebraica – Rebouças da CPTM.
Avenidas Henrique Chamma e Chedid Jafet.
Rua Funchal, entre a Rua Gomes de Carvalho e a praça Gióia Jr., na altura do acesso ao Parque do Povo.
Rua Gomes de Carvalho
Rua Olimpíadas, entre a Rua Elvira Ferraz e a Av. Brigadeiro Faria Lima.



Av. Prof. Fonseca Rodrigues



Av. Prof. Fonseca Rodrigues



Av. Hélio Pellegrino



Praça Panamericana



Av. República do Líbano



Av. República do Líbano



Av. República do Líbano



Rua Inhambu



Rua Inhambu


CICLOVIA FARIA LIMA

EXECUÇÃO CONTRATUAL

OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA

Março 2016

REDE CICLOVIÁRIA

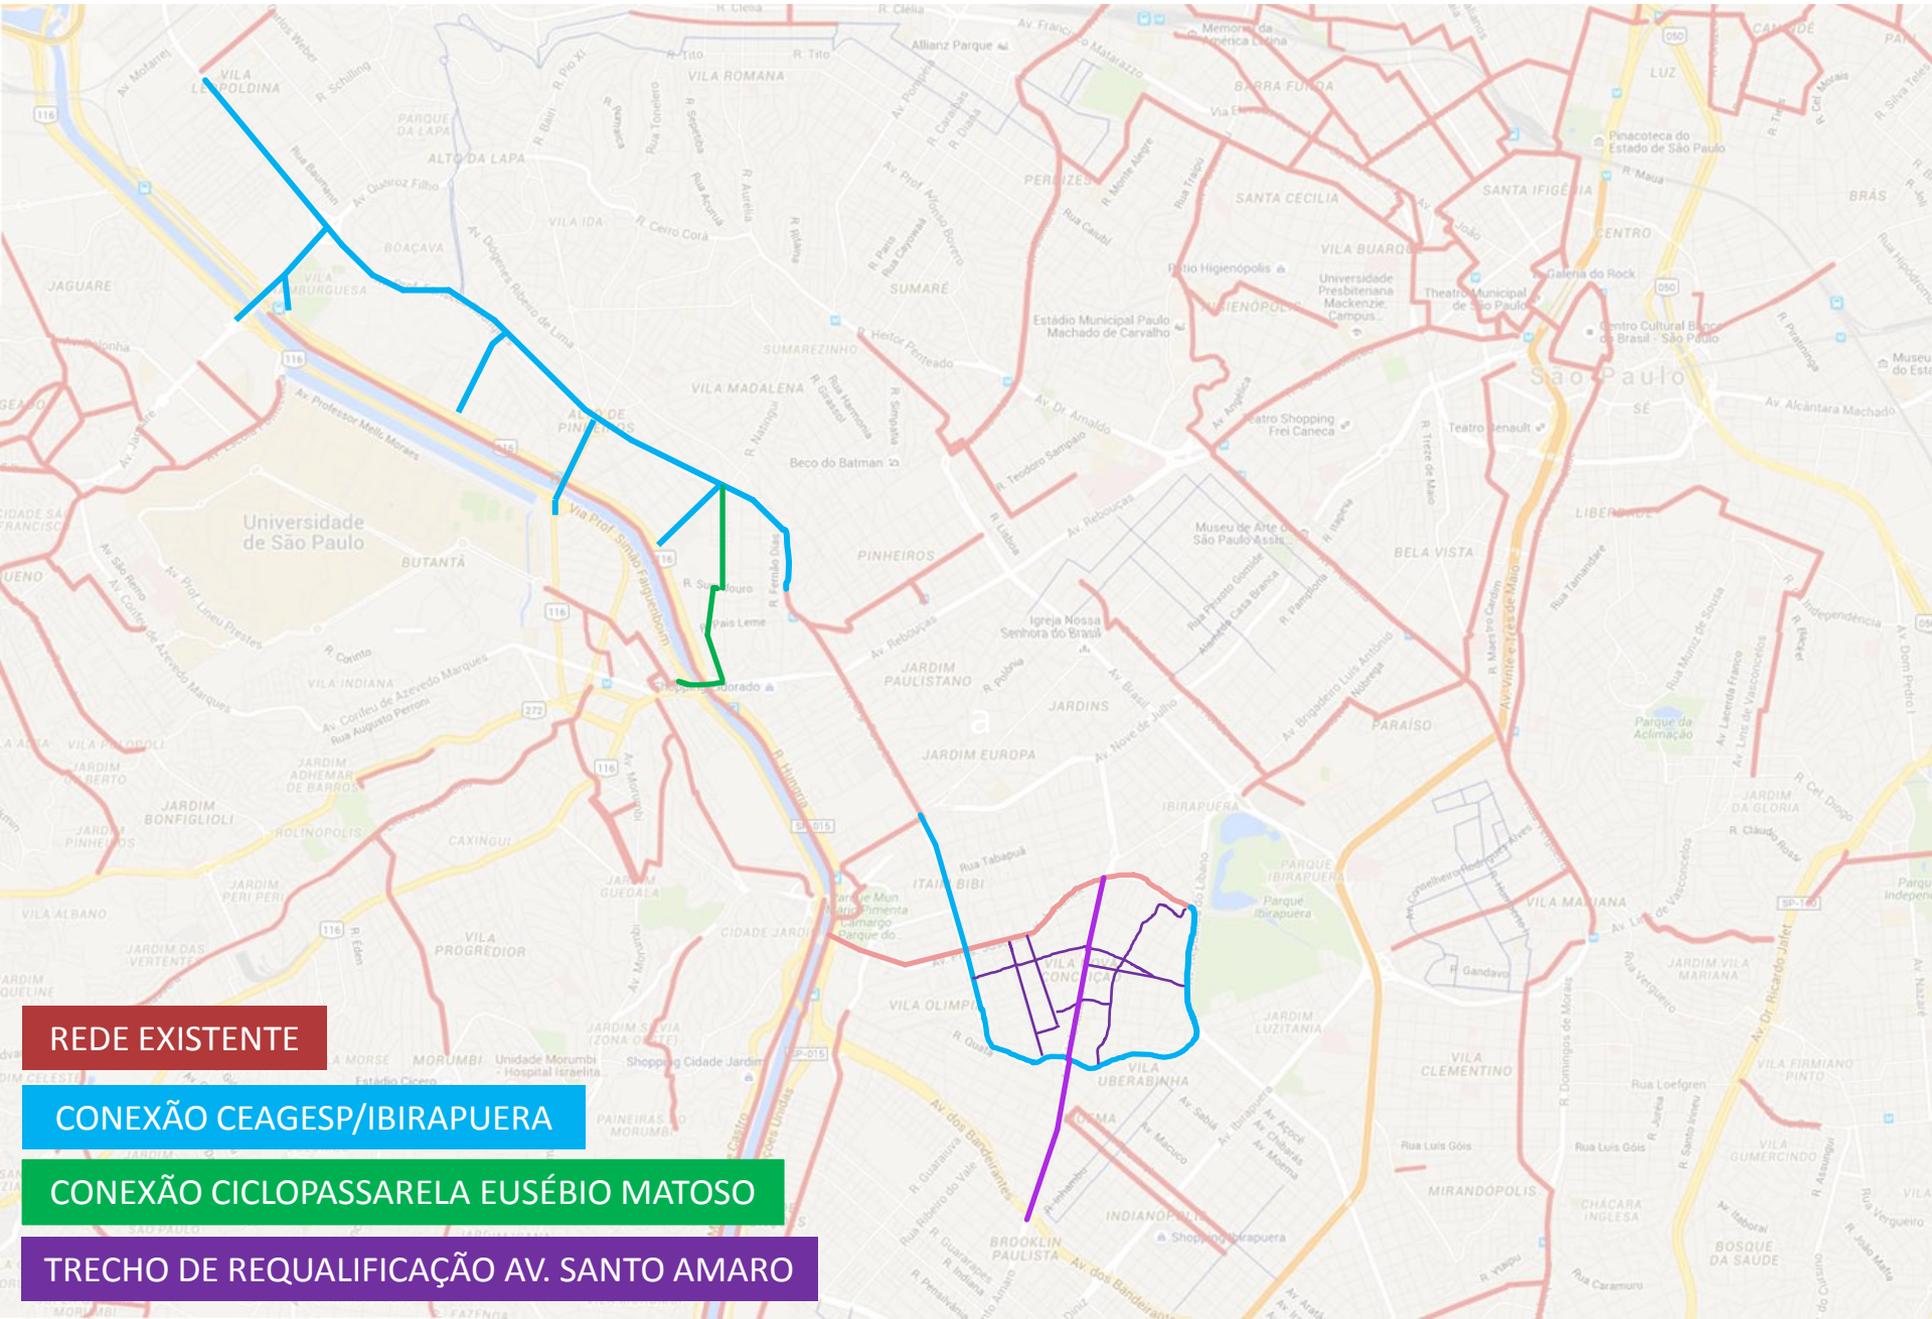


REDE EXISTENTE

CONEXÃO CEAGESP/IBIRAPUERA

CONEXÃO CICLOPASSARELA EUSÉBIO MATOSO

TRECHO DE REQUALIFICAÇÃO AV. SANTO AMARO

CICLOVIA CEAGESP – IBIRAPUERA E ADJASCÊNCIAS

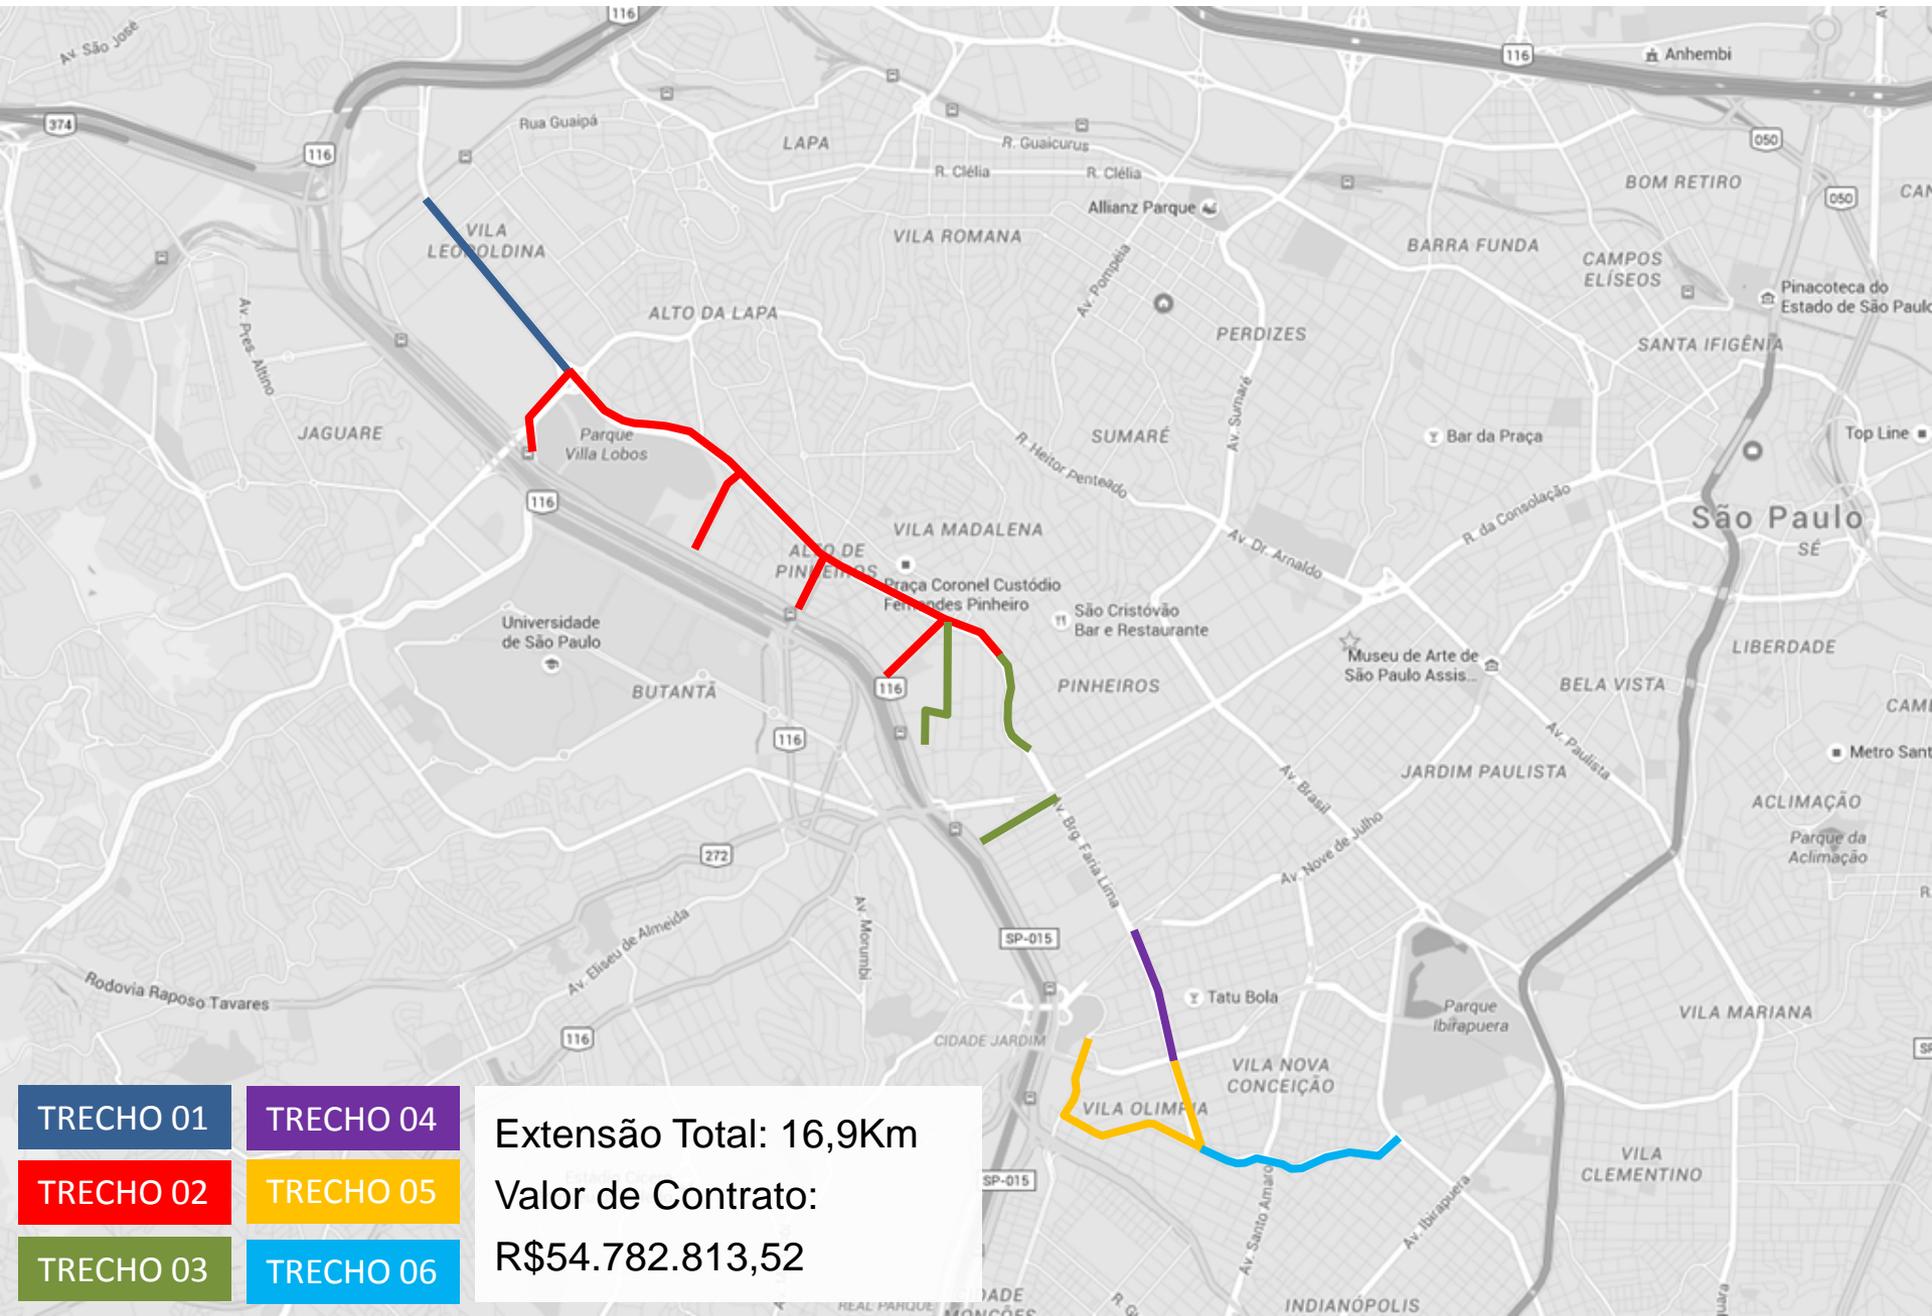

TRECHO 01

TRECHO 04

TRECHO 02

TRECHO 05

TRECHO 03


TRECHO 06

Extensão Total: 16,9Km

Valor de Contrato:

R\$54.782.813,52

TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

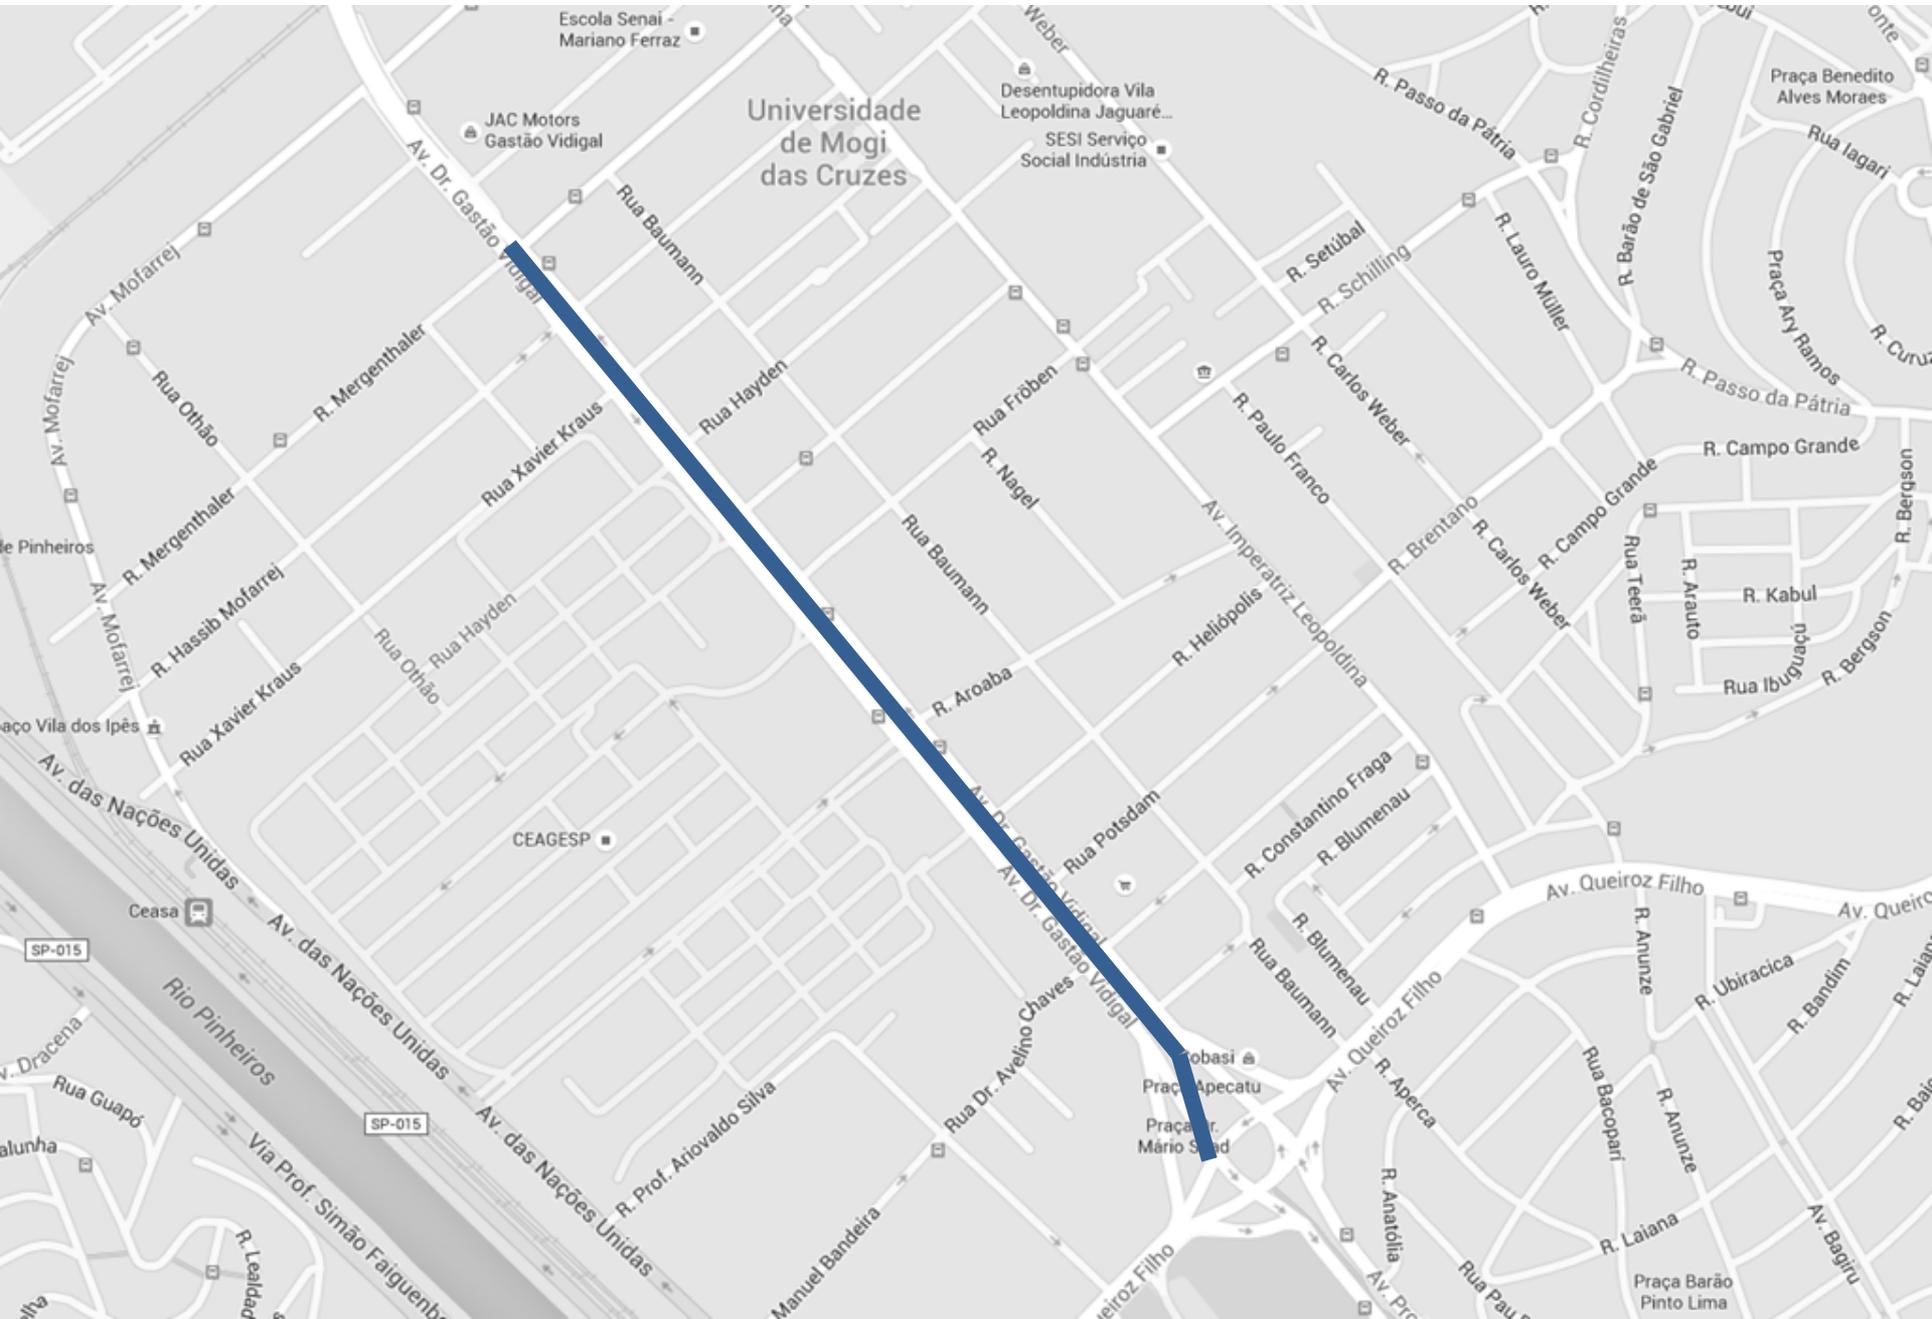

TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

Entre a Rua Hassib Mofarrej e Pça. Apecatu/Av. Queiroz Filho

Extensão: **1,5Km**

Valor de Contrato: **R\$ 6.048.529,82**


Valor Executado 2014/2015: **5.734.694,50 (95%)**

Valor por metro quadrado: **R\$1512,13**


Vistoria:

- Pavimentação finalizada em bom estado, com poucas imperfeições e dimensões confortáveis.
- Trecho com sinalização horizontal e vertical quase completa.
- Excelentes confluências de rampas e leito nas travessias.

TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

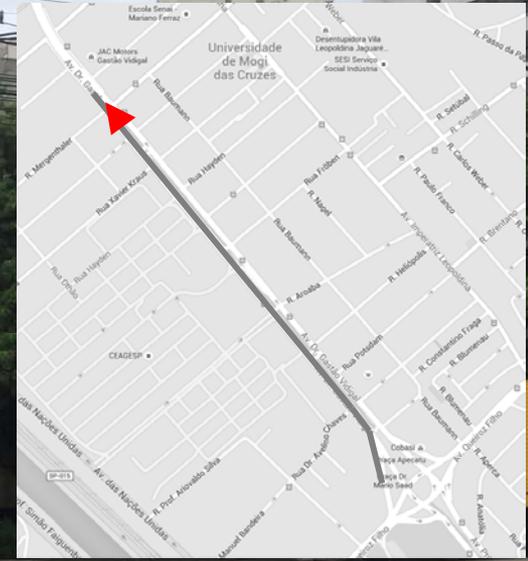


TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

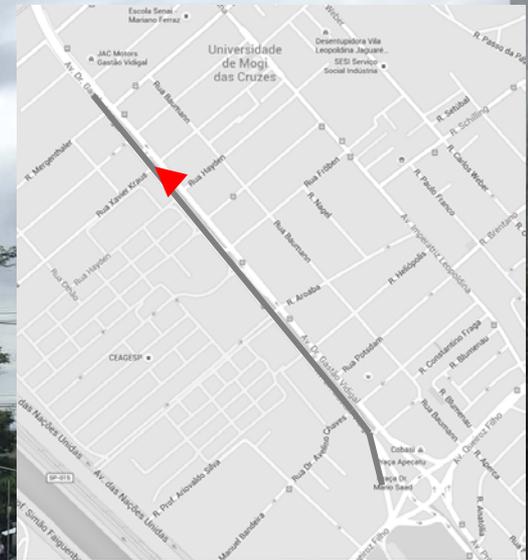


TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp



CICLISTA
50
ATRAVESSE
NO VERDE

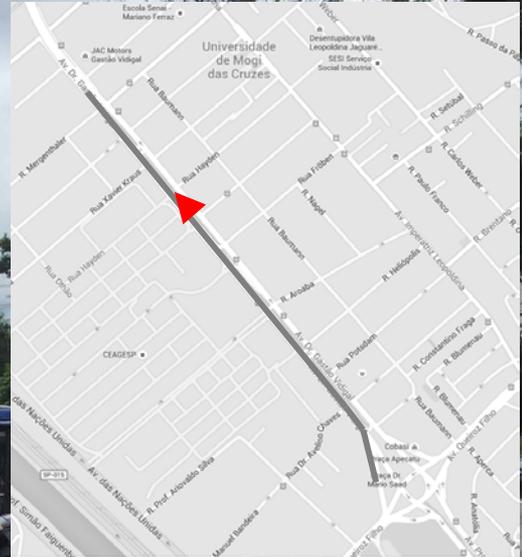


TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

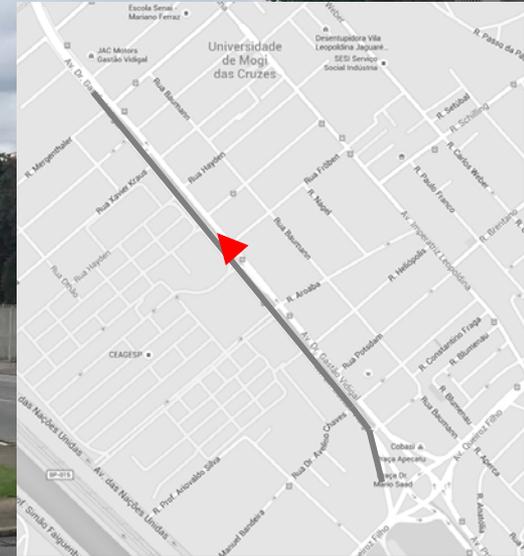

TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp



TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp

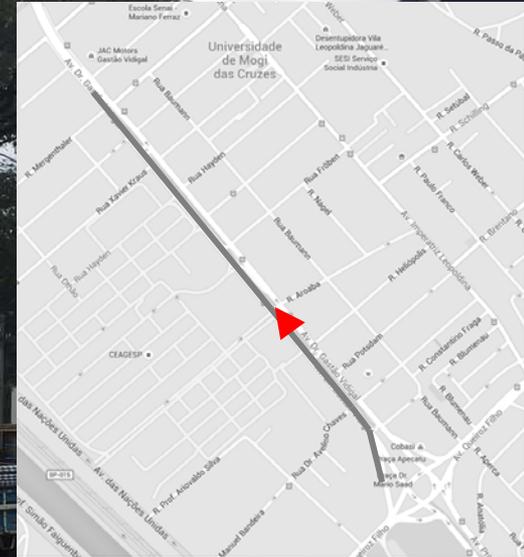

TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp



TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp



TRECHO 01 - CT05 Gastão Vidigal/Ceagesp



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

Entre a Pça. Apecatu e a confluência da Rua Pedroso de Moraes e a Av. Faria Lima

Extensão: **6,6Km**

Valor de Contrato: **R\$ 15.777.759,48**

Valor Executado 2014/2015: **11.109.902,33 (70%)**

Valor por metro quadrado: **R\$956,28**

Vistoria:

- Pavimentação finalizada em ótimo estado em maioria, com trechos incompletos.
- Trecho **SEM** qualquer sinalização de suporte ainda, seja horizontal ou vertical.
- Excelentes confluências de rampas e leito nas travessias.

TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes




TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

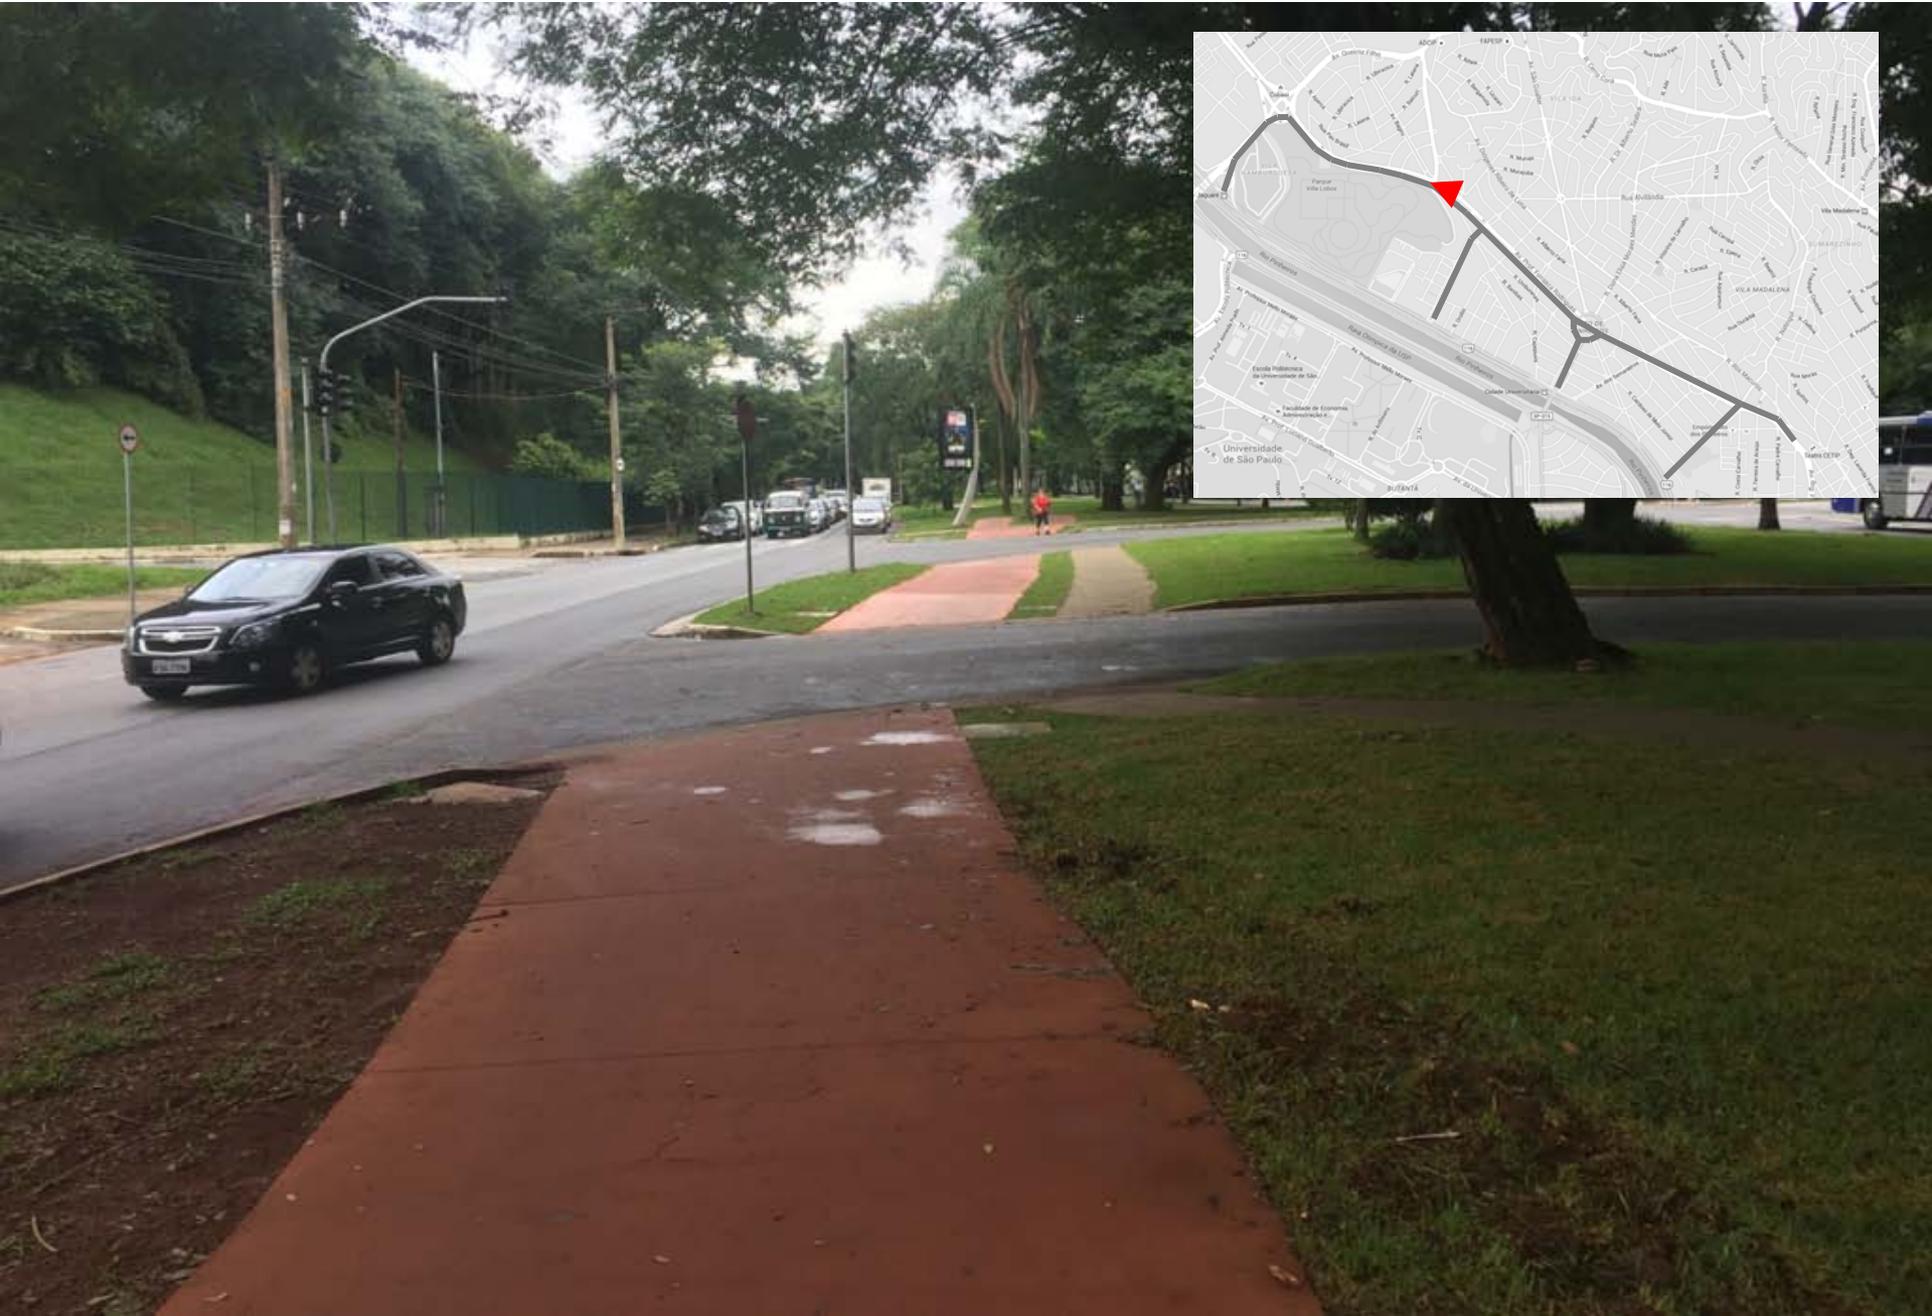


TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

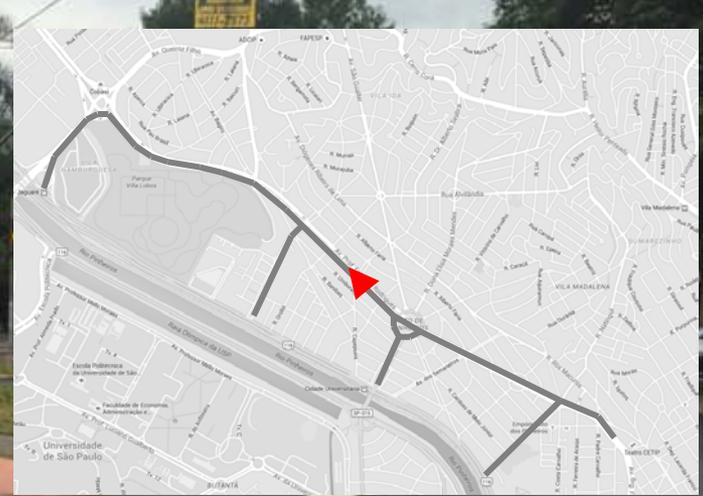

TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes




TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

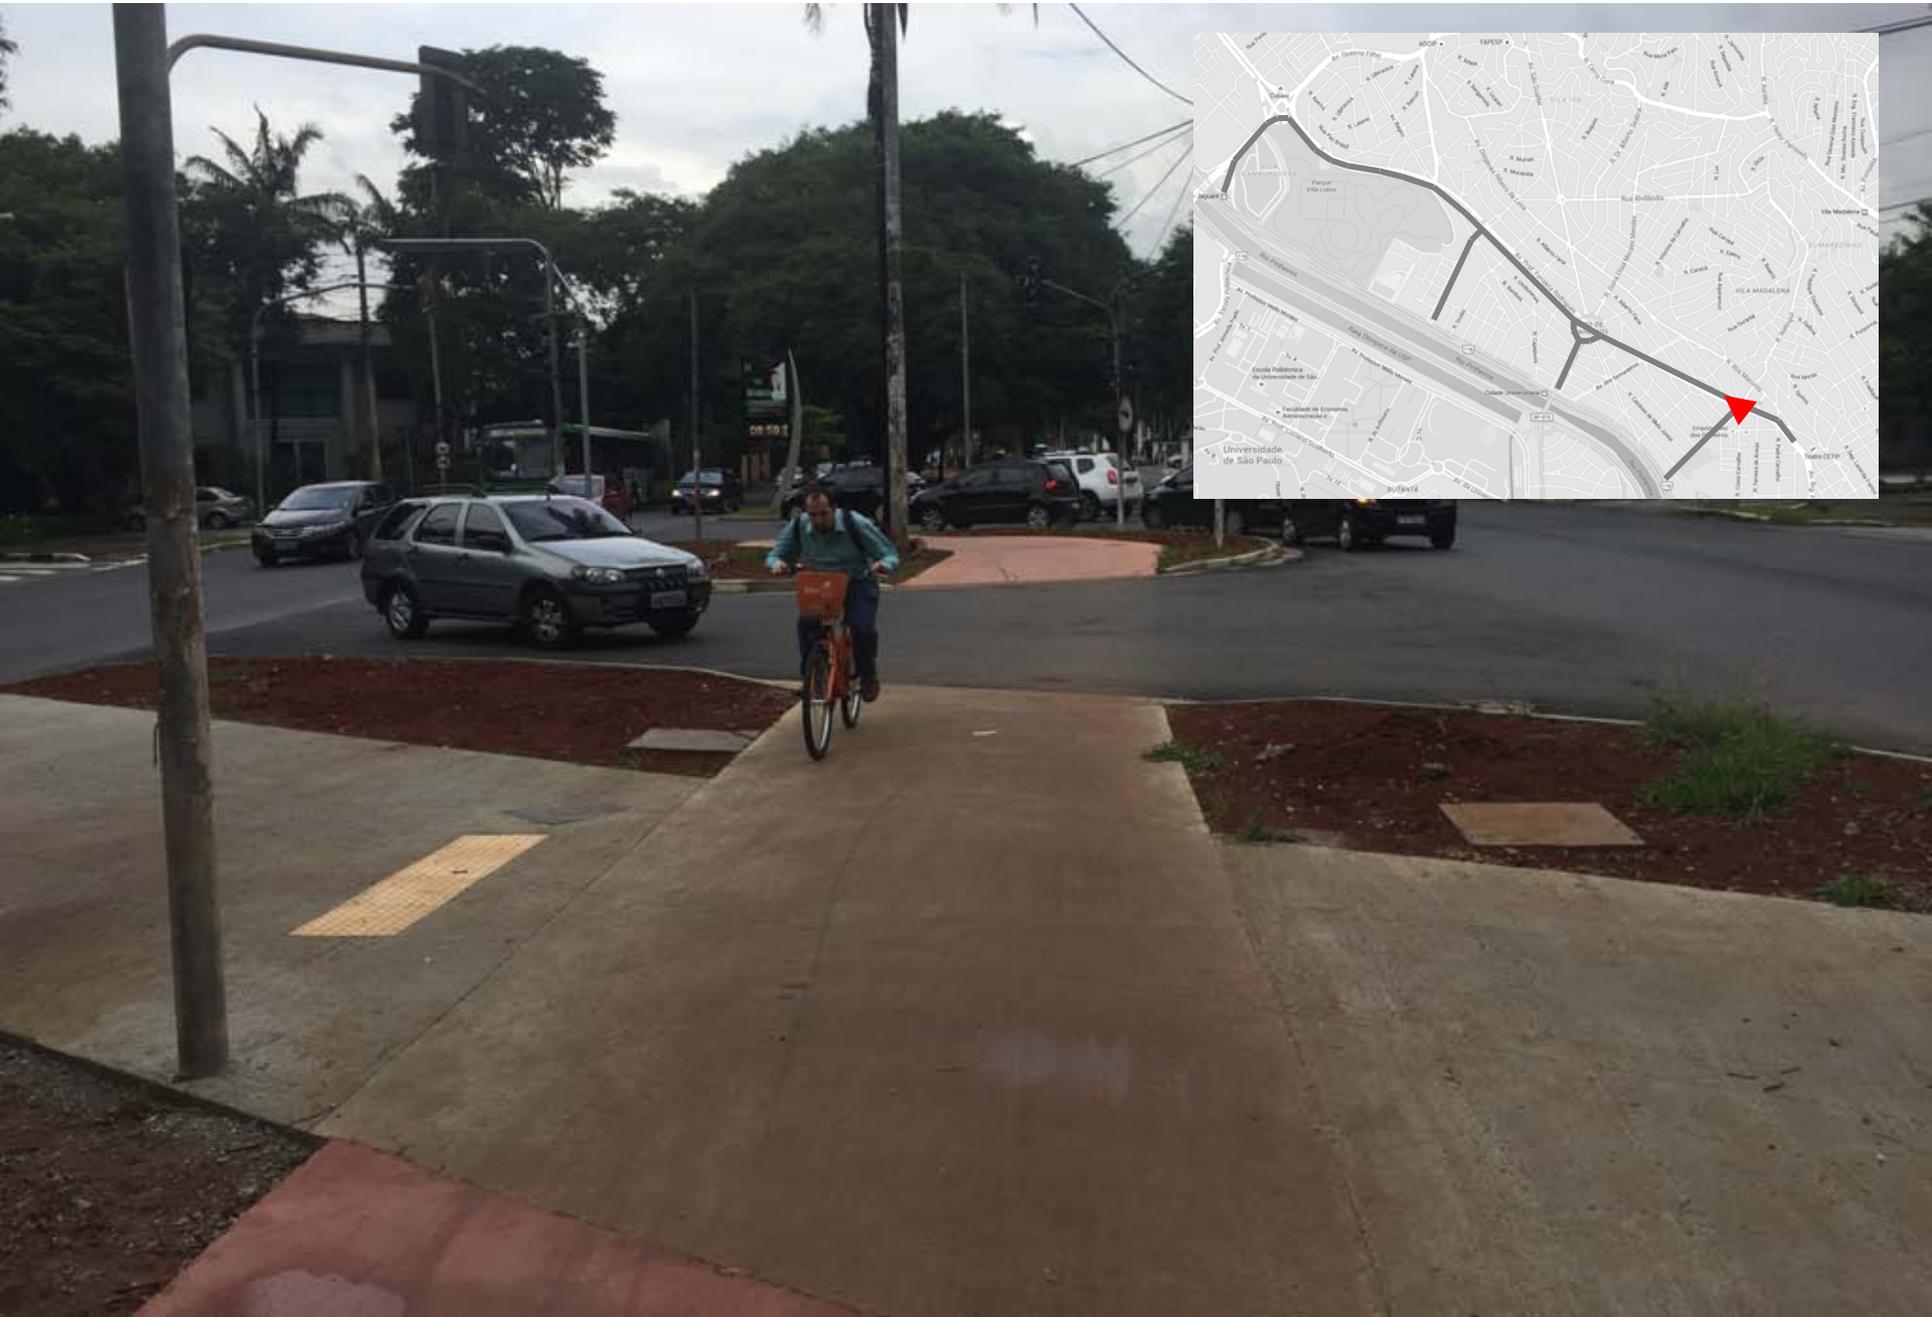

TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes




TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

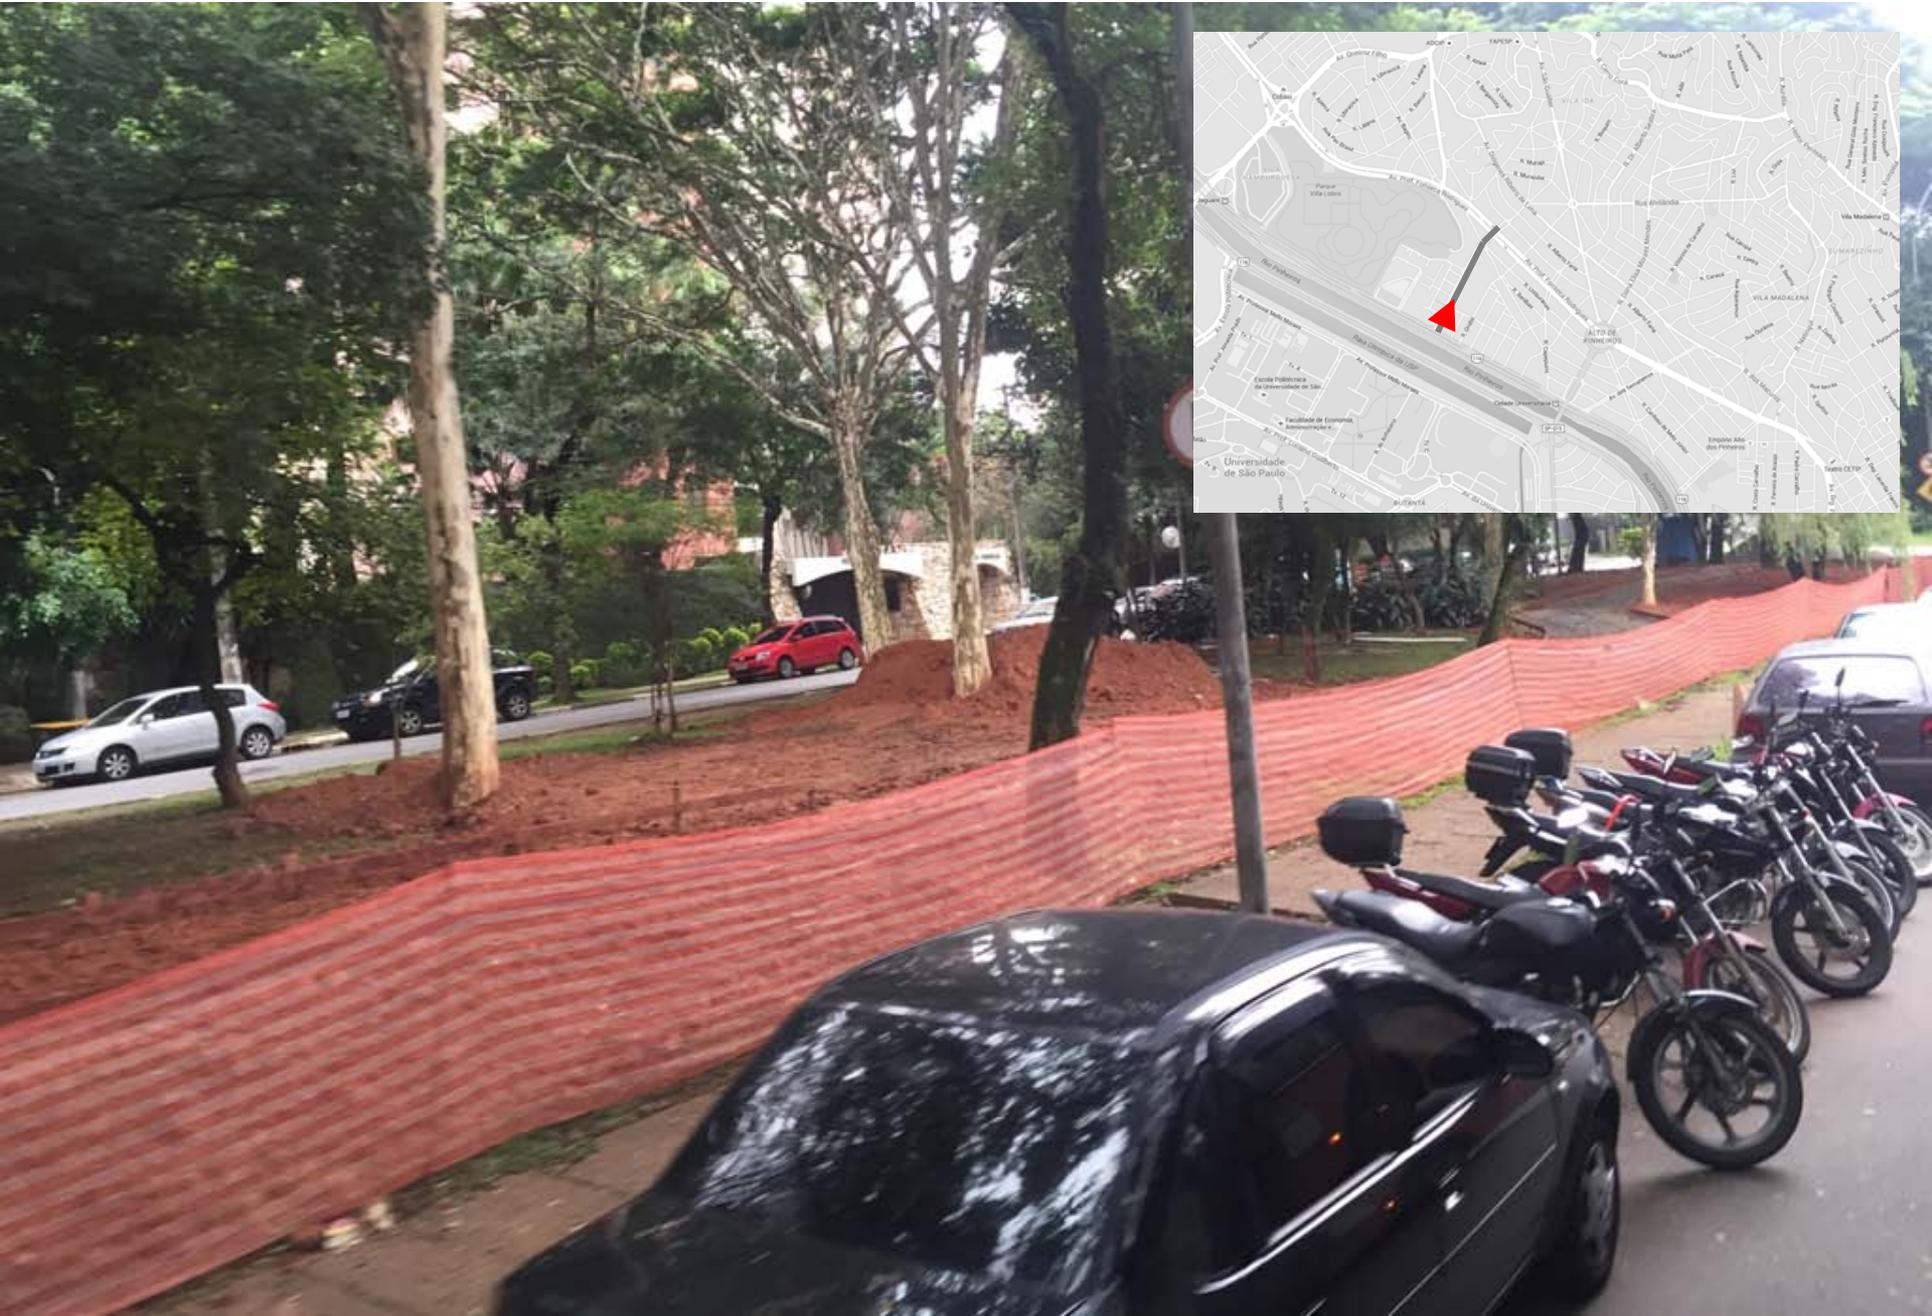

TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes




TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes

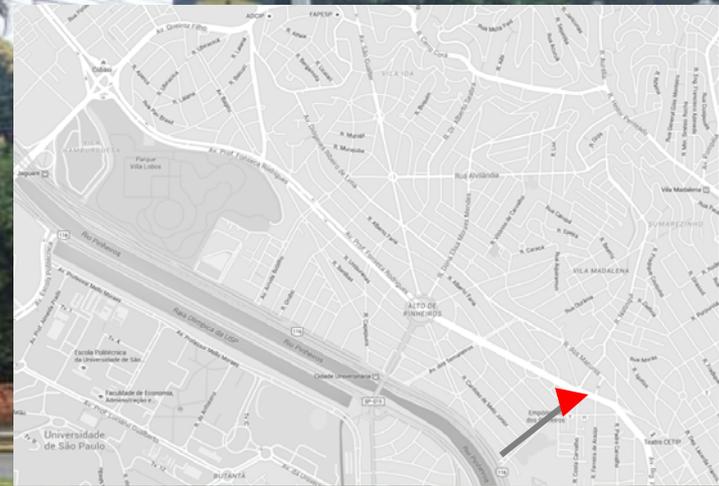

TRECHO 02 - CT08 Fonseca Rodrigues/Pedroso de Moraes



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata

CT10 Largo da Batata

Entre a Rua Pedroso de Moraes e a Rua dos Pinheiros - 1,1Km

Entre a Rua Pedroso de Moraes e Rua Gilberto Sabino - 1,2Km

Extensão: **3,3Km**

Valor de Contrato: **R\$ 8.569.508,47**

Valor Executado 2014/2015: **1.845.459,60 (21,5%)**


Valor por metro quadrado: **R\$1038,73**

Vistoria:

- Trecho da Av. Brig. Faria Lima com pavimentação finalizada, com sinalização incompleta.

- Demais trechos ainda em obras (R.Costa Carvalho até R. do Sumidouro/Av. Rebouças até R. Hungria)

TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata

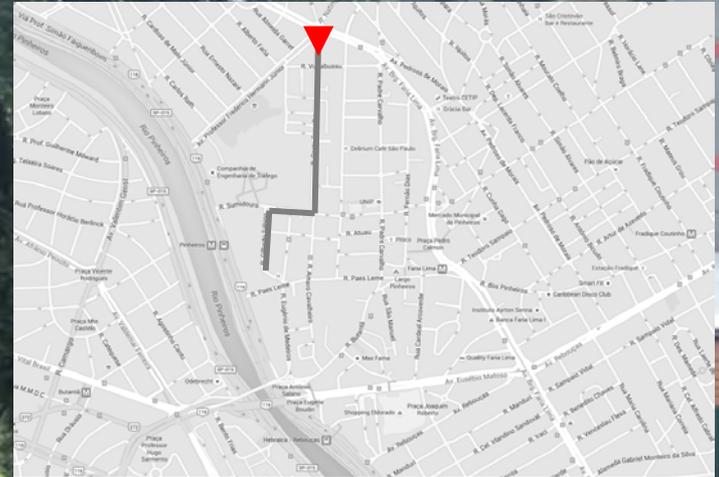

TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata




TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata




TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata

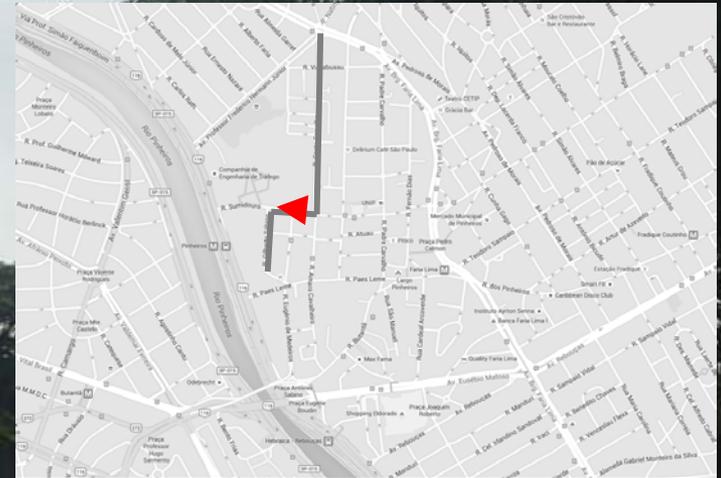

TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata

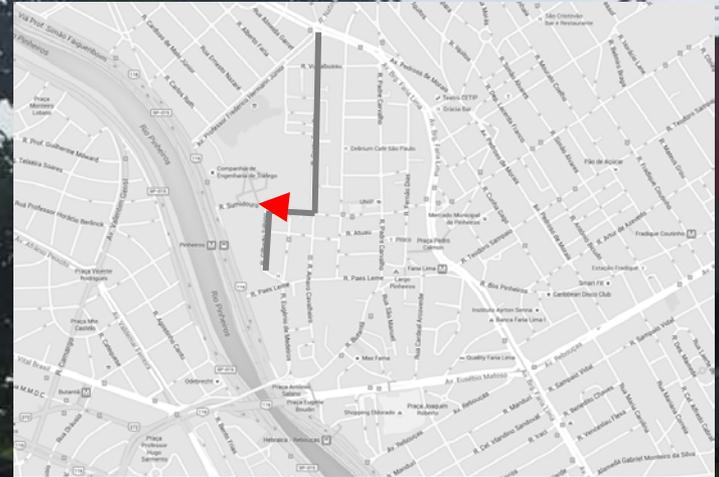

TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata




TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata

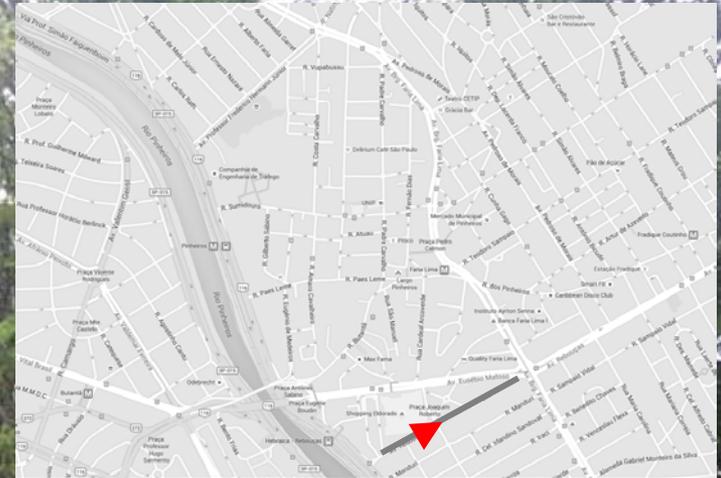

TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata




TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 03 - CT10 Largo da Batata



TRECHO 04

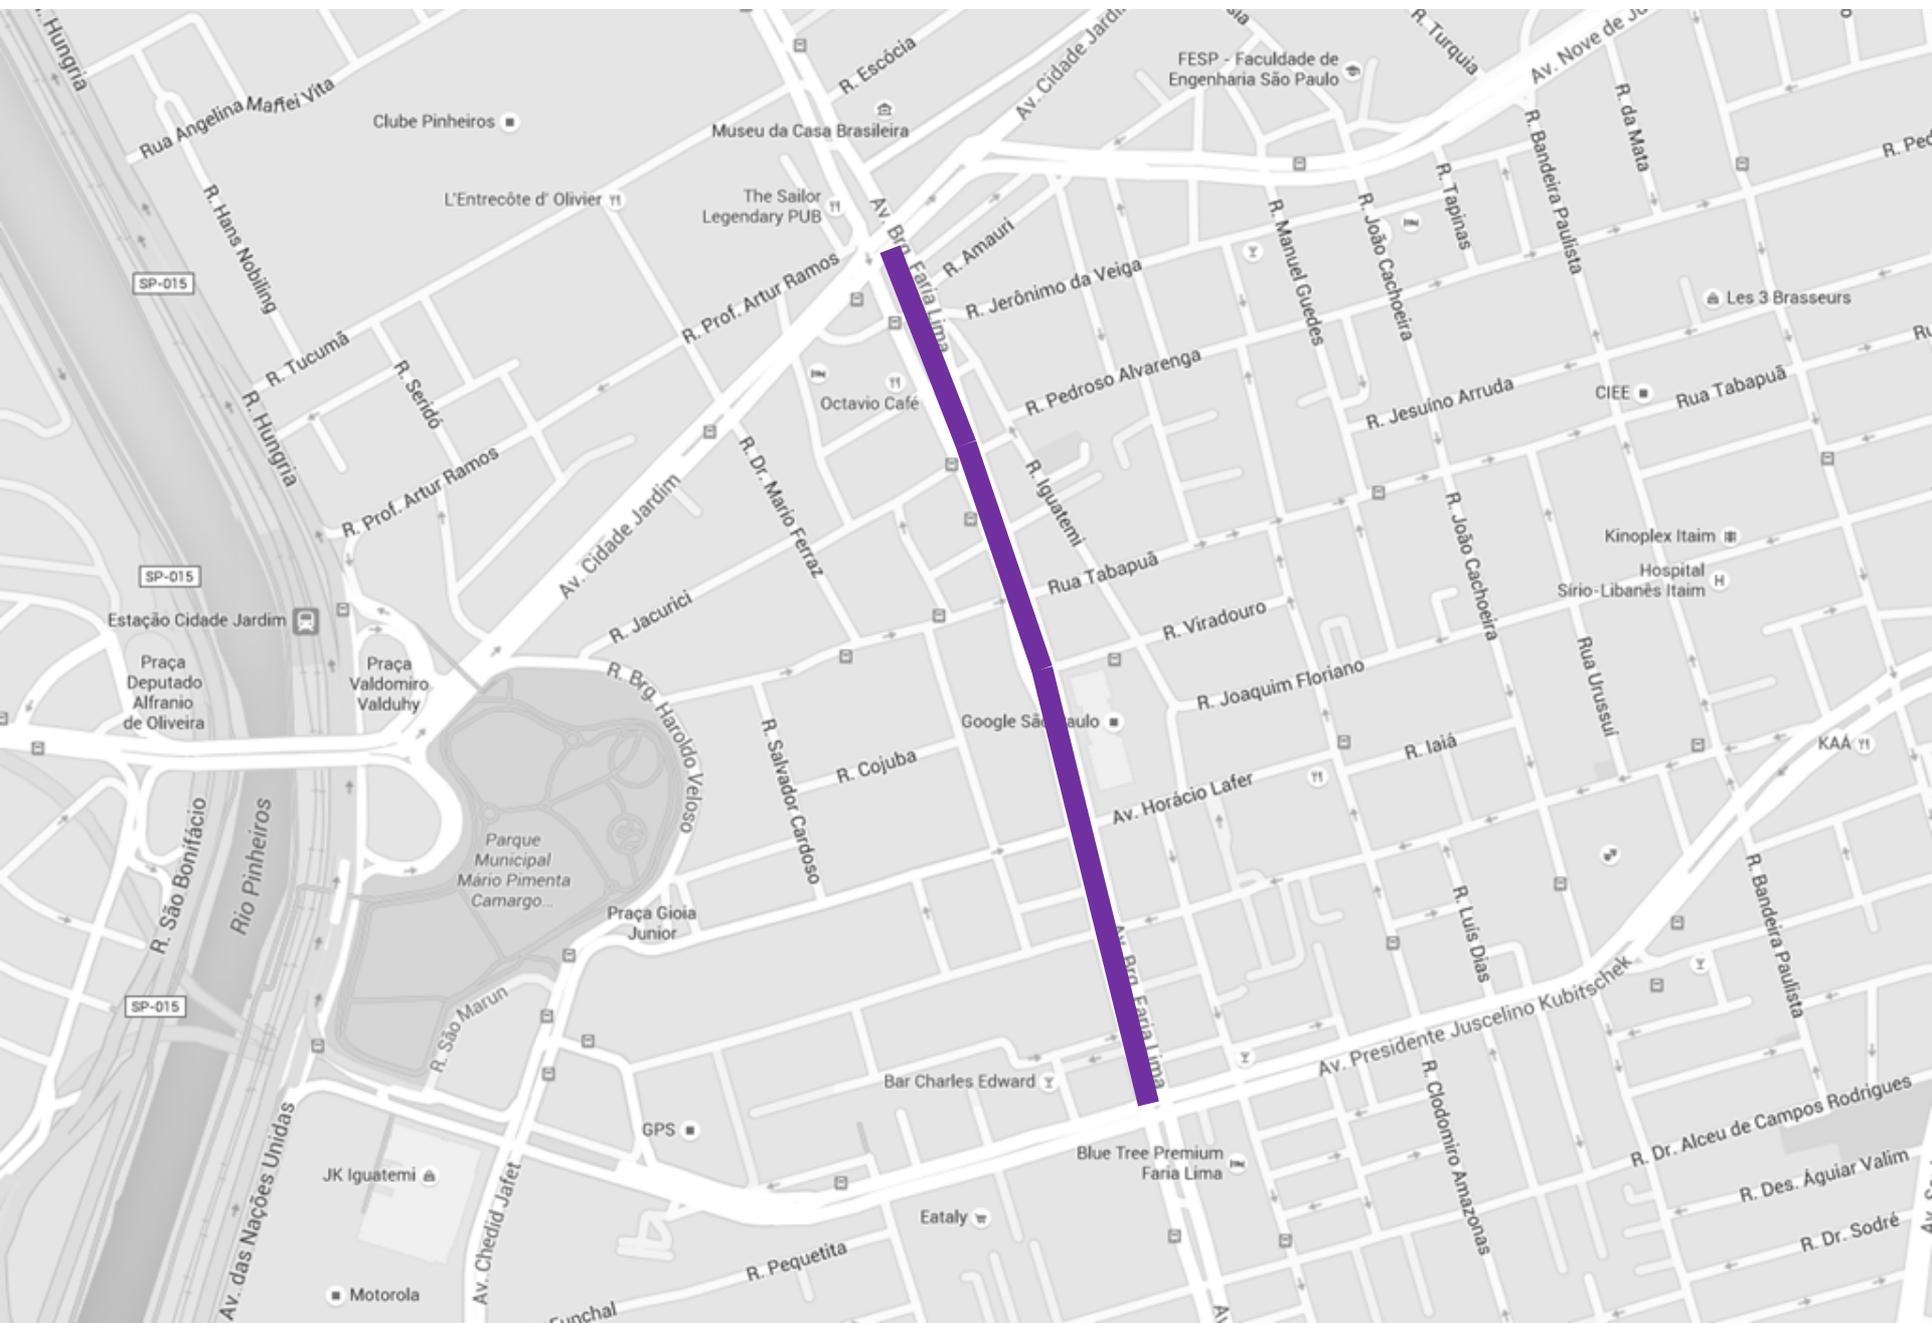

TRECHO 04 - CT09 Av. Brig. Faria Lima

CT09 Av. Brig. Faria Lima

Entre a Av. Cidade Jardim e a Av. Juscelino Kubitschek

Extensão: **1,1Km**

Valor de Contrato: **R\$ 5.770.110,93**



Valor Executado 2014/2015: **1.845.459,60 (32%)**

Valor por metro quadrado: **R\$2098,22**



Vistoria:

- Pavimentação finalizada em bom estado, ainda **SEM** sinalização.
- Adequação de travessia na Esquina da Rua Tabapuã e Av. Brig. Faria Lima.


TRECHO 04 - CT09 Av. Brig. Faria Lima

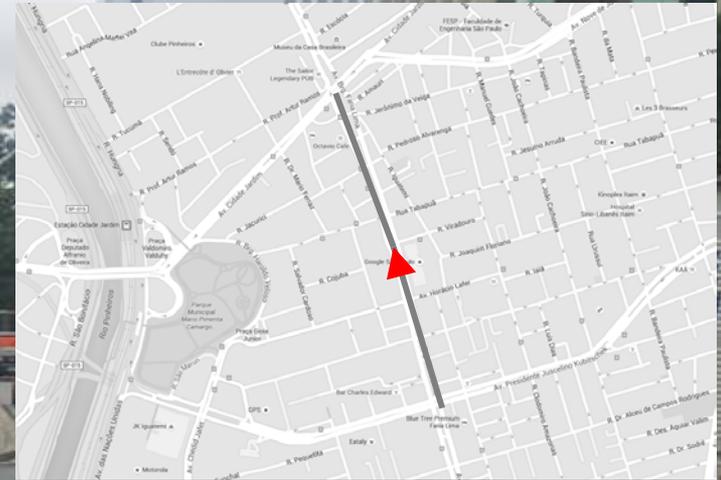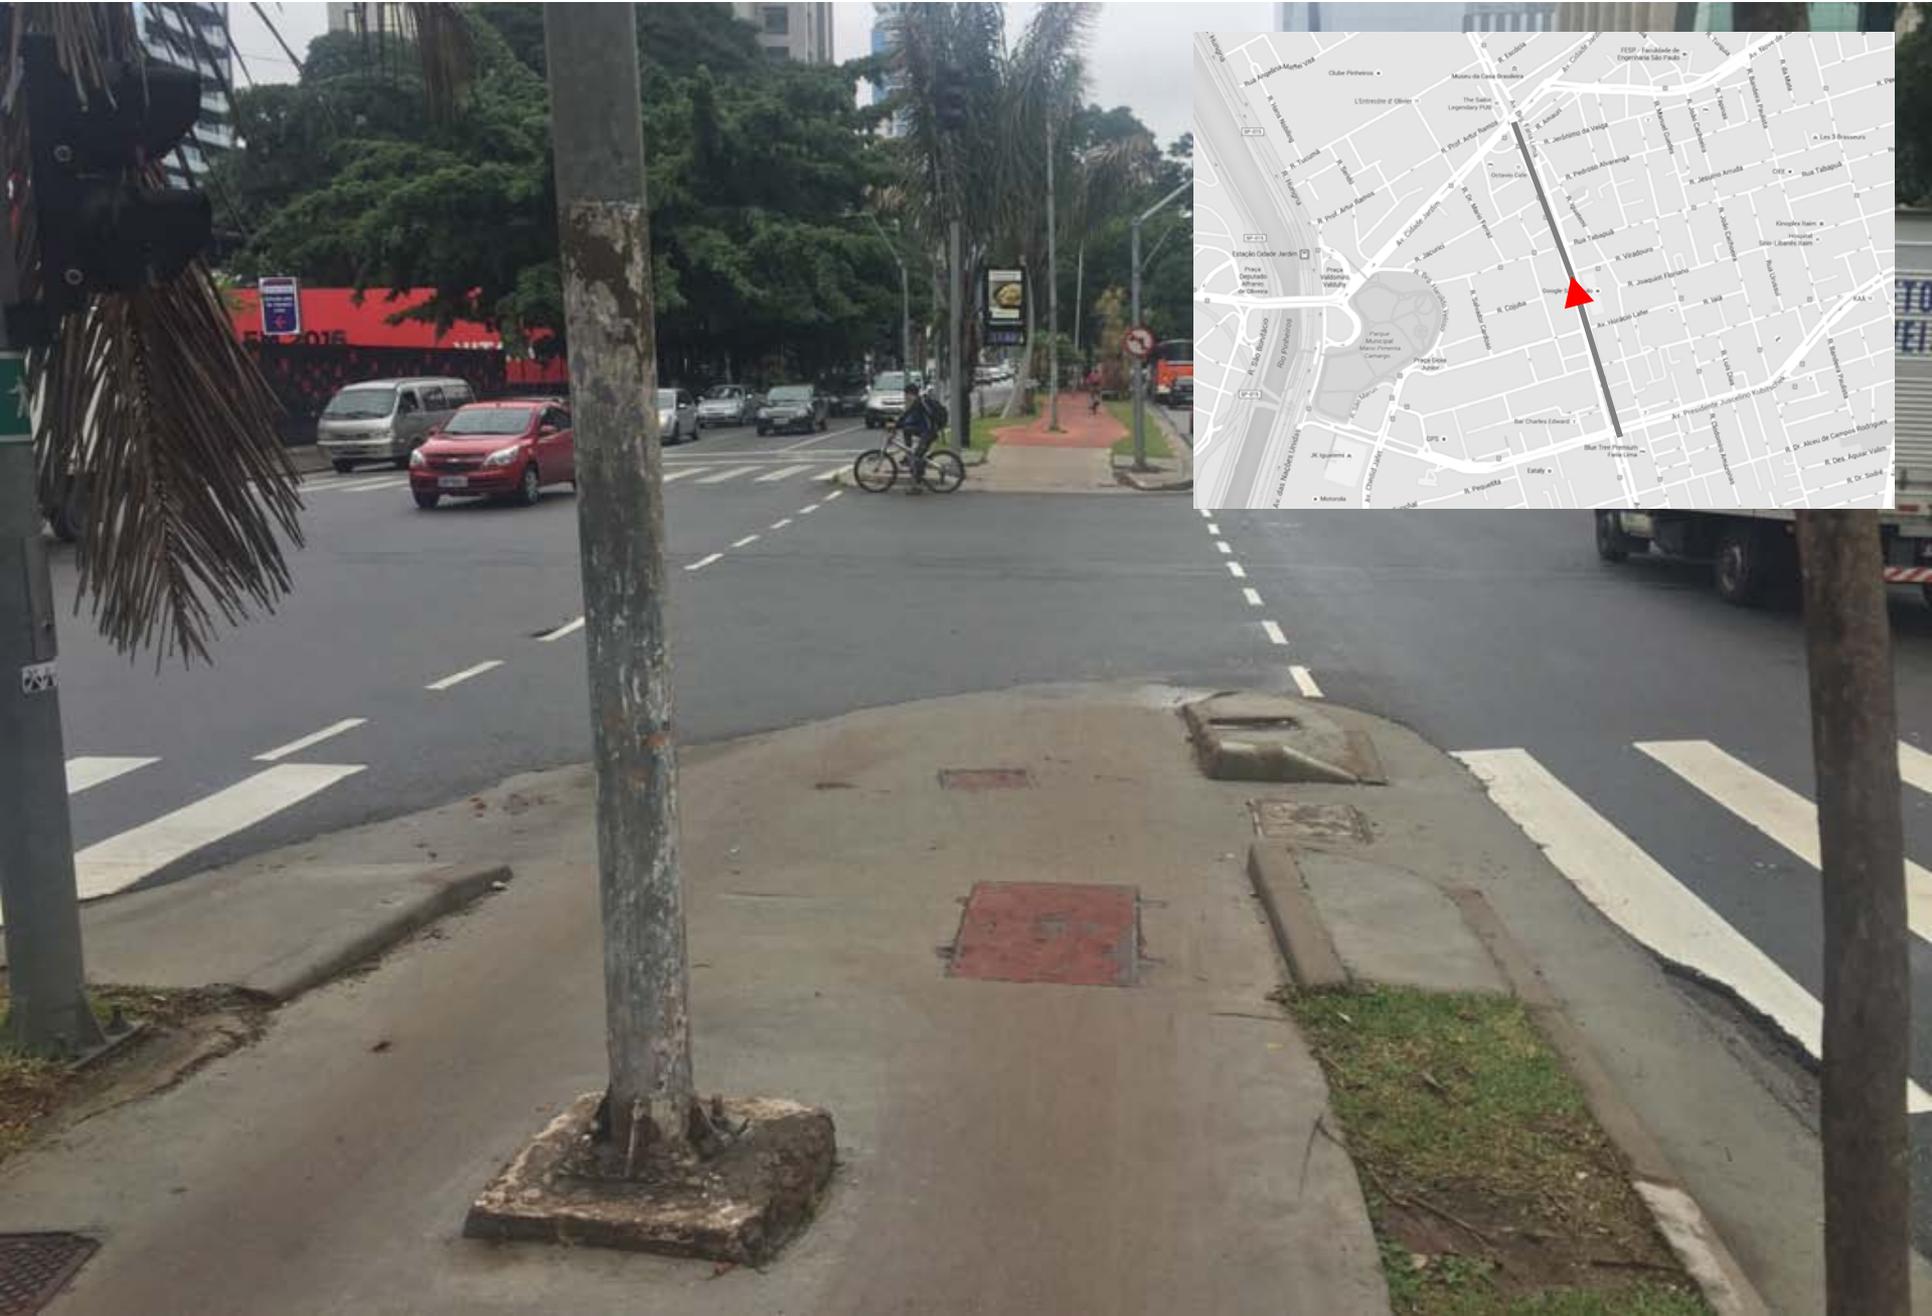


TRECHO 04 - CT09 Av. Brig. Faria Lima

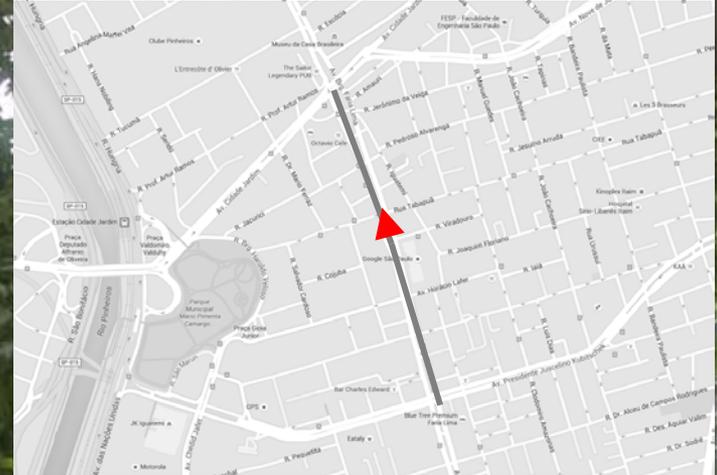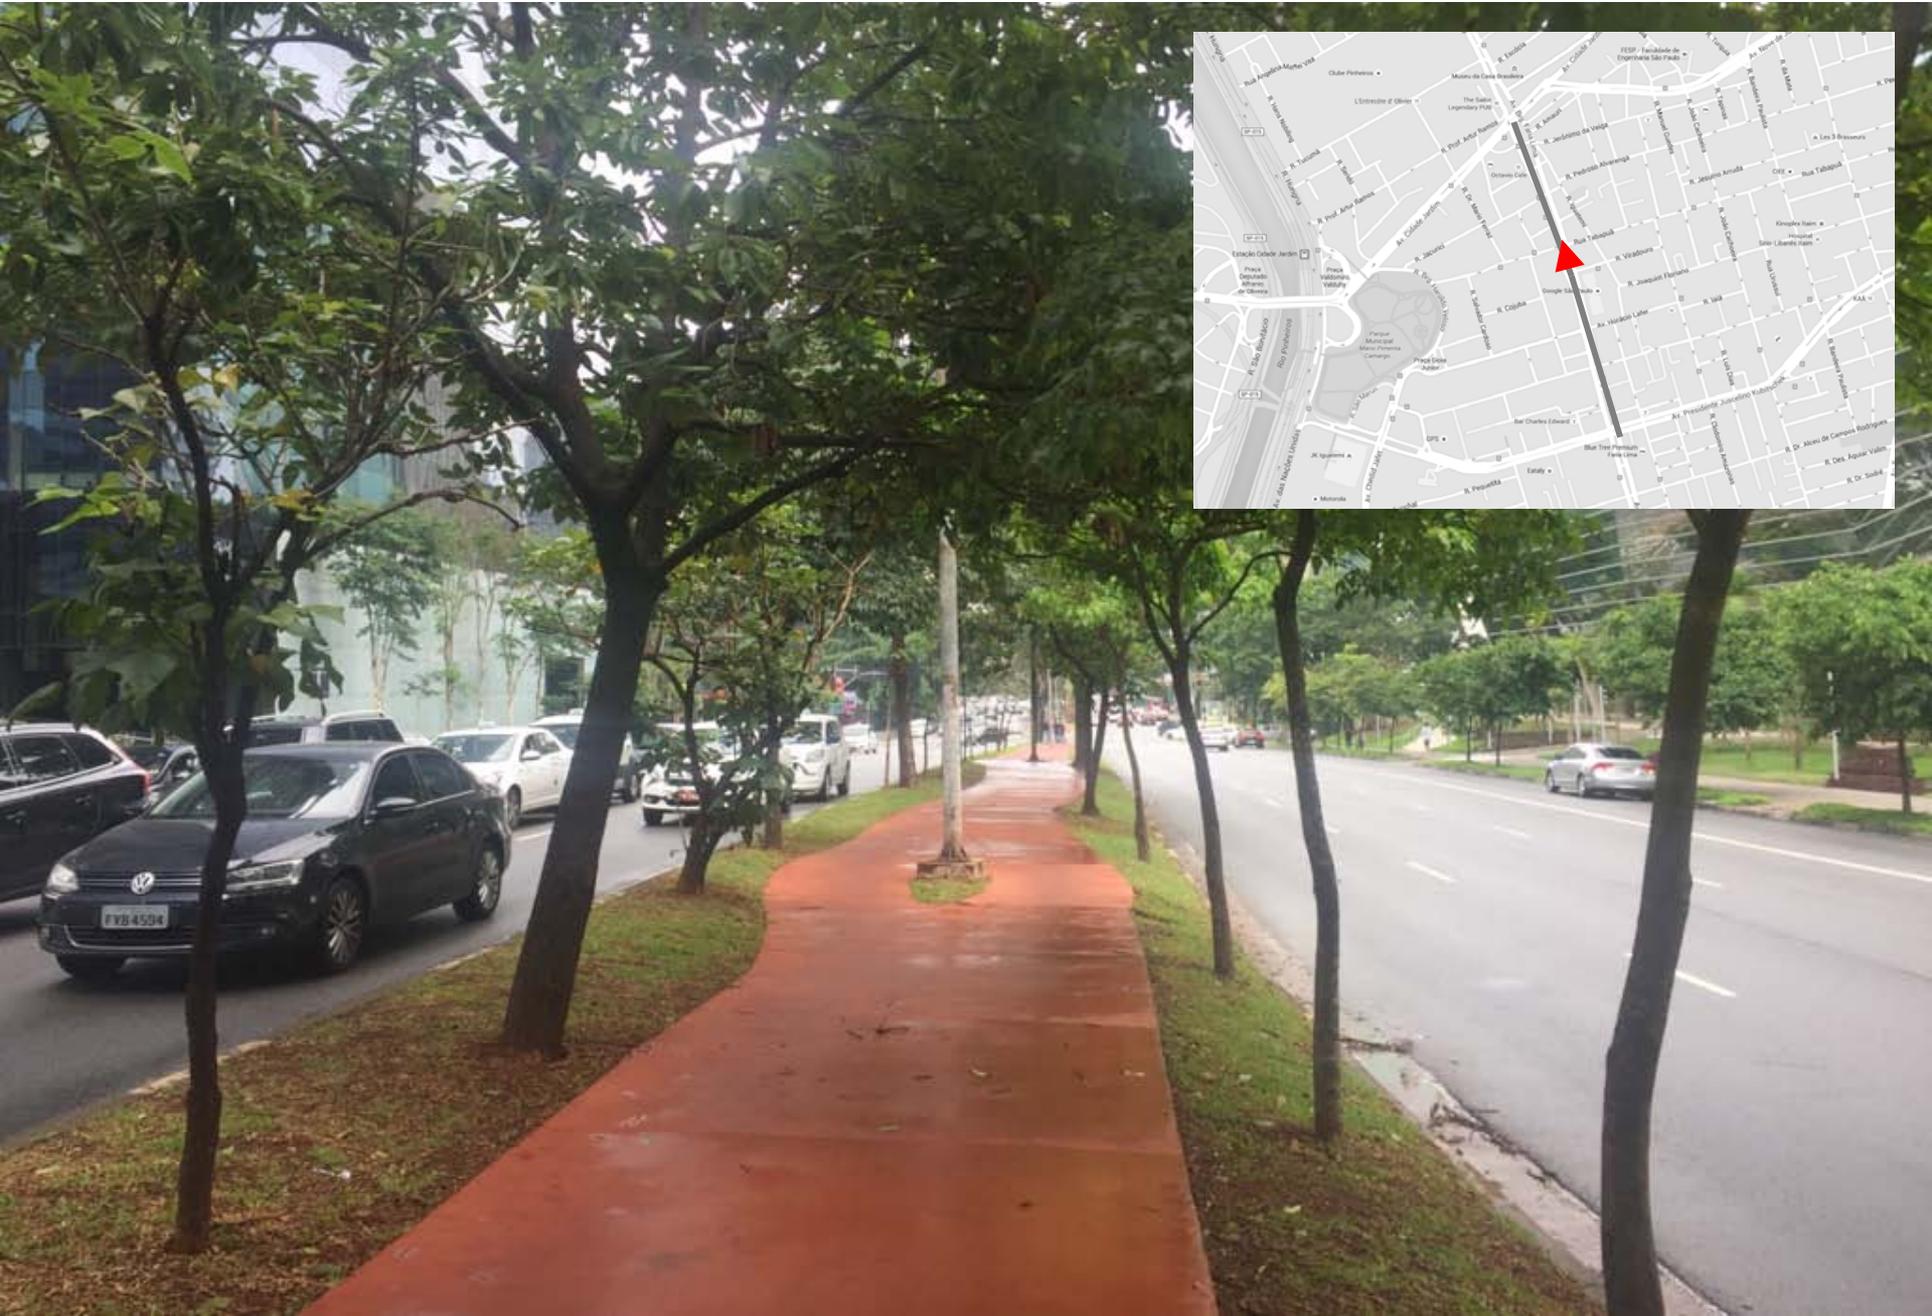


TRECHO 04 - CT09 Av. Brig. Faria Lima

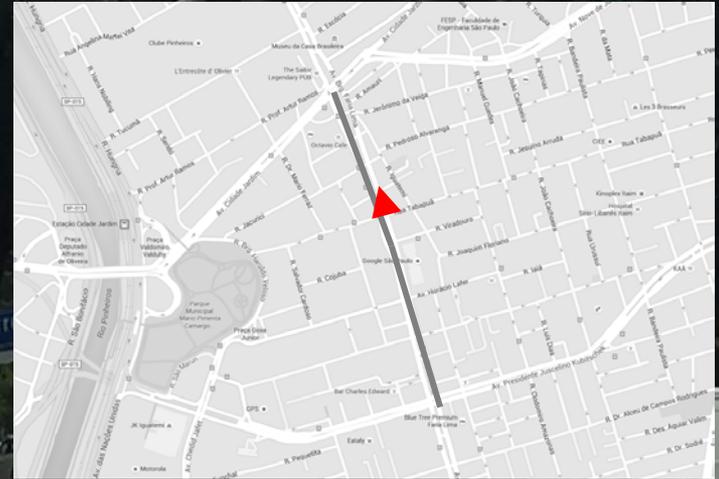

TRECHO 04 - CT09 Av. Brig. Faria Lima

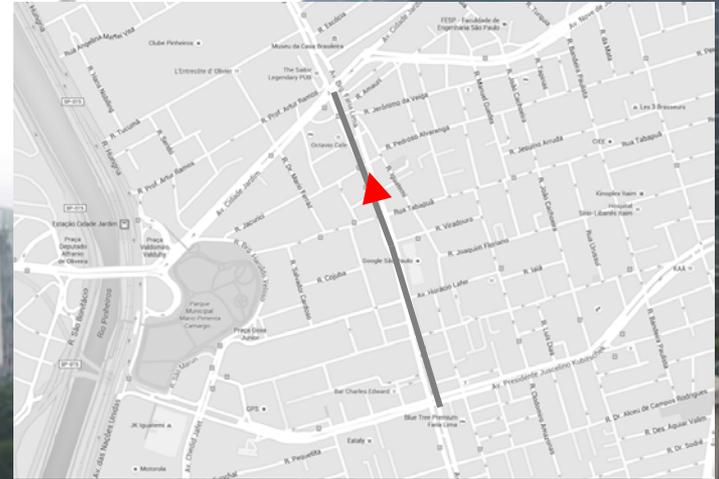

TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima

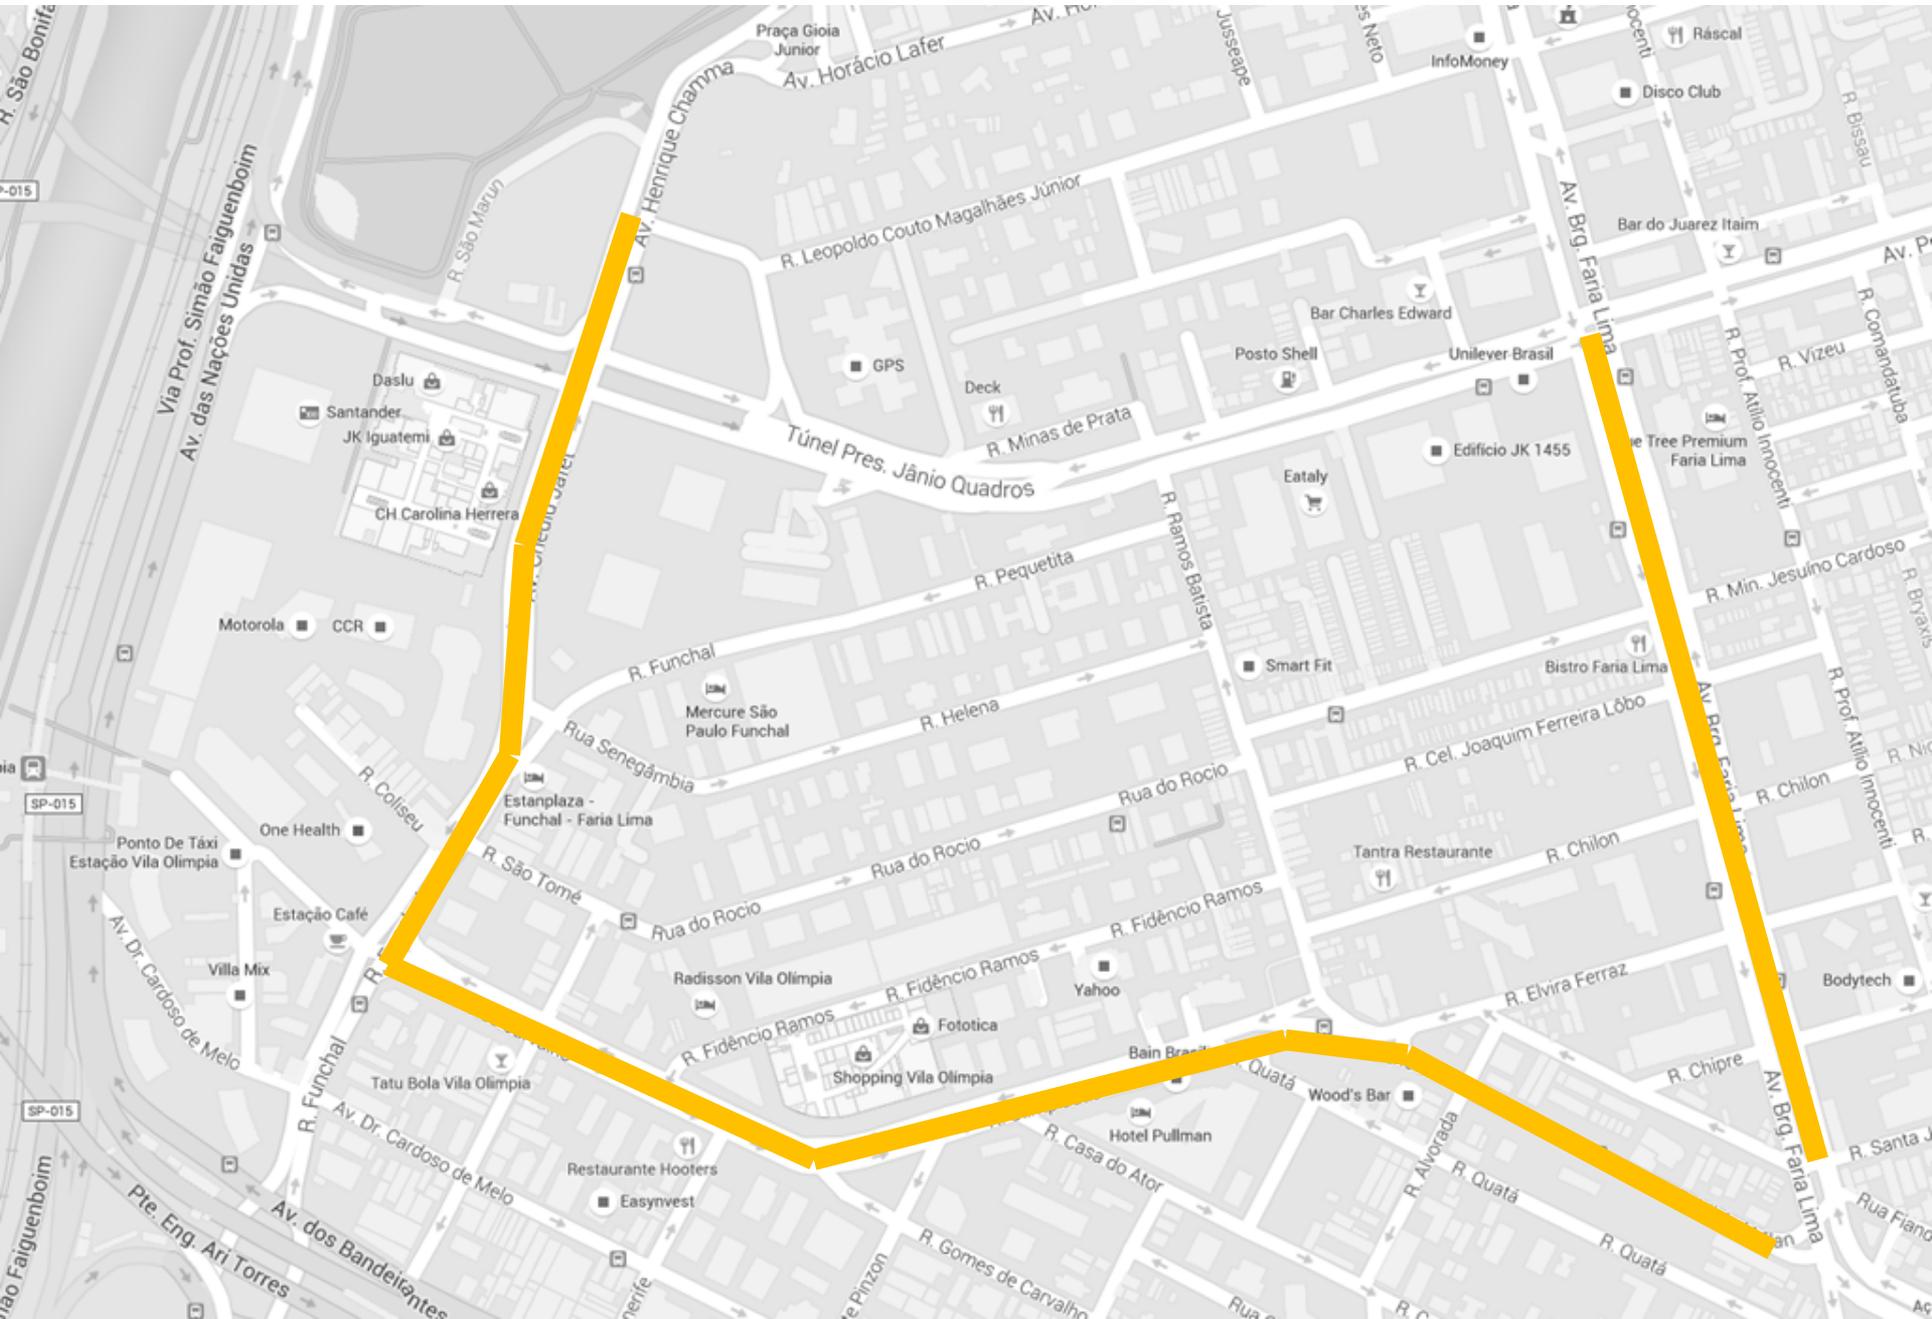

TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima

CT06 Av. Brig. Faria Lima

Entre a Av. Juscelino Kubitschek e a Av. Hélio Pellegrino – 0,67Km

Av. Henrique Chamma/Av. Chedid Jafet/R. Funchal/R. Gomes de Carvalho/R. Olimpíadas/R. Michel Milan – 1,83Km

Extensão: **2,5Km**

Valor de Contrato: **R\$ 8.202.617,93**

Valor Executado 2014/2015: **1.788.168,77 (22%)**

Valor por metro quadrado: **R\$1312,42**

Vistoria:

-Diversos pontos ainda em obra, com pavimentação incompleta.

TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima




TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima

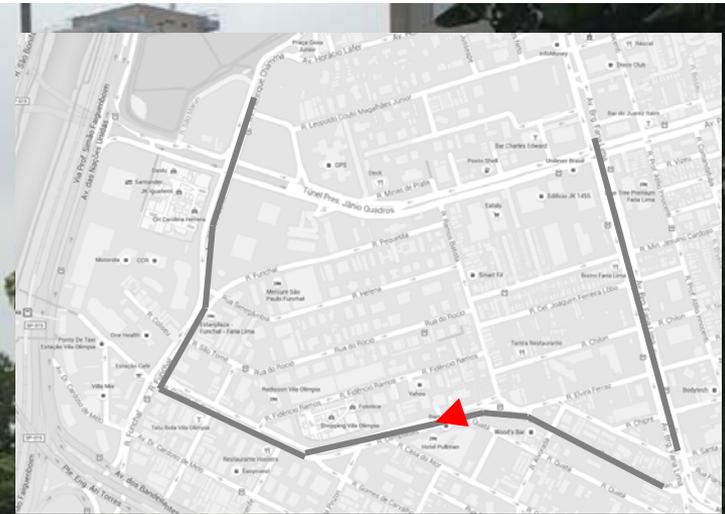


TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima

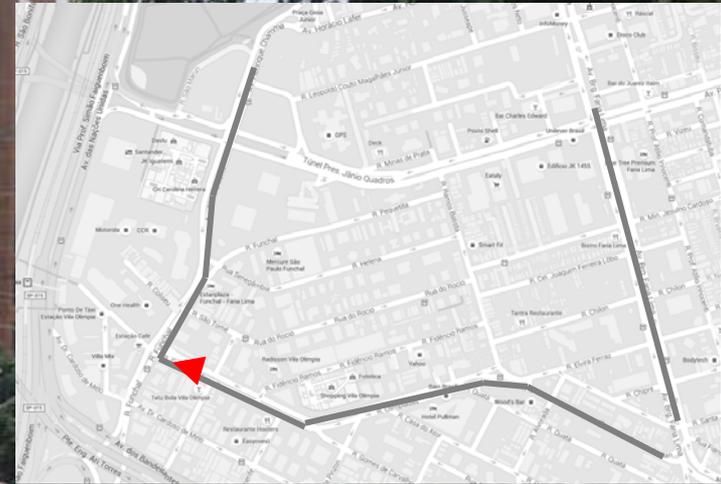

TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 05 - CT06 Av. Brig. Faria Lima



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino

CT07 Av. Hélio Pellegrino

Entre a Av. Hélio Pellegrino e a Av. República do Líbano

Extensão: **1,9Km**

Valor de Contrato: **R\$ 10.414.286,89**

Valor Executado 2014/2015: **4.551.925,47 (43%)**

Valor por metro quadrado: **R\$2192,50**


Vistoria:

-Diversos pontos ainda em obra, com pavimentação incompleta.


TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino

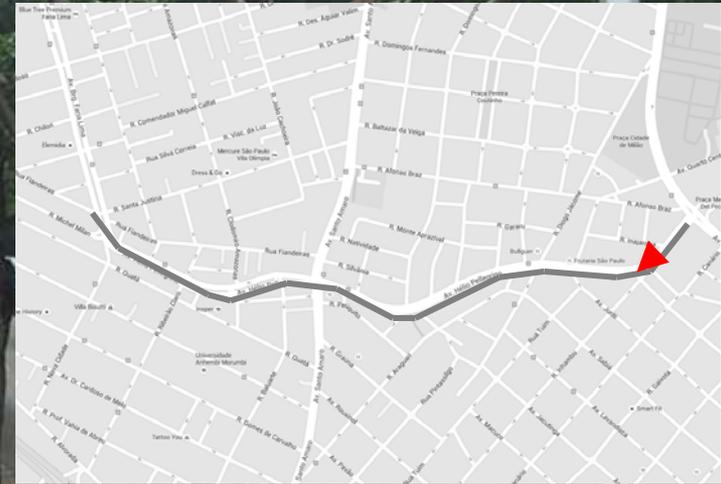

TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino

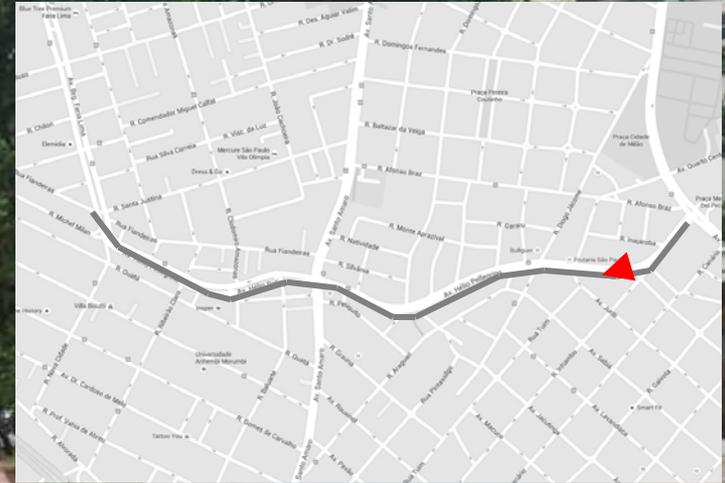


TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino

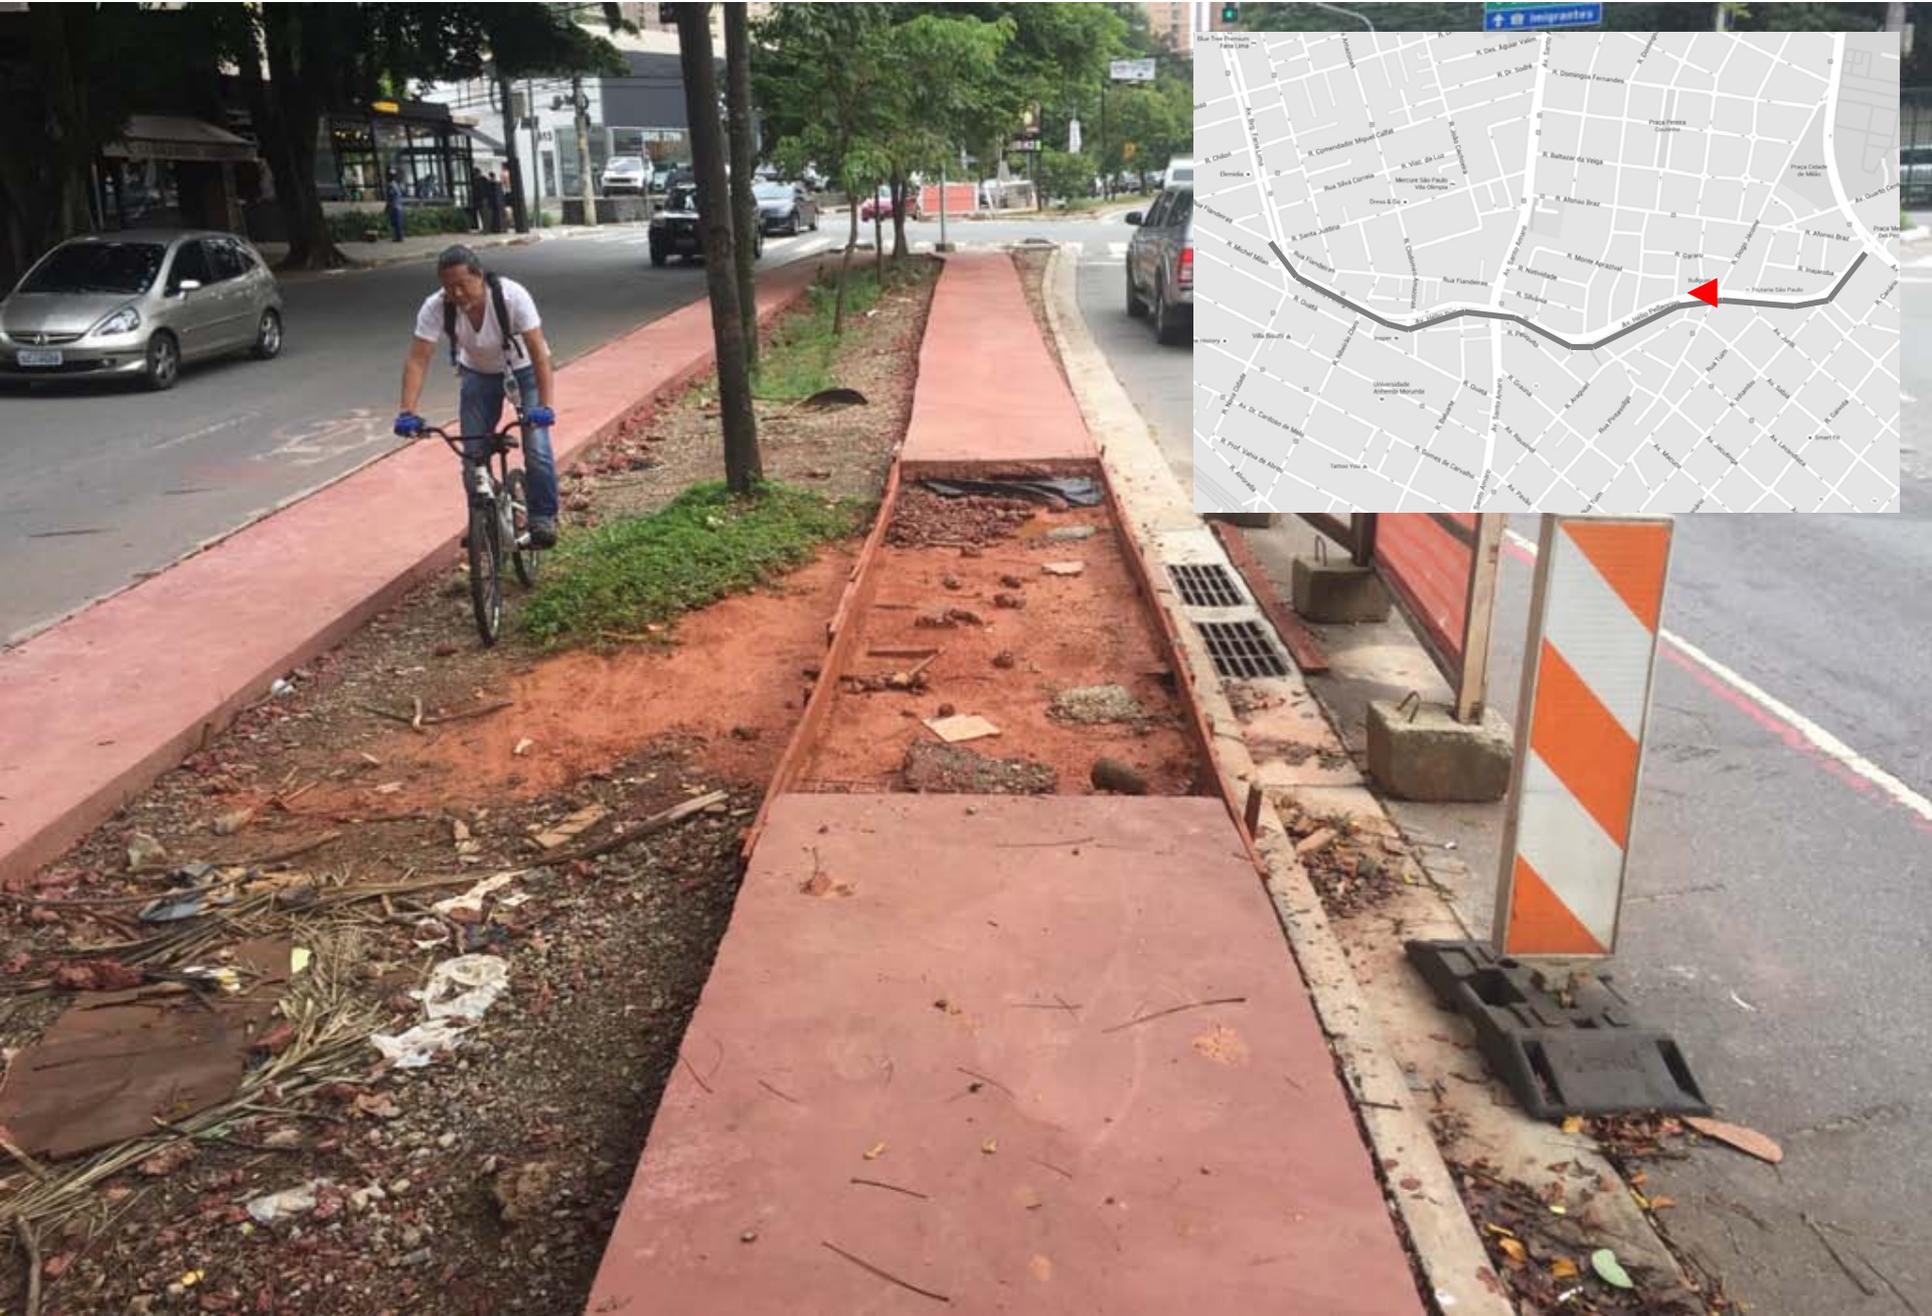

TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino




TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino



TRECHO 06 - CT07 Av. Hélio Pellegrino

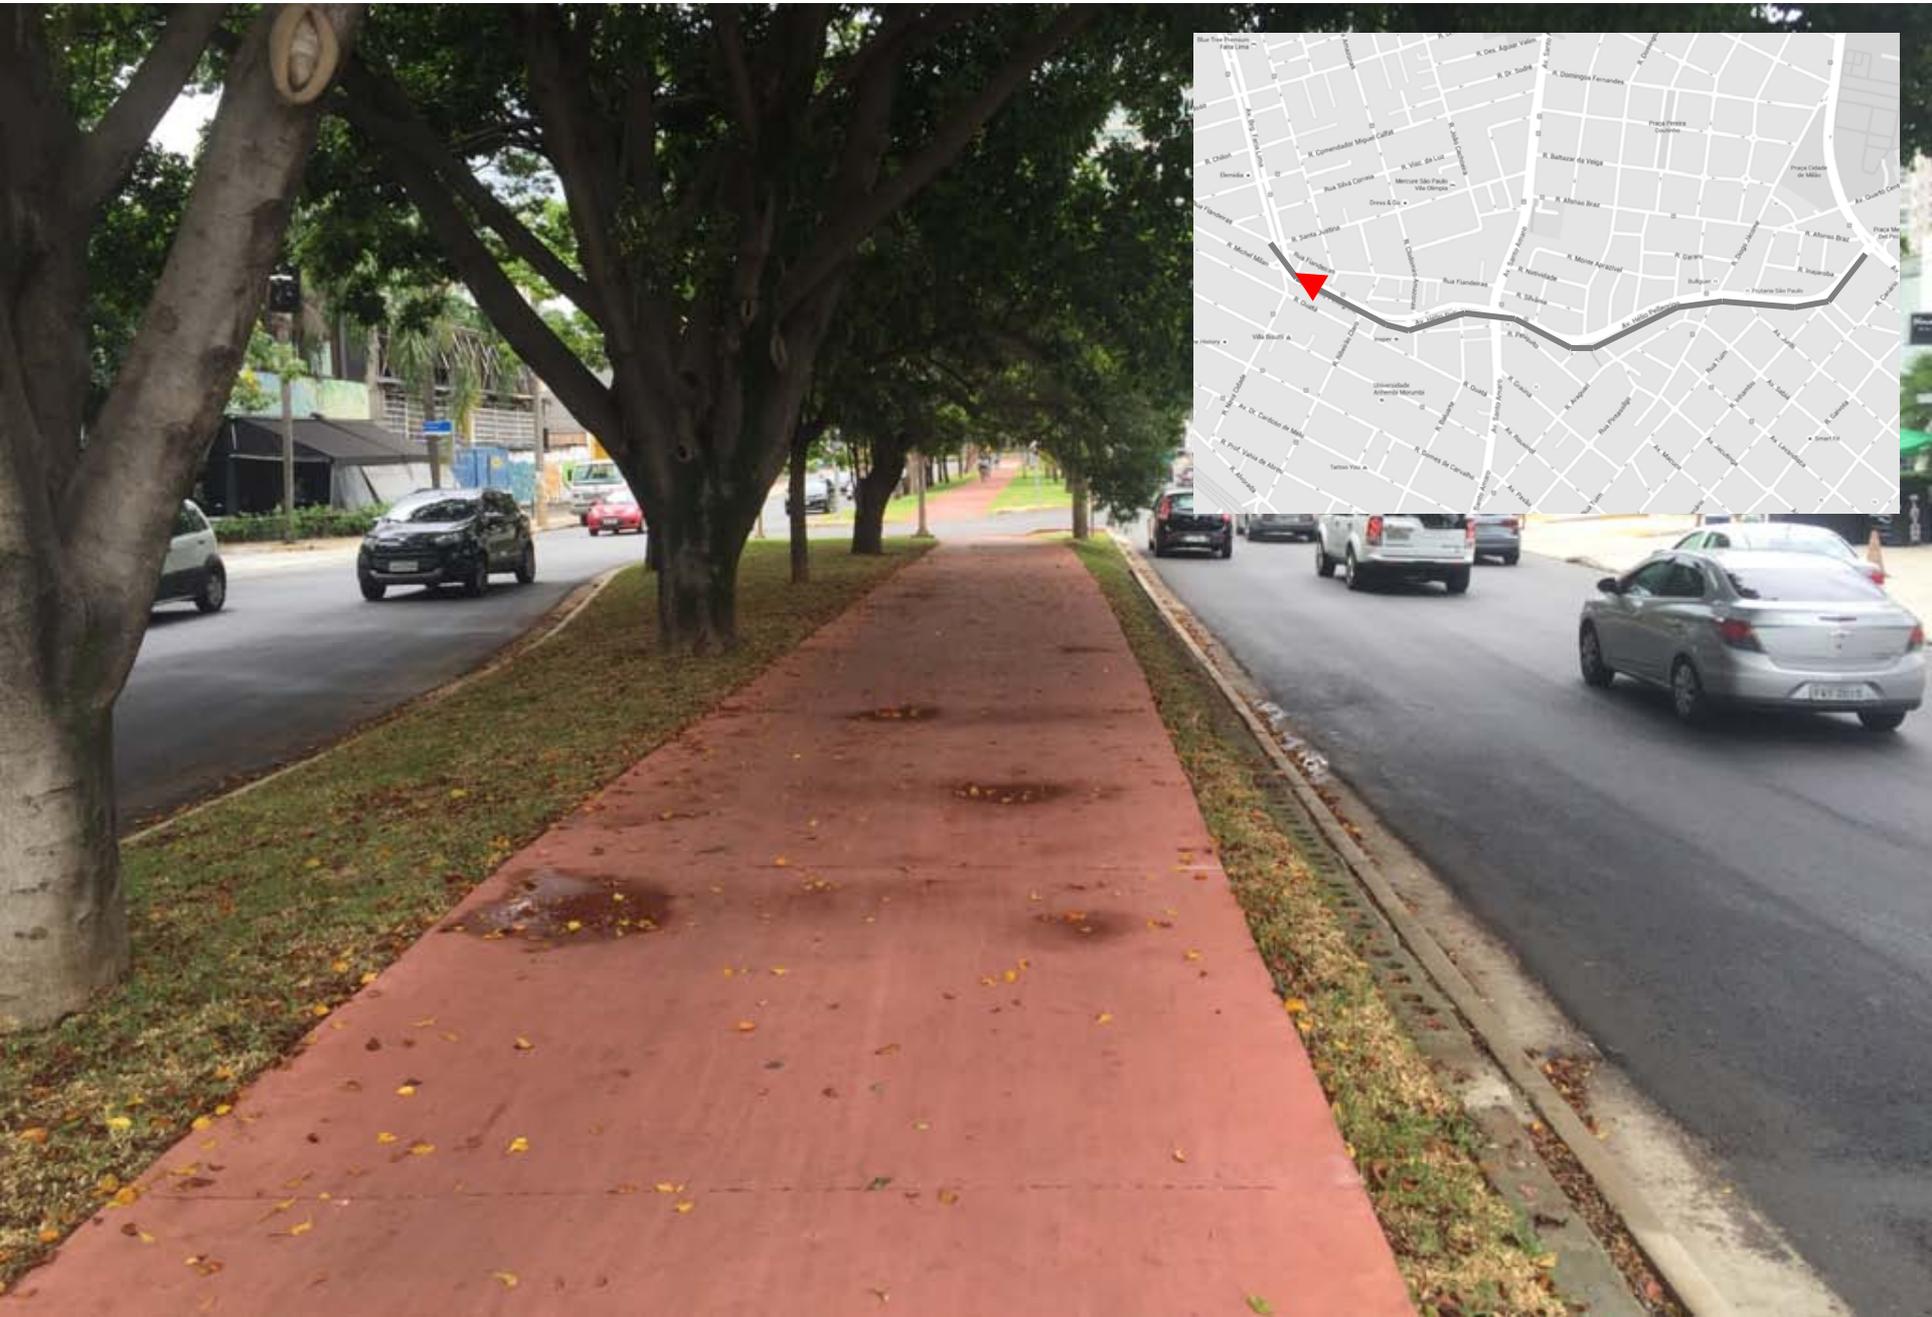

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
13 de setembro de 2016 - terça-feira 14h30
Ed. Martinelli 10º andar – sala 102
