

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2023**

## **SMSUB**

### **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

**Novembro/2023**

## Resumo Geral

ATIVIDADE	RECURSOS REMANESCENTES 2021	VALORES APROVADOS PELO FUDURB 2023	VALOR RESERVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO DE EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
Implantação e Construção de Ecopontos	R\$ 0,00	R\$ 6.332.887,85	R\$ 6.277.892,72	R\$ 7.164.414,61	R\$ 886.521,96	R\$ 2.164.450,14	R\$ 1.924.231,23
Implantação de Pátios de Compostagem	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 5.311.429,88	R\$ 5.311.429,88	R\$ 0,00	R\$ 228.670,34	R\$ 184.914,46
Implantação de Sarjetões	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias	R\$ 0,00	R\$ 15.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Implantação de PV's com Placas Pré-Moldadas	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Implantação de placas pré-moldadas no canteiro central ao longo da Av. Engº. Luis Carlos Berrini [MOB 30%]	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00	R\$ 517.364,86	R\$ 517.364,86	R\$ 0,00	R\$ 517.355,31	R\$ 517.355,31
Execução de Pavimento Rígido	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.765.404,92	R\$ 6.765.404,92
Elaboração de Projetos de Melhorias de Bairro	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Execução de Obras de Melhorias de Bairro	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 14.638.240,60	R\$ 24.572.415,64	R\$ 11.001.231,54	R\$ 10.223.019,36	R\$ 9.944.517,52
Execução de Obras de Drenagem	R\$ 0,00	R\$ 29.667.112,15	R\$ 22.597.059,57	R\$ 23.163.317,03	R\$ 566.257,46	R\$ 8.924.492,55	R\$ 8.924.492,55
Requalificação de Pistas de Skate	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição e Implantação de Brinquedos em Praças	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reforma e Acessibilidade de Passeios Públicos [MOB 30%]	R\$ 56.000.000,00	R\$ 41.978.000,00	R\$ 52.547.430,47	R\$ 53.308.087,34	R\$ 3.529.995,69	R\$ 9.481.799,54	R\$ 7.311.827,55
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 56.000.000,00</b>	<b>R\$ 114.300.000,00</b>	<b>R\$ 124.889.418,10</b>	<b>R\$ 137.037.029,36</b>	<b>R\$ 15.984.006,65</b>	<b>R\$ 40.305.192,16</b>	<b>R\$ 37.572.743,54</b>

# Implantação e Construção de Ecopontos

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Endereço:** Eco ponto 24 de Agosto – Av. 24 de Agosto

**Valor empenhado:** R\$ 1.138.674,44

**Valor liquidado:** R\$ 43.141,88

**Porcentagem:** 78%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Endereço:** Eco ponto Paulistinha – R. Moacir Gomes de Almeida

**Valor empenhado:** R\$ 793.405,60

**Valor liquidado:** R\$ 125.583,00

**Porcentagem:** 82%



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Diversas

**Objeto:** Implantação e Construção de Ecopontos

**Endereços:**

Ecoponto Vila Castelo - Rua Alessio Paolis x Rua Dr. Lauro Parente

Ecoponto Geraldo Honório - Rua Geraldo Honório da Silva, 375

**Valor empenhado:** R\$ 1.122.743,31

**Valor liquidado:** R\$ 280.237,53

**Subprefeitura:** Cidade Ademar

**Endereço:** Eco ponto Vila Castelo - Rua Alessio Paolis x Rua Dr. Lauro Parente

**Porcentagem:** Suspenso

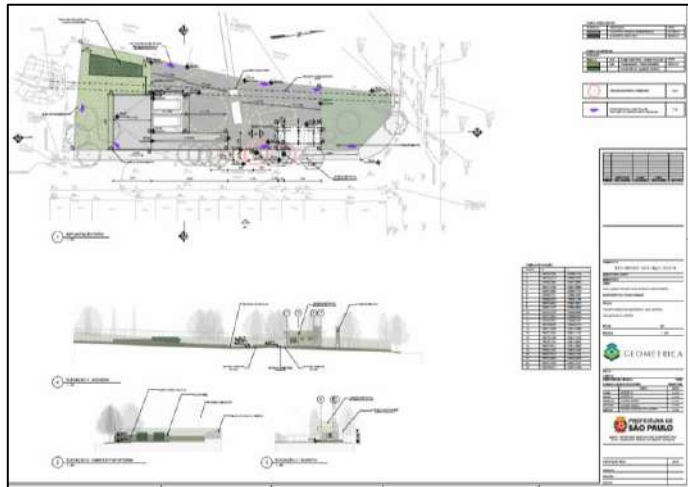


Foto tirada em dez/2022



**Subprefeitura:** Capela do Socorro

**Endereço:** Eco ponto Geraldo Honório - Rua Geraldo Honório da Silva, 375

**Porcentagem:** 95%



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em out/2023



**Subprefeitura:** Itaquera

**Endereço:** Eco ponto Vila Carmosina - Av. Francisco Tranchesesi x Av. Afonso de Sampaio Souza

**Valor empenhado:** R\$ 1.223.216,40

**Valor liquidado:** R\$ 434.270,98

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em fev/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Endereço:** Eco ponto Rubem Berta - Avenida Rubem Berta, em frente ao nº 3 -  
Indianópolis

**Valor empenhado:** R\$ 1.009.465,59

**Valor liquidado:** R\$ 432.056,45

**Porcentagem:** 95%



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023



**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Endereço:** Eco ponto São Luis - Rua Nova Tuparoquera

**Valor empenhado:** R\$ 698.372,24

**Valor liquidado:** R\$ 557.145,23

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em out/2023

**Subprefeitura:** Jaçanã/Tremembé

**Endereço:** Eco ponto Silvio Bittencourt - Rua Maria Amália de Azevedo Lopes

**Valor empenhado:** R\$ 106.736,12

**Valor liquidado:** R\$ 106.736,12

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em dez/2021



Foto tirada em fev/2023

**Subprefeitura:** Mooca

**Endereço:** Eco ponto Condessa - Av. Condessa Elizabeth de Robiano

**Valor empenhado:** R\$ 185.278,95

**Valor liquidado:** R\$ 185.278,95

**Porcentagem:** 100%

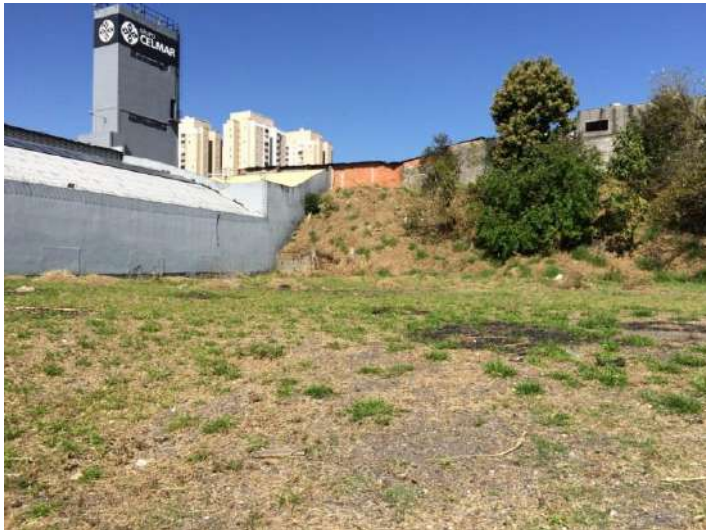


Foto tirada em ago/2022



Foto tirada em fev/2023



# Implantação de Pátios de Compostagem



**Subprefeitura:** Penha

**Endereço:** Área entre a Av. Condessa Elizabeth de Robiano e o Viaduto Domingos

Franciulli Netto

**Valor empenhado:** R\$ 2.103.575,67

**Valor liquidado:** R\$ 228.670,34

**Porcentagem:** 20%



Foto tirada em ago/2023



Projeto elaborado em nov/2022

**Subprefeitura:** Lapa

**Endereço:** Av. Alexandre Colares, 31 - Jaraguá – Lapa

**Valor empenhado:** R\$ 3.207.854,21

**Valor liquidado:** R\$ 0,00

**Porcentagem:** 0%

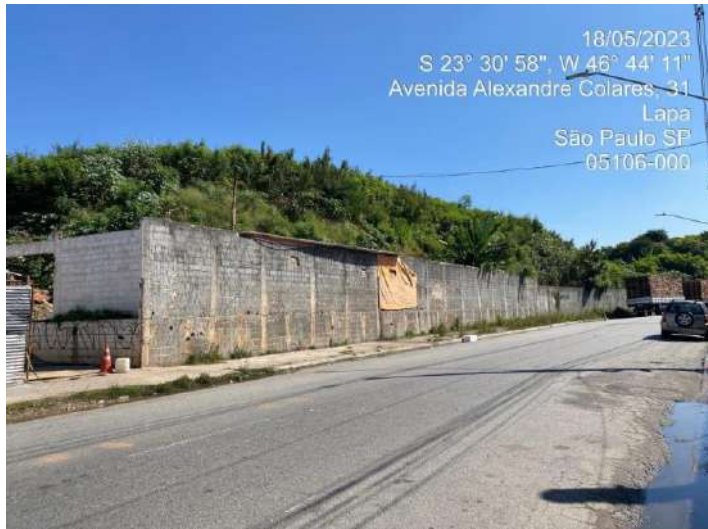


Foto tirada em mai/2023

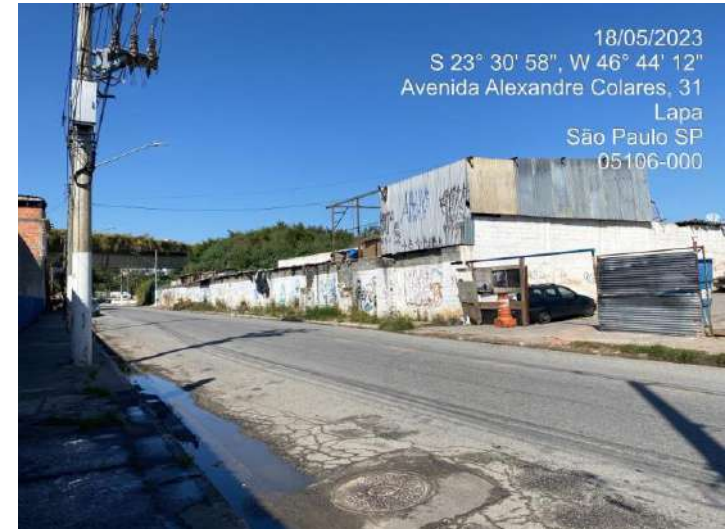


Foto tirada em mai/2023

# Pavimentação e Recapeamento de Vias

**Subprefeitura:** Diversas

**Objeto:** Pavimentação de ruas de terra- Diversos locais abrangendo a área das 32 Subprefeituras

**Endereços:** Diversos

**Valor empenhado:** R\$ 13.500.000

**Valor liquidado:** R\$ 0,00

- Listagem geral:

RUAS DE TERRA		
Lote	Subprefeitura	Logradouro
1	Butantã	R DIOGO DE CASTILHO
	Butantã	AV GETHSEMANI
	Campo Limpo	Rua Itamotinga (em frente pavilhão social)
	Campo Limpo	R. CANTO DO RIO VERDE
	Campo Limpo	R. CATARINENSE
	Campo Limpo	Rua General João Pereira de Oliveira
2	M'Boi Mirim	Estrada da Cumbica (trecho sem pavimentação asfáltica)
	Capela do Socorro	Rua Cultura Popular - Trecho II
	Capela do Socorro	Rua Unidos do Aristocrata
		Rua Particular
		Rua Cultura Popular
3	Capela do Socorro	AVENIDA TADAO INOUE
4	Itaquera	Rua Júlio Pontes
	Itaquera	Rua Keia Nakamura
	Itaquera	Zituo Karasawa

- Listagem geral:

RUAS DE TERRA		
Lote	Subprefeitura	Logradouro
5	São Mateus	Estrada da Servidão Seis
	São Mateus	Travessa Benedito Costa Gomes
	São Mateus	Rua da Engrenagem
	São Mateus	Rua Artur Pereira
6	São Mateus	Rua Morumbizinho
	São Mateus	Rua da Mina
	São Mateus	Rua da Paz
	São Mateus	Estrada Saturino Pereira
7	Sapopemba	Rua Lopes Benavides
	Sapopemba	Rua Estevão do Loreto
	São Miguel	Rua Serra do Grão Mogol
	Vila Prudente	Rua Arroio do Conde
	Vila Prudente	Rua Igarapé dos Anjos
	Vila Prudente	Rua dos Crepis
	Vila Prudente	Rua Barbeiro de Sevilha
	Ipiranga	RUA ANDRE SANDI
	Ipiranga	RUA MANOEL VIEIRA DA CUNHA
	Santo Amaro	Rua Ânfora - Jardim dos Estados
	Santo Amaro	Rua Metropolitana - Jd. Ubirajara
	Cidade Ademar	Rua Vicente Martin Soler
	Cidade Ademar	Rua dos Chorões
8	Jaçanã/ Tremembé	RUA VILA DE AROUCA
	Jaçanã/ Tremembé	EST. PROFESSOR EDMUNDO ROSSET
9	Lapa	RUA F (JAGUARA-JRE)
	Casa Verde	Rua Oliveira Martins
	Casa Verde	Rua Jornalista Octávio Ribeiro
	Freguesia/Brasilândia	R Roca Sales
	Freguesia/Brasilândia	Rua Angelo Anzolino
	Vila Maria/ Vila Guilherme	Rua Izidoro Ortiz
	Vila Maria/ Vila Guilherme	Rua Pedranópolis
	Vila Maria/ Vila Guilherme	Av. Joaquim dos Santos Domingues
	Vila Maria/ Vila Guilherme	Rua Bicicleta
	Mooca	Rua 2 (Trav. da R.João Bizarro da Nave, 313)
Mooca	Travessa Eng <sup>o</sup> Cestari	



**Subprefeituras:** Butantã e Campo Limpo

**Objeto:** Pavimentação de ruas de terra – Lote 1

**Valor empenhado:** R\$ 4.410.044,24

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em mai/2023

**Subprefeituras:** M'Boi Mirim e Capela do Socorro

**Objeto:** Pavimentação de ruas de terra – Lote 2

**Valor empenhado:** R\$ 5.338.725,79

**Valor liquidado:** R\$ 0,00

SUB-CS



Foto tirada em out/2023

SUB-CS



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Pavimentação de ruas de terra – Lote 5

**Valor empenhado:** R\$ 3.751.229,97

**Valor liquidado:** R\$ 0,00

SUB-SM



Foto tirada em out/2023

SUB-SM



Foto tirada em out/2023

**Implantação de placas pré-moldadas no canteiro  
central ao longo da Av. Eng<sup>o</sup>. Luis Carlos Berrini  
[MOB 30%]**



**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Implantação de placas pré-moldadas em módulos tipo tampão removível no canteiro central

**Endereço:** Canteiro Central da Av. Eng<sup>o</sup>. Luis Carlos Berrini

**Valor empenhado:** R\$ 517.364,86

**Valor liquidado:** R\$ 517.355,31

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em out/2022

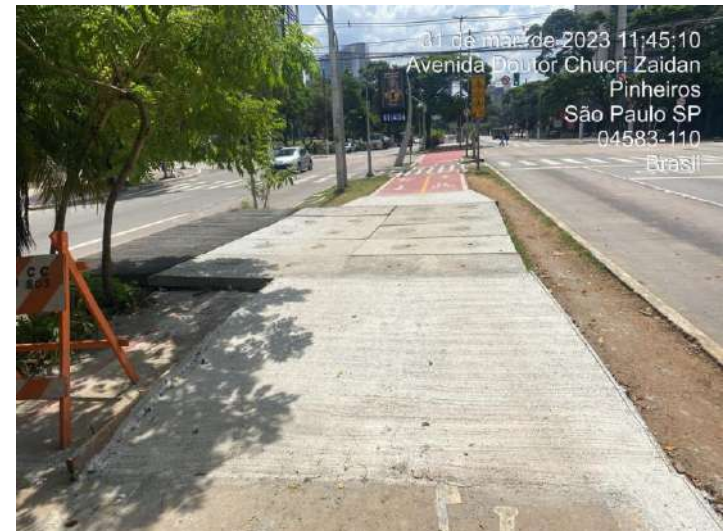


Foto tirada em mar/2023

**Subprefeitura:** Diversas

**Objeto:** Execução de Pavimento Rígido

**Endereços:** Complexo Viário Ayrton Senna

Túnel Euryclides de Jesus Zerbini

**Valor empenhado:** R\$ 1.869.448,55

**Valor liquidado:** R\$ 1.134.853,47



**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Complexo Viário Ayrton Senna

**Porcentagem:** 50%



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Túnel Euryclides de Jesus Zerbini

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em mai/2023

**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Complexo Viário Maria Maluf

**Valor empenhado:** R\$ 1.550.269,55

**Valor liquidado:** R\$ 1.550.269,55

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em fev/2023



Foto tirada em ago/2023



**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Túnel Fernando Vieira de Melo

**Valor empenhado:** R\$ 2.689.304,64

**Valor liquidado:** R\$ 2.689.304,64

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em jun/2023

**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Túnel Tribunal de Justiça

**Valor empenhado:** R\$ 1.390.977,26

**Valor liquidado:** R\$ 1.390.977,26

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2023



Foto tirada em jun/2023

# Melhorias de Bairro



**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Revitalização da Praça da Primeira Infância

**Endereço:** Praça São Sebastião, Av. Presidente Tancredo Neves x R. Fosca

**Valor empenhado:** R\$ 457.721,85

**Valor liquidado:** R\$ 457.721,85

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em mai/2023

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Revitalização da Praça da Primeira Infância

**Endereço:** Av. Botuquara, s/n - Bosque da Saúde

**Valor empenhado:** R\$ 3.812.999,54

**Valor liquidado:** R\$ 632.353,95

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em ago/2023

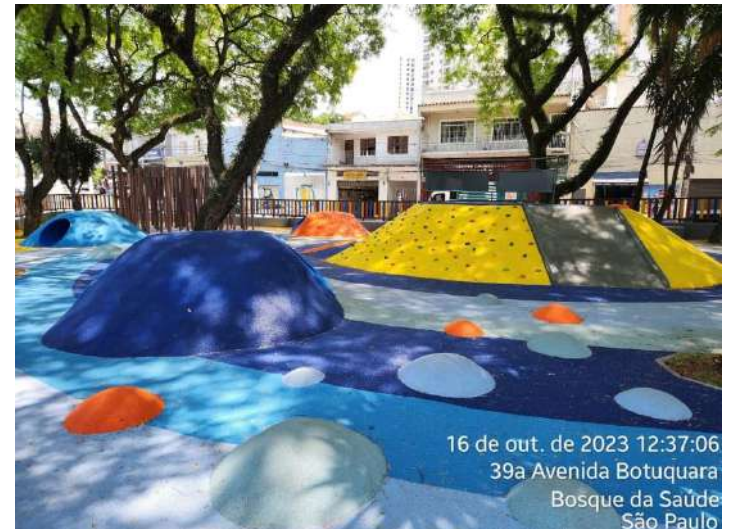


Foto tirada em out/2023

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Asa Branca”

**Endereço:** Ruas Ave de Prata x Milagre dos Peixes x Bandeira do Divino e Sara Kubitschek

**Valor empenhado:** R\$ 1.430.578,79

**Valor liquidado:** R\$ 1.430.578,79

**Porcentagem:** 100%



23 de mar. de 2023 15:41:32

Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em ago/2023



**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Beija-flor”

**Endereço:** Alças de acesso ao Viaduto Min. Aliomar Baleeiro

**Valor empenhado:** R\$ 472.041,58

**Valor liquidado:** R\$ 472.041,58

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em ago/2023

**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Periquito”

**Endereço:** Alça de Acesso da Ponte das Bandeiras para a Av. Marginal Tietê

**Valor empenhado:** R\$ 380.316,42

**Valor liquidado:** R\$ 380.316,42

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em jul/2023



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Do Tuim”

**Endereço:** Alça de Acesso da Av. Marginal Tietê para da a Ponte das Bandeiras

**Valor empenhado:** R\$ 330.931,89

**Valor liquidado:** R\$ 330.931,89

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em jul/2023



**Subprefeitura:** Santana/Tucuruvi

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Cambacica”

**Endereço:** Alça da ponte das Bandeiras / Praça Airton de Abreu

**Valor empenhado:** R\$ 1.103.503,16

**Valor liquidado:** R\$ 1.103.503,16

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em agoi/2023

**Subprefeitura:** Santana/Tucuruvi

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Curruira”

**Endereço:** Alça da ponte Cruzeiro do Sul / próx. Terminal Tietê, sentido Av. Morvan Dias de Figueiredo

**Valor empenhado:** R\$ 1.324.811,44

**Valor liquidado:** R\$ 1.324.811,44

**Porcentagem:** 100%

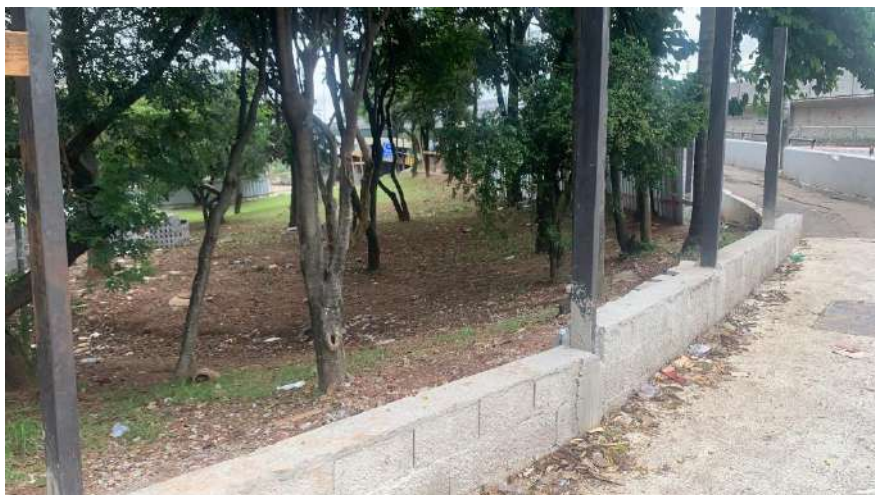


Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em ago/2023



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Curicaca”

**Endereço:** Alça da Ponte do Cruzeiro do Sul / próximo ao Shopping D, sentido  
Estação Tietê

**Valor empenhado:** R\$ 1.786.202,43

**Valor liquidado:** R\$ 1.786.202,43

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em jul/2023

**Subprefeitura:** Mooca

**Objeto:** Implantação do Bosque Urbano “Da Garça”

**Endereço:** Alça ponte Cruzeiro do Sul / próximo à igreja da Graça de Deus

Sentido Av. do Estado

**Valor empenhado:** R\$ 2.186.544,14

**Valor liquidado:** R\$ 2.186.544,14

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em jul/2023

**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Objeto:** Revitalização de Escadões

**Endereços:**

Rua Bruno Valter, 117

Rua Ângelo Tarchi, 418

Rua Bernardo Clavijo, 222

Rua Ana Lúcia de Amicis, 209

Rua Benjamin Cosin, 5A

**Valor empenhado:** R\$ 118.014,04

**Valor liquidado:** R\$ 118.013,71



**Subprefeitura: M'Boi Mirim**

**Endereço: Rua Bruno Valter, 117**

**Porcentagem: 100%**




Foto tirada em dez/2022

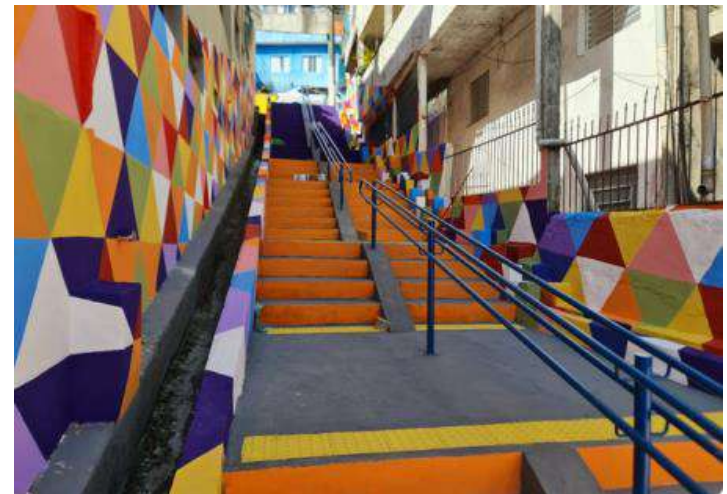


Foto tirada em fev/2023



**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Endereço:** Rua Ângelo Tarchi, 418

**Porcentagem:** 100%




Foto tirada em dez/2022



Foto tirada em fev/2023

**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Endereço:** Bernardo Clavijo, 222

**Porcentagem:** 100%

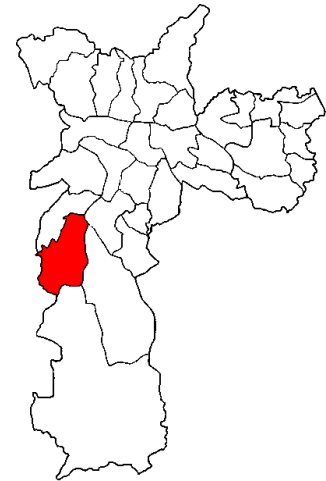


Foto tirada em dez/2022



Foto tirada em fev/2023

**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Endereço:** Rua Ana Lúcia de Amicis, 209

**Porcentagem:** 100%




Foto tirada em dez/2022



Foto tirada em fev/2023



**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Endereço:** Rua Benjamin Cosin, 5A

**Porcentagem:** 100%




Foto tirada em jan/2023

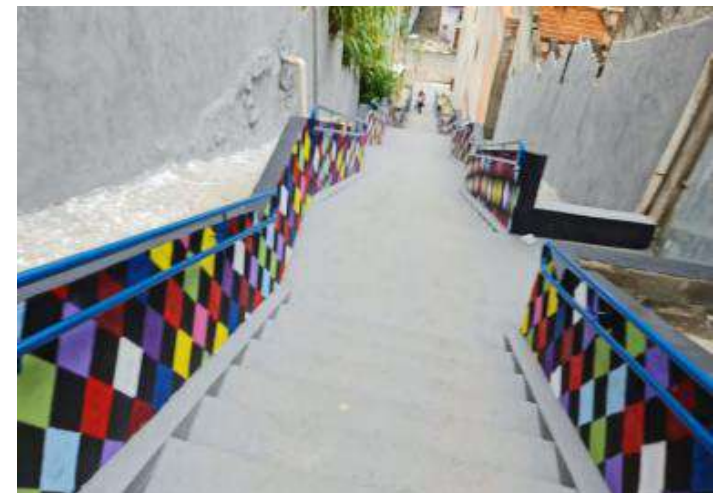


Foto tirada em fev/2023

# Obras de Drenagem



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Execução de Sistema de Grelhas

**Endereço:** Túnel Anhangabaú - (Av. 23 de Maio - Av. Prestes Maia)

**Valor empenhado:** R\$ 665.524,73

**Valor liquidado:** R\$ 397.097,59

**Porcentagem:** 90%



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Execução de obras de drenagem

**Endereço:** Av. Prof. Abraão de Moraes, 2350 - Vila da Saúde

**Valor empenhado:** R\$ 1.298.699,65

**Valor liquidado:** R\$ 1.256.758,04

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em out/2022



Foto tirada em mai/2023

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Execução de obras de drenagem

**Endereço:** Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa

**Valor empenhado:** R\$ 3.332.432,08

**Valor liquidado:** R\$ 78.908,23

**Porcentagem:** 15%



Projeto elaborado em ago/2023



Foto tirada em ago/2023



**Subprefeitura:** Casa Verde

**Objeto:** Execução de obras de drenagem

**Endereço:** Rua Dr. Morais Dantas x Rua Maria Renata

**Valor empenhado:** R\$ 7.427.769,53

**Valor liquidado:** R\$ 5.057.746,03

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2023



Foto tirada em nov/2023

**Subprefeitura:** Casa Verde

**Objeto:** Execução de obras de drenagem

**Endereço:** Av. Masao Watanabe, alt. do nº 1146

**Valor empenhado:** R\$ 801.286,26

**Valor liquidado:** R\$ 754.402,98

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em ago/2022



Foto tirada em set/2023



**Subprefeitura:** Aricanduva/ Formosa

**Objeto:** Execução de contenção e drenagem

**Endereço:** Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum"

**Valor empenhado:** R\$ 2.133.140,56

**Valor liquidado:** R\$ 288.425,83

**Porcentagem:** 35%



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada nov/2023

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Execução de Jardim de Chuva

**Endereço:** Av. Dr. Ricardo Jafet, alt. 1500 - Vila Mariana

**Valor empenhado:** R\$ 372.790,92

**Valor liquidado:** R\$ 372.790,92

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2023



Foto tirada em abr/2023

# **Reforma e Acessibilidade de Passeios Públicos [MOB 30%]**


**Subprefeitura:** Diversas

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas

**Endereços:** As intervenções estão previstas na abrangência das 32 Subprefeituras

**Valor empenhado:** R\$ 49.778,091,65

**Valor liquidado:** R\$ 9.481.799,54

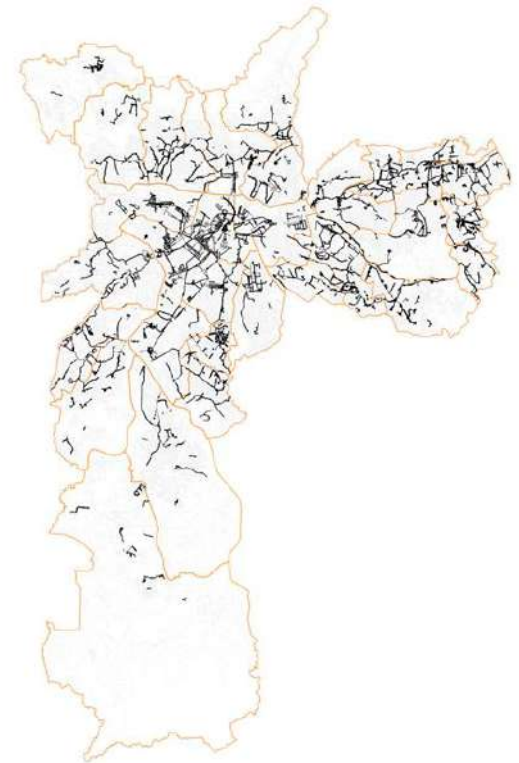



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – São Miguel (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 3.508.248,17

**Valor liquidado:** R\$ 3.232.680,55



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Ipiranga (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 151.847,62

**Valor liquidado:** R\$ 43.219,85



Foto tirada em jun/2023

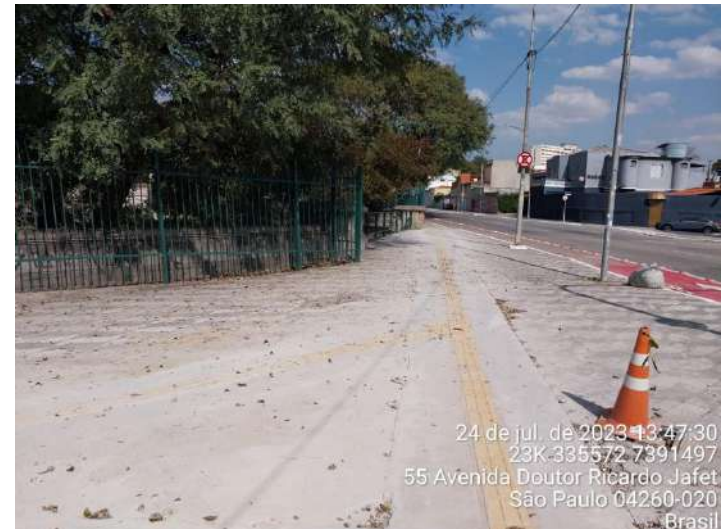


Foto tirada em jul/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Cidade Tiradentes (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 213.584,28

**Valor liquidado:** R\$ 131.819,25



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em ago/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Aricanduva/ Formosa

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Aricanduva (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 768.482,81

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em ago/2023

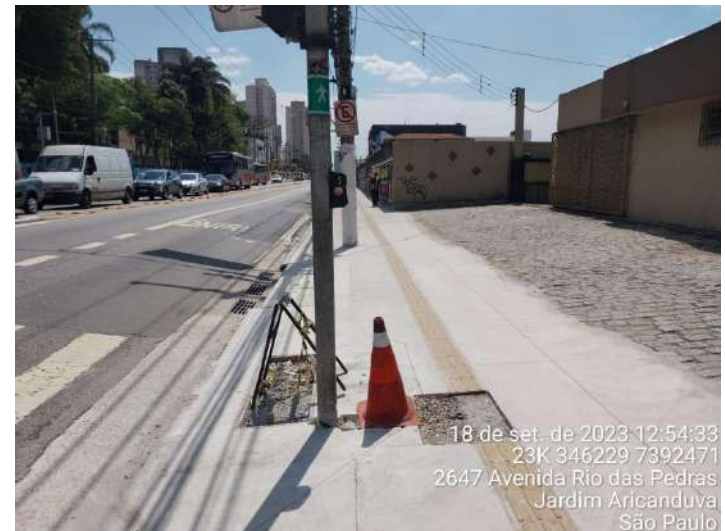


Foto tirada em set/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Itaim Paulista

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Itaim Paulista (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 387.302,04

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em jul/2023

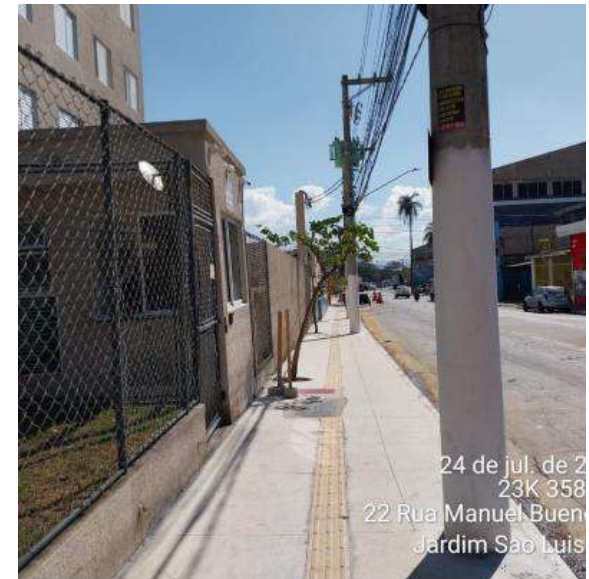


Foto tirada em jul/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Vila Prudente

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Vila Prudente (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 1.482.381,92

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** M'Boi Mirim

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – M'Boi Mirim (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 3.327.322,07

**Valor liquidado:** R\$ 252.993,62



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em out/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Ermelino Matarazzo

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Ermelino Matarazzo (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 186.588,12

**Valor liquidado:** R\$ 186.548,65



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em set/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – São Mateus (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 2.467.305,12

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Jaçanã/ Tremembé

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Jaçanã/ Tremembé (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 1.225.705,17

**Valor liquidado:** R\$ 407.209,89



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Cidade Ademar

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Cidade Ademar (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 377.833,15

**Valor liquidado:** R\$ 346.954,11



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em jul/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Butantã (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 443.614,11

**Valor liquidado:** R\$ 278.334,99



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em out/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Jabaquara

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Jabaquara (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 3.456.052,99

**Valor liquidado:** R\$ 264.152,48



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Perus

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Perus (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 276.708,55

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em ago/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Capela do Socorro

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Capela do Socorro (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 3.263.702,37

**Valor liquidado:** R\$ 1.113.941,17



Foto tirada em jul/2023

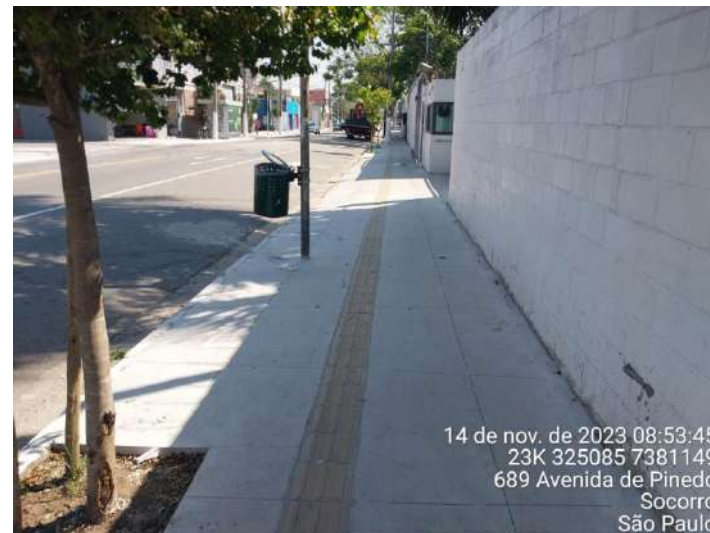


Foto tirada em nov/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Santo Amaro

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Santo Amaro (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 393.748,02

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



4 de set. de 2023 11:05:23  
23K 329855 7384416  
561 Rua Palacete das Águias  
Vila Alexandria  
São Paulo

Foto tirada em set/2023



30 de out. de 2023 11:23:21  
23K 330022 7384433  
698 Avenida Santa Catarina  
Vila Alexandria  
São Paulo

Foto tirada em out/2023

## Recurso Remanescente (MOB21)

**Subprefeitura:** Parelheiros

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Parelheiros (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 479.211,20

**Valor liquidado:** R\$ 234.579,71



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Santana/ Tucuruvi

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Santana/ Tucuruvi (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 411.348,32

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em set/2023



Foto tirada em out/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Campo Limpo

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Campo Limpo (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 1.720.483,41

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023

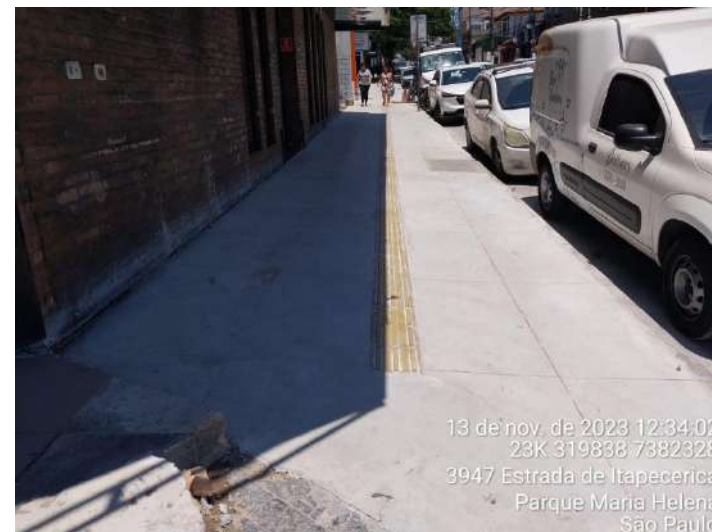


Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Ermelino Matarazzo

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Ermelino Matarazzo (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 1.240.095,72

**Valor liquidado:** R\$ 284.135,67



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Vila Maria/ Vila Guilherme

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Vila Maria/ Vila Guilherme (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 567.303,95

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em set/2023



Foto tirada em nov/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Santana/ Tucuruvi

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Santana/ Tucuruvi (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 301.946,29

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em set/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Ipiranga (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 1.314.581,62

**Valor liquidado:** R\$ 1.235.206,79



Foto tirada em jun/2023



Foto tirada em jun/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Cidade Tiradentes (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 266.215,37

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023



Foto tirada em nov/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Pinheiros (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 134.691,26

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Lapa

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Lapa (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 429.384,48

**Valor liquidado:** R\$ 0,00

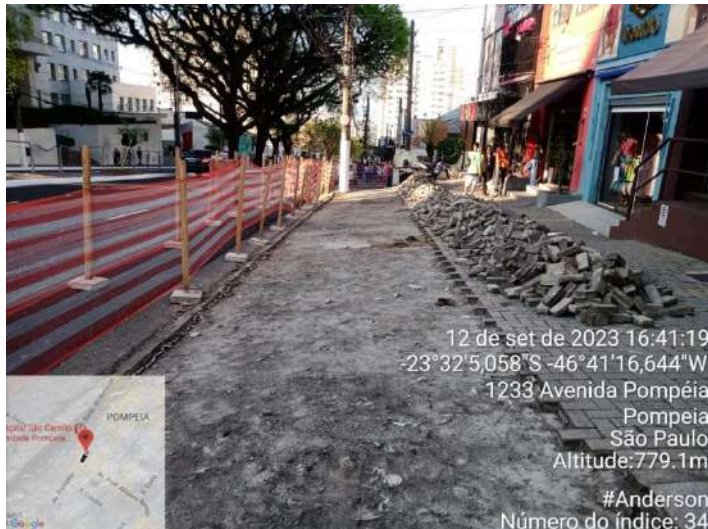


Foto tirada em set/2023



Foto tirada em nov/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Pirituba/ Jaraguá

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Pirituba/ Jaraguá (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 202.673,62

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023



Foto tirada em nov2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Penha

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Penha (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 620.292,74

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023



Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Freguesia do Ó

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Freguesia do Ó (Contrato 1)

**Valor empenhado:** R\$ 251.800,94

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023

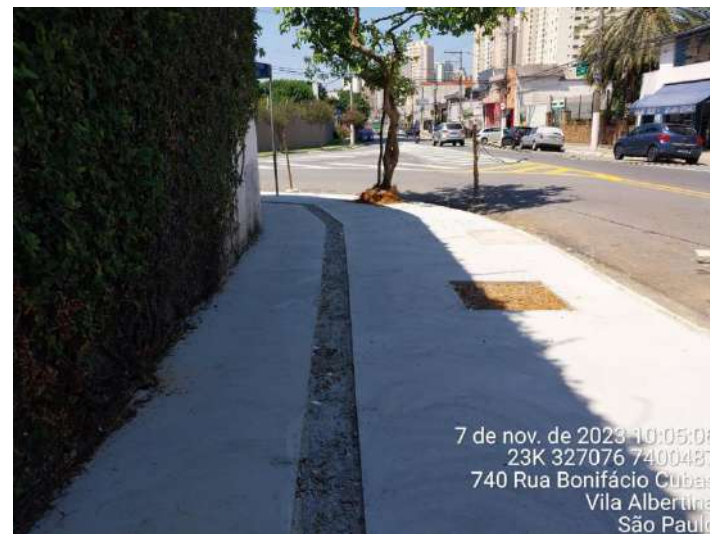


Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Ipiranga (Contrato 3)

**Valor empenhado:** R\$ 1.748.437,50

**Valor liquidado:** R\$ 1.470.022,81



Foto tirada em jun/2023



Foto tirada em jun/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Itaim Paulista

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Itaim Paulista (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 337.184,10

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em jset2023



Foto tirada em nov/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Cidade Ademar

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Cidade Ademar (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 1.873.931,52

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em jul/2023



Foto tirada em jul/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Jaçanã/ Tremembé

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Jaçanã/ Tremembé (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 2.063.852,90

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em nov/2023



Foto tirada em nov/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Parelheiros

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Parelheiros (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 309.000,30

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Santana/ Tucuruvi

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Santana/ Tucuruvi (Contrato 3)

**Valor empenhado:** R\$ 271.984,82

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em set/2023



Foto tirada em out/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Jabaquara

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Jabaquara (Contrato 2)

**Valor empenhado:** R\$ 541.378,14

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em ago/2023

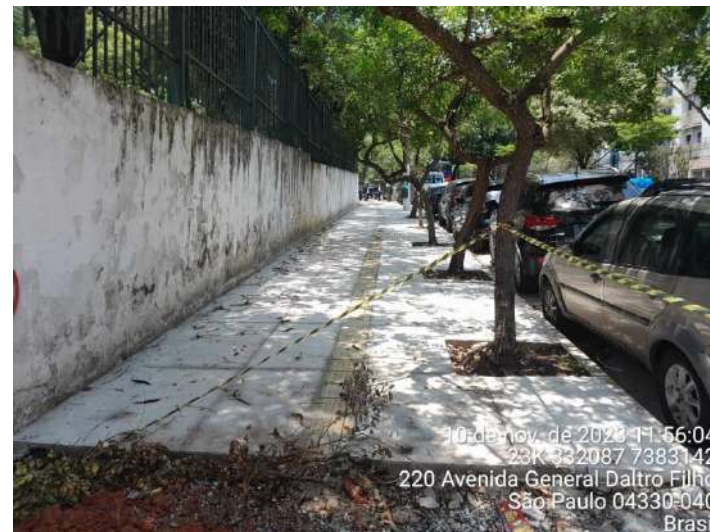


Foto tirada em out/2023



**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Jabaquara

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Jabaquara (Contrato 3)

**Valor empenhado:** R\$ 393.266,72

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em ago/2023



Foto tirada em out/2023

**Recurso Remanescente (MOB21)**

**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Objeto:** Calçadas contempladas no Plano Emergencial de Calçadas – Cidade Tiradentes (Contrato 3)

**Valor empenhado:** R\$ 351.037,01

**Valor liquidado:** R\$ 0,00



Foto tirada em out/2023



Foto tirada em nov/2023

**OBRIGADO!**
