

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2020
SEHAB

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 003/2020 (19/06/2020)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 005/2020 (10/07/2020)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 009/2020 (02/08/2020)	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5403 Construção de Habitação de Interesse Social	Obras	102.862.007	130.597.822	130.597.821	118.050.159	47.173.507	47.173.507
	Serviços Técnicos	933.525	9.197.710	9.197.710	9.195.455	5.818.420	5.818.420
	Aquisição de Imóveis	36.362.184	36.362.184	52.421.666	25.085.971	22.708.330	22.708.330
TOTAL		140.157.716	176.157.716	192.217.197	152.331.585	75.700.257	75.700.257

NOME	PAGO (R\$)
-------------	-------------------

HELIÓPOLIS / GLEBA G
– CONDOMÍNIO B E
HELIÓPOLIS / SABESP
2 – COND. 4 E 5

7.406.589

ESTÁGIO	AÇÃO
----------------	-------------

EM ANDAMENTO

GLEBA G: 54 uh's
SABESP 2: 120 uh's



NOME

PAGO (R\$)

PARAISÓPOLIS /
SANFONA – FASE 1

1.836.012

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

50 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

BAMBURRAL / LIDIANE


6.690.596


ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

BAMBURRAL: 234 uh's
LIDIANE: 125 uh's
(Cond. 2)

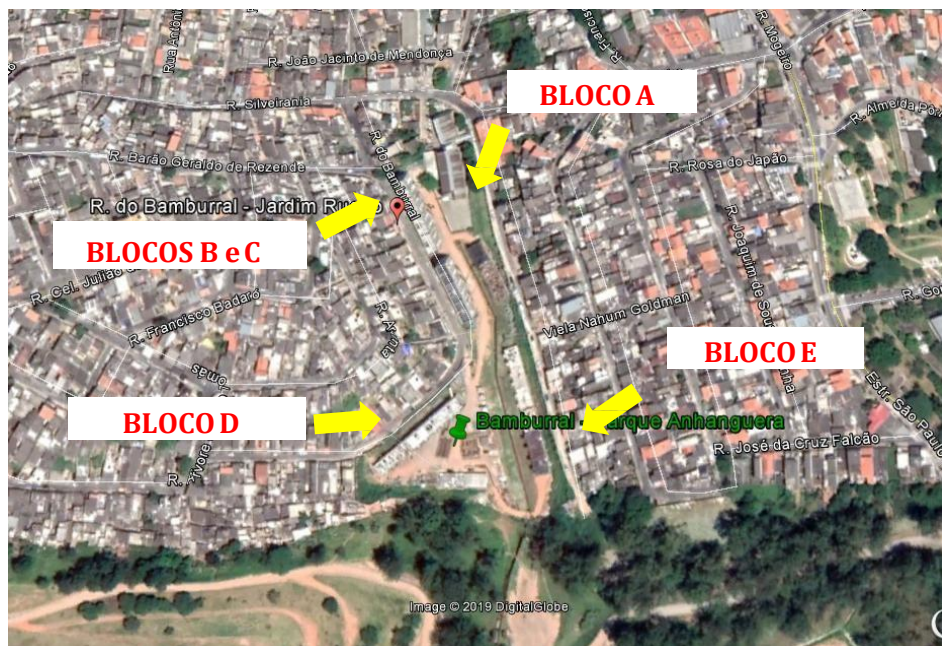

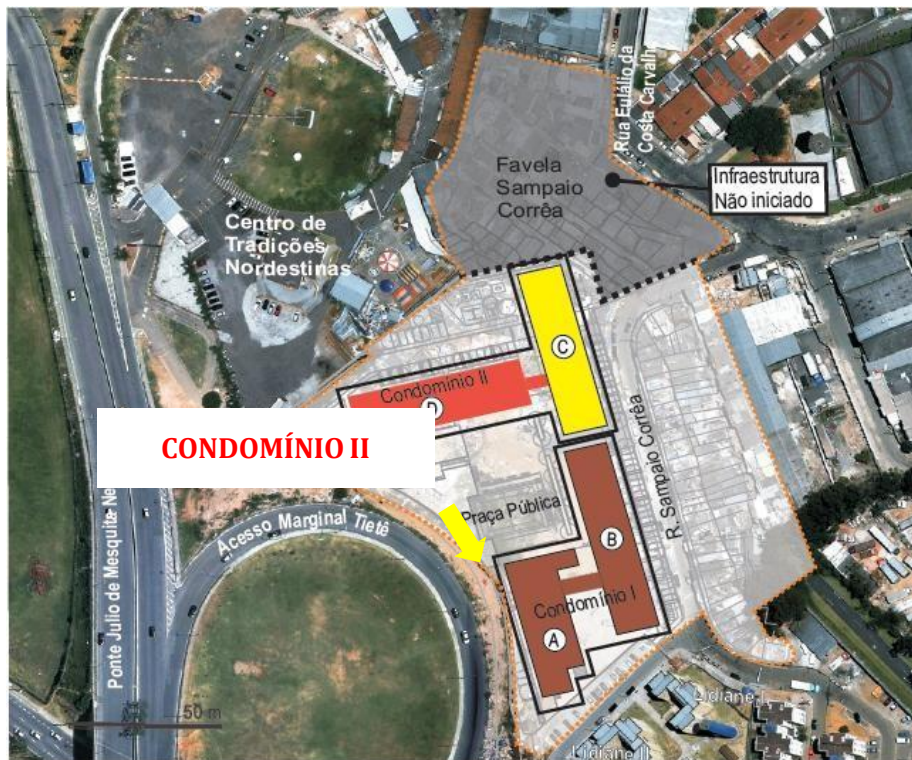

NOME

PAGO (R\$)

PONTE DOS REMÉDIOS

2.519.471

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

181 UNIDADES
HABITACIONAIS



BLOCO D



NOME

PAGO (R\$)

ALTO DA ALEGRIA

815.277

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

56 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

CHÁCARA DO CONDE –
FASE1

21.418.307

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

562 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

VIELA DA PAZ

6.329.421

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

216 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

ESPANHA

157.834

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

EQUIPAMENTO
PÚBLICO



NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	4.460.193

ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO DE OBRAS

NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	1.358.227

ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO SOCIAL

NOME	PAGO (R\$)
-------------	-------------------

JOSÉ DIAS (A= 15.004,00
m²)

13.394.457

ESTÁGIO	AÇÃO
----------------	-------------

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS



NOME	PAGO (R\$)
PROJETO REDENÇÃO / CRACOLÂNDIA (A= 14.570,00 m ²)	5.733.873
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



NOME	PAGO (R\$)
COMANDANTE TAYLOR (A= 19.435,26 m ²)	3.580.000
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

