### Programa de Metas 2019-2020

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

**Julho/2020** 











#### **Meta 12.1**

Implantar 173,35 km de ciclovias / ciclofaixas



Forma de execução	Tipologia	Meta	Entregue
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMSUB)	ciclofaixa	36	7
Execução por polo gerador de tráfego*	ciclovia	3,5*	1,5
A licitar (concorrência)	ciclovia	67	1
Execução por SMSUB	ciclofaixa	79	-
TOTAL		185	8,5



<sup>\*</sup>Henrique Schaumann (1,5 km) + Domingos de Morais (2 km)

Forma de execução	Tipologia	Meta	Entregue
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMSUB)	ciclofaixa	36	7
Execução por polo gerador de tráfego*	ciclovia	3,5*	1,5
A licitar (concorrência)	ciclovia	67	1
Execução por SMSUB	ciclofaixa	79	-
TOTAL		185	8,5



<sup>\*</sup>Henrique Schaumann (1,5 km) + Domingos de Morais (2 km)

### Ciclofaixas Eng. Caetano Álvares / Samaritá / Iapó












### Ciclofaixas Eng Caetano Álvares / Samaritá / Iapó





# Ciclofaixas Eng Caetano Álvares / Samaritá / Iapó

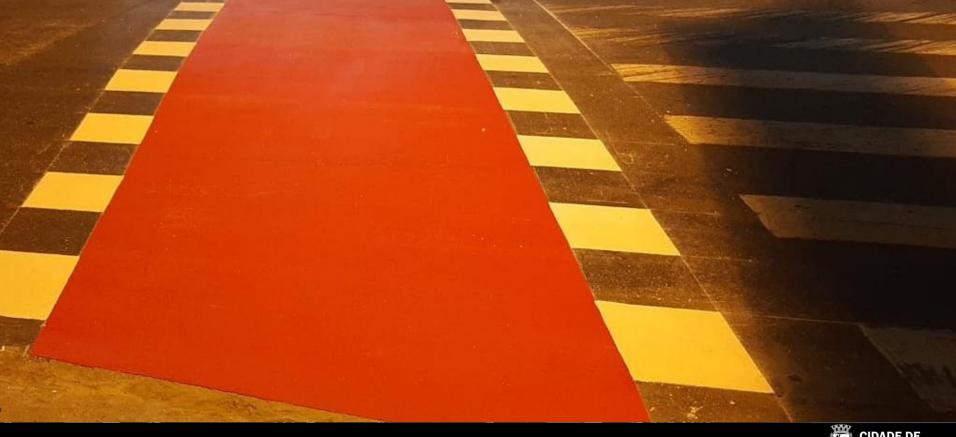



















## Ciclofaixa Guadelupe











### Ciclofaixa Guadelupe



### Ciclovia Henrique Schaumann





# Ciclovia Henrique Schaumann







### **Ciclofaixa Ricardo Jafet 1**














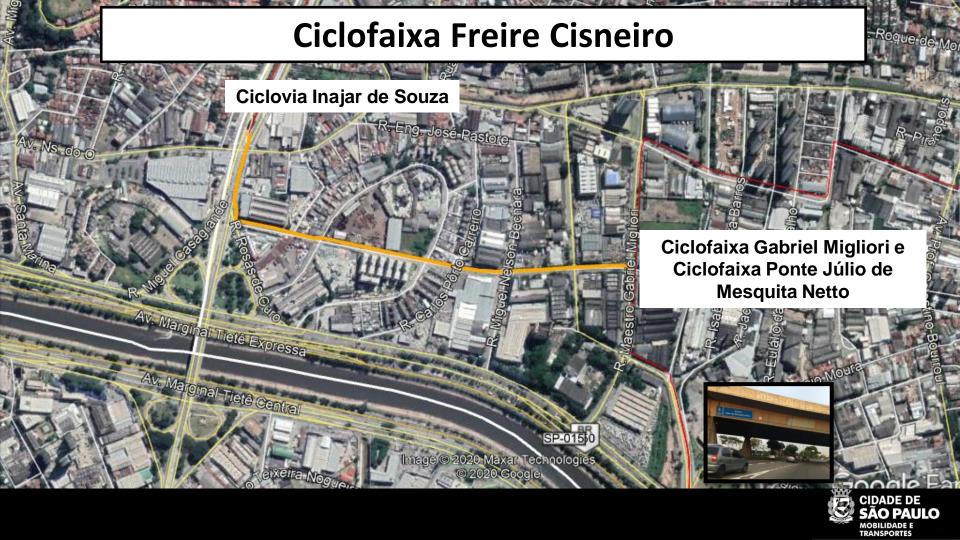



















### **Contratos SMT – demais ciclofaixas**

Nome da ciclofaixa	Status	
Artur de Azevedo 2		
Conselheiro Furtado	Em implentação (obres)	
Vila Jaguara	Em implantação (obras)	
Condessa de São Joaquim		
São Miguel		
Waldemar Tietz	A iniciar	
Dr. Assis Ribeiro	A inicial	
Rebouças		



Forma de execução	Tipologia	Meta	Entregue
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMSUB)	ciclofaixa	36	7
Execução por polo gerador de tráfego*	ciclovia	3,5*	1,5
A licitar (concorrência)	ciclovia	67	-
Execução por SMSUB	ciclofaixa	79	-
TOTAL		185	8,5



<sup>\*</sup>Henrique Schaumann (1,5 km) + Domingos de Morais (2 km)

1º procedimento licitatório sendo instruído para **20,16 km** de ciclovias

Nome da ciclovia	Extensão (km)
Av Carlos Caldeira Filho	3,53
Radial Leste	5,42
Av Águia de Haia	4,5
Ruas Rui Barbosa – 13 de Maio – Sto Antônio	2,27
Av José Maria Whitaker	0,31
Av Eng Armando Arruda Pereira	1,47
Av Jaguaré	0,62
Av. Nações Unidas parte I	1,2
Av. Nações Unidas parte II	0,84
TOTAL	20,16



1º procedimento licitatório sendo instruído para **20,16 km** de ciclovias

Nome da ciclovia	Cronograma estimado	
Nome da ciciovia	Licitação	Obras
Av Carlos Caldeira Filho		
Radial Leste		Out-dez
Av Águia de Haia	<b>Até sábado</b> será	
Ruas Rui Barbosa – 13 de Maio – Sto Antônio	publicada a consulta	
Av José Maria Whitaker	pública	
Av Eng Armando Arruda Pereira		Out nov
Av Jaguaré	Entre julho e setembro	Out-nov
Av. Nações Unidas parte I		
Av. Nações Unidas parte II		



### **Meta 12.2**

Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas



### Meta 12.2 – Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas

	Tipologia	Meta	Entregue
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMSUB)	ciclofaixa	161	128,5
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMT)	ciclovia	68	-
A executar por SMSUB	ciclofaixa	81	-
TOTAL		310	128,5



### Ciclofaixa Pirajussara





# Ciclofaixa Pirajussara




# **Ciclofaixa Mergenthaler**





# Ciclofaixa Viaduto do Chá / Pça Ramos de Azevedo

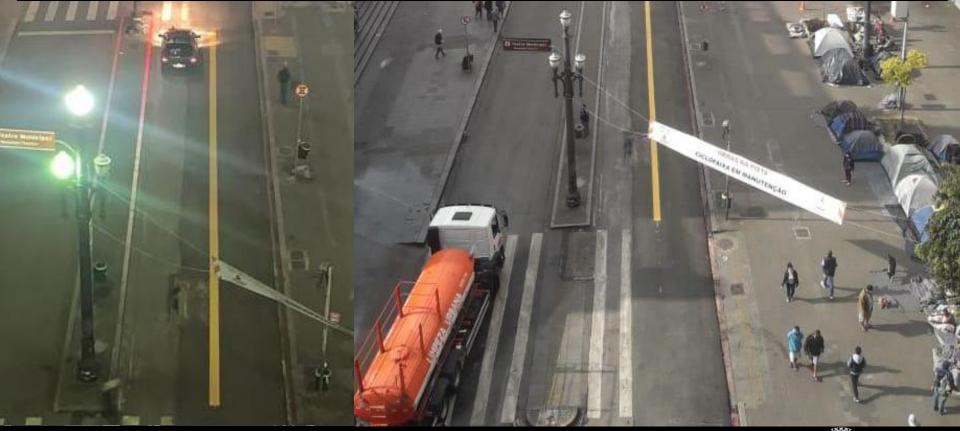



# Ciclofaixa República





	Tipologia	Meta	Entregue
Contratos SMT <b>em execução</b> (ata SMSUB)	ciclofaixa	161	128,5
Contratos SMT <b>em execução</b>	ciclovia	68	-
A executar por SMSUB	ciclofaixa	81	-
TOTAL		310	128,5



## Obras sendo iniciadas em 24 km de ciclovias

Nome da ciclovia	Extensão (km)	Cronograma estimado
Eliseu de Almeida 1	2,36	- Julho-setembro
Eliseu de Almeida 2	3,2	
Butantã (Afrânio Peixoto)	0,38	
Figueira / Rangel	0,97	
Aida	0,9	
Vila Prudente	2,46	
Arraias do Araguaia	1,62	
Faria Lima 1	4,65	
Paulista / Bernardino de Campos	3,45	
São João	4,06	



### Demais 44 km de ciclovias

Nome da ciclovia	Extensão (km)	Cronograma estimado
Teotônio Vilela 2	2,61	- Julho-outubro
Teotônio Vilela 3	1,48	
Jorge João Saad / Jacob Z.	2,32	
Cruzeiro do Sul 2	2,11	
Luís Carlos Berrini / Funchal	3,33	
Faria Lima 2	13,31	
Viaduto Antártica	1,39	
Pacaembu	1,28	
Ponto dos Remédios	0,61	
Escola Politécnica 1	1,12	



### Demais 44 km de ciclovias

Nome da ciclovia	Extensão (km)	Cronograma estimado
Jaguaré	0,71	
Cruzeiro do Sul 1	0,67	
Cruzeiro do Sul 3	0,49	
Edgar Facó	1,59	
Santos Dumont 2	1,25	
Freguesia do Ó	2,55	Julho-outubro
Guilherme	1,41	
Otto Baumgart	0,97	
Ponte da Vila Guilherme	1,05	
Braz Leme	2,91	
Ponte Jânio Quadros	0,58	- W. W. W.



# **Outros tópicos**



# Remanejamento da Duque de Caxias






# Remanejamento da Duque de Caxias






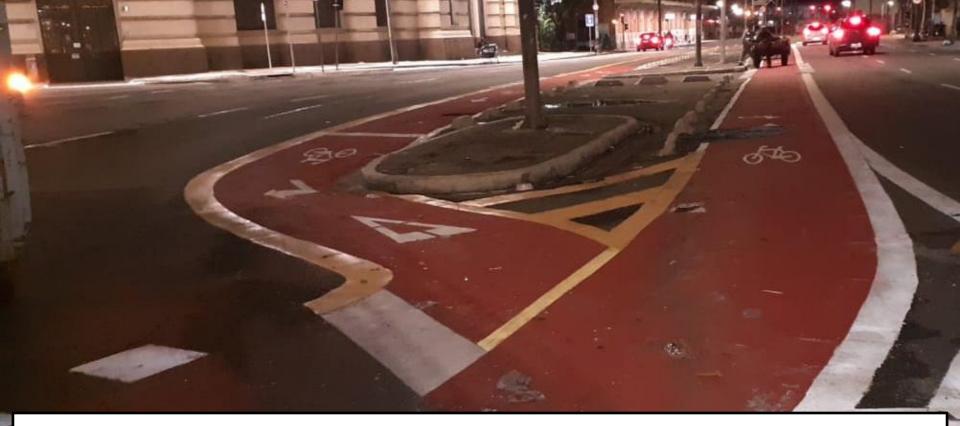

Remanejamento da Duque de Caxias



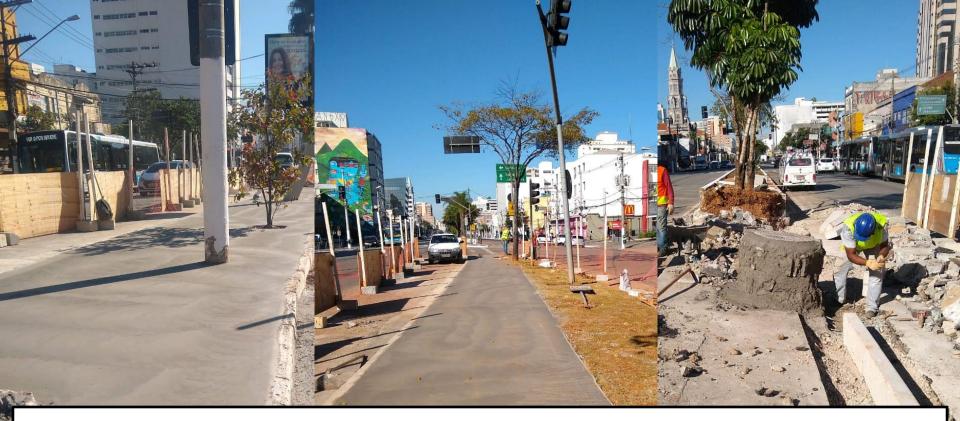

Ciclovia Domingos de Morais – em execução



# DSV







