

PLANO DE INVESTIMENTO - 2023
SIURB X FUNDURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PLANO 2023 - AÇÕES	PLANO 2023	EMPENHADO	LIQUIDADO
Implantação de Estrutura Turística no Triângulo e Quadrilátero Histórico do Centro - MOB	37.334.576,75	2.657.780,95	2.408.744,29
<i>Projeto executivo, vigilância e obras - MOB</i>	37.204.576,75	2.657.780,95	2.408.744,29
<i>Gerenciamento</i>	130.000,00		
Implantação de Corredores de Ônibus Novos - MOB	86.848.405,46	7.461.576,87	2.795.781,94
<i>Corredor Radial Leste - Trechos 1 e 2 - MOB</i>			
<i>Corredor Itaim - São Matheus - MOB</i>			
<i>Corredor Aricanduva - MOB</i>	78.953.368,60	7.461.576,87	2.795.781,94
<i>Corredor Capão - MOB</i>			
<i>Corredor Chucri Zaidan - MOB</i>			
<i>Gerenciamento</i>	7.895.036,86		
Construção de Terminais de Ônibus - MOB	301.382.485,88	-	-
<i>Terminal Itaquera - MOB</i>	295.082.485,88		
<i>Terminal Itaim - MOB</i>			
<i>Gerenciamento</i>	6.300.000,00		
Intervenções no Sistema Viário	38.520.480,79	11.607.662,80	6.388.801,68
<i>Prolongar a Cruzeiro do Sul até Eng. Caetano alvares;</i>			
<i>Prolongar Engª Caetano Álvares até a Maria Amália Azevedo;</i>			
<i>Prolongamento da Av Luis dumont Villares;</i>			
<i>Duplicação da Rua Darzan;</i>			
<i>Viário de acesso do Hospital Parelheiros;</i>			
<i>Av. N. Sra, do Ó, Rua Papaterra Limongi, Rua José Fiúza Guimarães;</i>			
<i>Av. do Imperador até a Av. Nordestina;</i>			
<i>Itaquera / Itaqueruna;</i>			
<i>Av. Rio das Pedras;</i>			
<i>Av. Presidente Wilson;</i>	35.018.618,90	11.607.662,80	6.388.801,68
<i>Túnel da Senna Madureira;</i>			
<i>Ligação Pirituba-Lapa;</i>			
<i>Ponte Graúna-Gaivotas;</i>			
<i>Marginal Pinheiros;</i>			
<i>Av. Senador Teotônio Vilela;</i>			
<i>Av. Santos Dumont;</i>			
<i>Pontilhão João Beçola.</i>			
<i>Outras intervenções a definir</i>			
<i>Gerenciamento</i>	3.501.861,89		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PLANO 2023 - AÇÕES	PLANO 2023	EMPENHADO	LIQUIDADO
Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	58.612.708,91	666.172,32	666.172,32
<i>Avenida Amador Bueno</i>			
<i>Avenida Imirim</i>			
<i>Corredor Santo Amaro / João Dias</i>	53.287.718,83	666.172,32	666.172,32
<i>Corredor Estrada de Itapecerica</i>			
<i>Avenida Interlagos</i>			
<i>Outras intervenções a definir</i>			
<i>Gerenciamento</i>	5.324.990,08		
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	358.966.016,11	114.515.870,65	58.330.329,52
<i>Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional.</i>	222.984.119,64		
<i>Emergencial OAE's</i>	135.963.896,47	114.515.870,65	58.330.329,52
<i>Gerenciamento</i>	18.000,00		
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	20.562.330,28		
<i>Inspeções visuais e especiais a definir</i>	20.553.330,28		
<i>Gerenciamento</i>	9.000,00		
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	100.000,00		
<i>Projeto executivo e obras a definir</i>	91.000,00		
<i>Gerenciamento</i>	9.000,00		
Construção e Implantação do Parque Minhocão	200.000,00		
<i>Projeto executivo e obras</i>	182.000,00		
<i>Gerenciamento</i>	18.000,00		
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.000.000,00		
<i>Intervenções a definir</i>	910.000,00		
<i>Gerenciamento</i>	90.000,00		
TOTAL	903.527.004,17	136.909.063,59	70.589.829,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Calçadas – Triângulo Histórico e Quadrilátero - **30% Mobilidade**

PROCESSO	7910.2019/0000757-2 6022.2022/0006553-5 7910.2022/0001652-6 6022.2023/0000327-2 7910.2022/0001240-7
Endereço	Triângulo Histórico e Quadrilátero da República
Subprefeitura	Sé
Valor	2.408.744,29
Situação	Obras em andamento



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Corredores de Ônibus - 30% Mobilidade

PROCESSO	7910.2021/0001247-2
Endereço	Av. Radial Leste.
Subprefeitura	Itaquera
Valor	2.795.781,94
Situação	Projeto executivo em andamento




PRESTAÇÃO DE CONTAS – Intervenções no Sistema Viário

PROCESSO	6022.2022/0003364-1, 7910.2019/0000409-3 e 7910.2019/0000410-7
Endereço	Lig. Pirituba Lapa e Marginal Pinheiros
Subprefeitura	Lapa
Valor	6.388.801,68
Situação	Obras em andamento



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Intervenções na Área de Mobilidade Urbana

PROCESSO	7910202200014558
Endereço	Av. Imirim
Subprefeitura	Casa Verde/Cachoeirinha
Valor	666.172,32
Situação	Obras em andamento

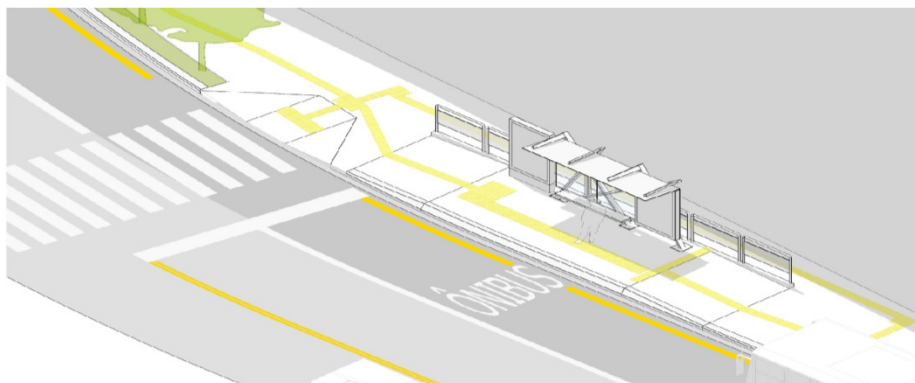

Obras de Recuperação e Reforço de OAE's

PROCESSO	6022202200062226, 6022202300003337, 6022202300005330 e 6022202300026183.
Endereço	Av. Eng. Oscar Americano, Rua Celso Barbosa de Lima, Engº Roberto Rossi Zucolo e Viaduto Imigrantes.
Subprefeitura	Pinheiros, Butantã, Jabaquara e Itaim Paulista
Valor	58.330.329,52
Situação	Obras em andamento





CIDADE DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

