



CIDADE DE
SÃO PAULO
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2023

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)		Execução orçamentária 2023							
			Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)				
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	1.354.559,20	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	-	R\$	320.559,20	R\$	320.559,20	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	9.751.180,78	R\$	7.109.739,48	R\$	4.288.990,99	R\$	928.846,58	R\$	854.871,83
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	951.000,00	R\$	2.118.768,29	R\$	793.781,60	R\$	19.764,60	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	8.923.376,20	R\$	3.300.000,00	R\$	3.300.000,00	R\$	632.952,83	R\$	632.952,83
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	-	R\$	2.640.000,00	R\$	2.640.000,00	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$	1.323.564,87	R\$	1.256.450,00	R\$	1.256.450,00	R\$	1.224.642,78	R\$	1.224.642,78
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.1	R\$	-	R\$	23.922,09	R\$	23.922,09	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	24.018.581,95	R\$	18.130.957,74	R\$	16.457.010,25	R\$	10.066.143,65	R\$	5.997.018,08
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	-	R\$	4.069.552,15	R\$	4.069.552,15	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	46.391.263,00	R\$	39.003.948,95	R\$	33.184.266,28	R\$	12.872.350,44	R\$	8.709.485,52
				84,08%		71,53%		27,75%		18,77%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 18/08/2023.

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Sítio da Ressaca	Obra de restauro	6025.2019/0021342-0	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 650.000,00	R\$ 995.772,69	R\$ 449.592,89	R\$ 449.592,89	69,2%
Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5425	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 8.923.376,20	R\$ 5.940.000,00	R\$ 632.952,83	R\$ 632.952,83	7,1%
Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	2. Em licitação / Reservado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.815.286,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Sítio Morrinhos	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	2. Em licitação / Reservado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 618.834,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura São Mateus	Projeto Executivo	6025.2022/0007515-4	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 345.140,13	R\$ 201.997,62	R\$ 151.474,17	R\$ 151.474,17	43,9%
Centro Cultural Penha	Palco	6025.2018/0010299-5	0. Entregue	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	100,0%
Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	2. Em licitação / reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 357.500,00	R\$ 276.715,87	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto Executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 290.999,90	R\$ 290.999,90	R\$ 19.764,60	R\$ -	6,8%
Biblioteca Cora Coralina	Requalificação para Acessibilidade e AVCB	6025.2021/0010094-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 600.862,15	R\$ 600.862,15	R\$ 328.585,84	R\$ 114.030,16	54,7%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.	6025.2022/0011336-6	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 5.864.467,56	R\$ 3.600.000,00	R\$ 452.593,63	R\$ 378.618,88	7,7%
Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca Helena Silveira	Reforma e requalificação	6025.2022/0008158-8	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 333.234,82	R\$ 333.234,82	R\$ 323.405,06	R\$ 323.405,06	97,1%
Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2022/0007056-0	2. Em licitação / Reservado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 511.592,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2022/0002746-0	2. Em licitação / Reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 511.592,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauro e troca da cobertura da Casa 2	6025.2023/0012495-5	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 18.708.283,78	R\$ 19.988.655,87	R\$ 10.444.128,58	R\$ 6.589.558,69	55,8%
Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.280.372,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Memorial dos Afritos	Projeto Executivo	6025.2020/0018377-8	0. Em execução	Implantação do Memorial dos Afritos	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 320.559,20	R\$ 320.559,20	R\$ -	R\$ -	0,0%
Memorial dos Afritos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3	5. Planejando	Implantação do Memorial dos Afritos	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Memorial dos Afritos	Serviços de sondagem e parecer de fundações para implantação do Memorial dos Afritos	6025.2023/0014412-3	0. Em execução	Implantação do Memorial dos Afritos	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	6025.2022/0022073-1	2. Em licitação / reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 549.068,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	2. Em licitação / reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 657.594,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	6025.2022/0011088-0	2. Em licitação / reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 596.080,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Distritos Criativos	Projeto para reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos	Sem processo 8	5. Planejando	Implantação de Distritos Criativos	5426	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Requalificação para acessibilidade e instalação de novo padrão de medição de água e luz na Casa de Cultura	Sem processo 10	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Bibliotecas Cassiano Ricardo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Biblioteca Hans Christian Andersen	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca Chácara do Castelo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca Vicente de Carvalho	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura São Rafael	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura M' Boy Mirim	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura do Itaim Paulista	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Hip-Hop Sul - Cora Coralina	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural Vila Itororó	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ 36.227,54	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural Vila Itororó	Reforma da Cobertura do Galpão	6025.2020/0004294-5	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 309.967,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Teatro Arthur Azevedo	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0016747-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 215.600,00	R\$ 196.000,00	R\$ 26.660,06	R\$ 26.660,06	12,4%
Monumento	Restauro da Fonte Monumental		5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 429.170,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo 20	9. Pausado	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	5400	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo 20	9. Pausado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo 21	9. Pausado	Construção de Equipamentos Culturais	5959	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
							R\$ 46.425.263,00	R\$ 33.184.266,28	R\$ 12.872.350,44	R\$ 8.709.485,52	

12. Sítio da Ressaca

Obra de restauro

Ação: Obra de restauro

Processo: 6025.2019/0021342-0

Valor: R\$ 650.000

Empenhado: R\$ R\$ 995.772,69

Liquidado: R\$ 449.592,89

Pago: R\$ 449.592,89

% de liquidação: 69,2%

Endereço: Rua Nadra Raffoul
Mokodsi, 3

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



Fotos tiradas em: 28/02/2023

13. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Processo: 6025.2022/0018097-7

Valor: R\$ 8.923.376,20

Empenhado: R\$ 5.940.000,00

Liquidado: R\$ 632.952,83

Pago: R\$ 632.952,83

% de liquidação: 7,1%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



Fotos tiradas em: 04/05/2023



16. Casa de Cultura São Mateus

Projeto Executivo

Ação: Projeto Executivo

Processo: 6025.2022/0007515-4

Valor: R\$ 345.140,18

Empenhado: R\$ 201.997,62

Liquidado: R\$ 151.474,17


Pago: R\$ 151.474,17

% de liquidação: 43,9%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus

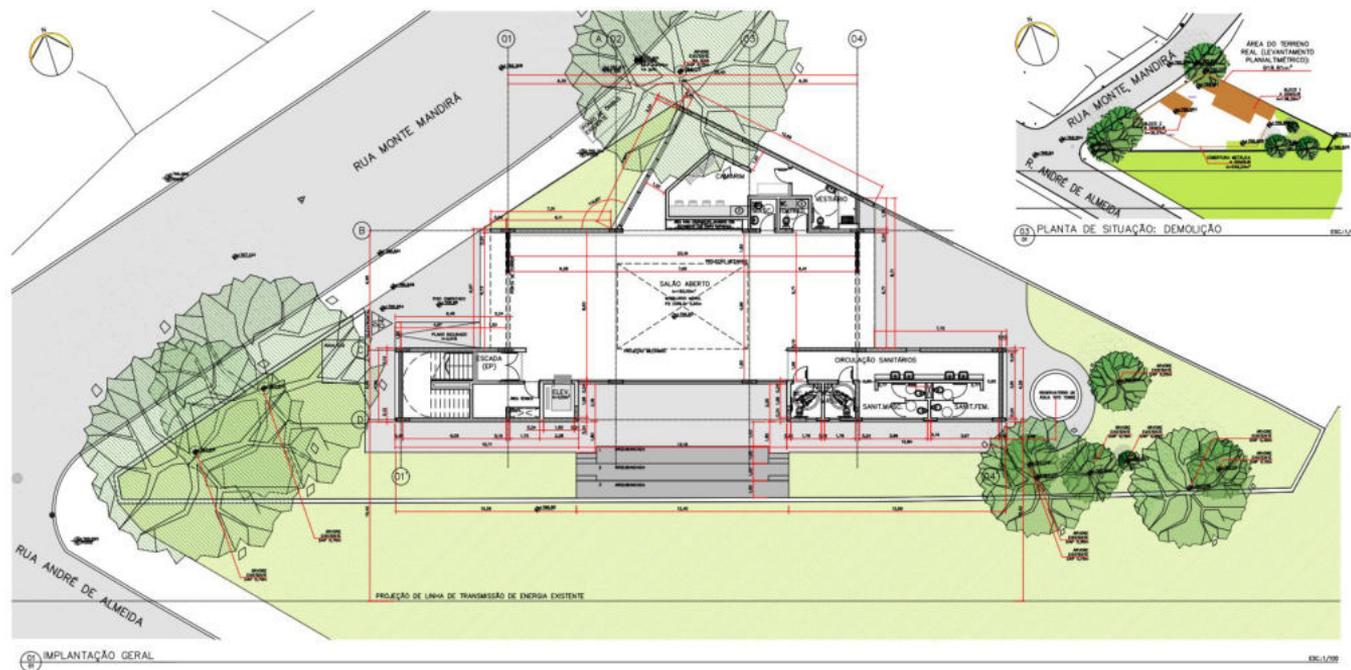

17. Centro Cultural Penha

Palco

Ação: Palco

Processo: 6025.2018/0010299-5

Valor: R\$ 43.192,78

Empenhado: R\$ 43.192,78

Liquidado: R\$ 43.192,78

Pago: R\$ 43.192,78

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha



Fotos tiradas em: 31/10/2022



Foto tirada em: 13/01/2023

19. Biblioteca Cora Coralina

Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Ação: Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Processo: 6025.2021/0010094-7

Valor: R\$ 600.862,15

Empenhado: R\$ 600.862,15

Liquidado: R\$ 328.585,84

Pago: R\$ 114.030,16

% de liquidação: 54,7%

Endereço: Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113

Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases



Fotos tiradas em: 12/05/2023

20. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Processo: 6025.2022/0011336-6

Valor: R\$ 5.864.467,56

Empenhado: R\$ 3.600.000,00

Liquidado: R\$ 452.593,63




Pago: R\$ 378.618,88

% de liquidação: 7,7%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

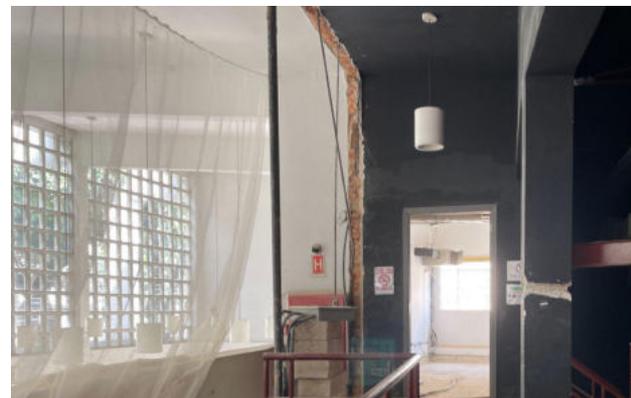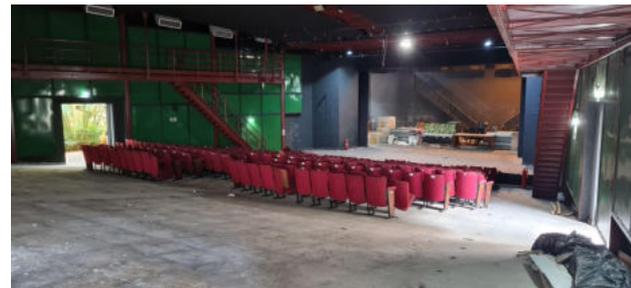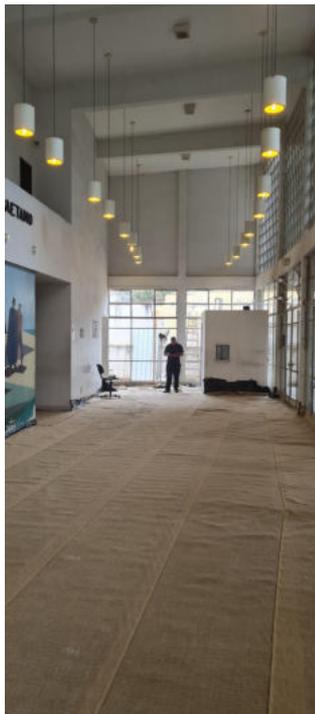

Fotos tiradas em: 31/03/2023

23. Biblioteca Helena Silveira

Reforma e requalificação

Ação: Reforma e requalificação

Processo: 6025.2022/0008158-8

Valor: R\$ 333.234,82

Empenhado: R\$ 333.234,82

Liquidado: R\$ 323.405,06

Pago: R\$ 323.405,06

% de liquidação: 97,1%

Endereço: Rua José Viriato de Castro, 78

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo



Fotos tiradas em: 04/05/2023

27. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 18.708.283,78

Empenhado: R\$ 19.988.655,87

Liquidado: R\$ 10.444.128,58


Pago: R\$ 6.589.558,69

% de liquidação: 55,8%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

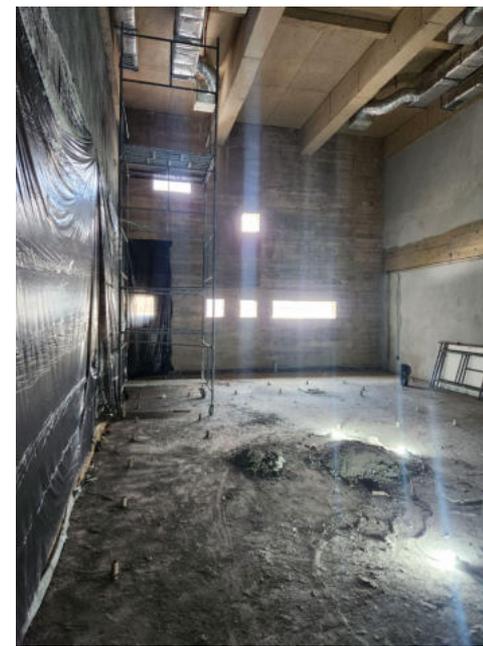

Fotos tiradas em: 19/04/2023

27. Praça das Artes

3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 1.280.372,09

Empenhado: -

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 0,0%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.

45. Teatro Arthur Azevedo

Serviços Corretivos para AVCB

Ação: Serviços Corretivos para AVCB

Processo: 6025.2018/0016747-7

Valor: R\$ 215.600,00

Empenhado: R\$ 196.000,00

Liquidado: R\$ 26.660,06

Pago: R\$ 26.660,06

% de liquidação: 12,4%

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca

Não há relatório fotográfico.
