



CIDADE DE
SÃO PAULO
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2022

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2022			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0	R\$ 4.678.043,06	R\$ 4.491.536,74	R\$ 2.699.931,78	R\$ 2.394.615,97	R\$ 2.394.615,97
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0	R\$ 5.638.014,49	R\$ 5.247.721,12	R\$ 4.305.770,32	R\$ 4.016.788,68	R\$ 4.016.788,68
98.25.13.392.3001.5.960.44909200.08.0	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44906100.08.0	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.561.179,85	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.091.703,38
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0	R\$ 1.075.842,32	R\$ 645.118,75	R\$ 645.118,75	R\$ 216.731,53	R\$ 216.731,53
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 19.585.248,29	R\$ 19.044.201,50	R\$ 15.841.169,27	R\$ 14.818.484,60	R\$ 14.818.484,60
		97,24%	80,88%	75,66%	75,66%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 09/05/2023.

Última atualização em: 09/05/2023										
Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC	
Casa de Cultura	Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas	Restauro e requalificação predial	6025.2019/0003639-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.039.500,00	R\$ 724.252,57	R\$ 636.947,09	R\$ 636.947,09	61,27%	
Museu/Acervo	Sítio da Ressaca	Obra de restauro	6025.2019/0021342-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.426.490,86	R\$ 838.159,75	R\$ 838.159,75	R\$ 838.159,75	58,76%	
Biblioteca	Biblioteca Belmonte	Reforma e requalificação predial	6025.2020/0005987-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.252.650,00	R\$ 1.119.937,87	R\$ 1.119.937,79	R\$ 1.119.937,79	89,41%	
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Itororó	Reforma da Cobertura do Galpão	6025.2020/0004294-5	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.199.115,00	R\$ 755.199,49	R\$ 654.500,74	R\$ 654.500,74	54,58%	
		Restauro Casa 9 e 10	6025.2021/0006570-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Formosa	Requalificação geral	6025.2018/0012899-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.896.766,04	R\$ 1.320.072,56	R\$ 1.314.333,79	R\$ 1.314.333,79	69,29%	
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%	
		Despesa do exercício anterior - Reforma da cobertura e a requalificação com o foco na acessibilidade e na proteção e segurança contra incêndio	6025.2022/0005078-0	98.25.13.392.3001.5.960.44909200.08.0	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	R\$ 98.645,04	100,00%	

Última atualização em: 09/05/2023										
Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC	
Casa de Cultura	Casa de Cultura Cidade Ademar	Projeto Executivo	6025.2018/0003745-0	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 ▾	R\$ 305.842,32	R\$ 235.031,28	R\$ 161.750,32	R\$ 161.750,32	52,89%	
		Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 ▾	R\$ 700.000,00	R\$ 410.087,47	R\$ 54.981,21	R\$ 54.981,21	7,85%	
		Gerenciamento	Sem processo	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 ▾	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Casa de Cultura	Casa de Cultura São Mateus	Projeto Executivo	6025.2022/0007515-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 100.000,00	R\$ 39.600,50	R\$ 39.600,50	R\$ 39.600,50	39,60%	
Centro Cultural	Centro Cultural Penha	Palco	6025.2018/0010299-5	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 120.000,00	R\$ 180.773,57	R\$ 180.773,57	R\$ 180.773,57	150,64%	
		Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%	
Casa de Cultura	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto Executivo de restauro	6025.2019/0024221-7	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Biblioteca	Biblioteca Cora Coralina	Requalificação para Acessibilidade e AVCB	6025.2021/0010094-7	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 200.000,00	R\$ 50.379,02	R\$ 50.379,02	R\$ 50.379,02	25,19%	

Última atualização em: 09/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Teatro	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	6025.2022/0011336-6	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 300.000,00	R\$ 164.304,84	R\$ 46.993,26	R\$ 46.993,26	15,66%
Biblioteca	Biblioteca Helena Silveira	Reforma e requalificação	6025.2022/0008158-8	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 513.000,00	R\$ 600.485,56	R\$ 600.400,35	R\$ 600.400,35	117,04%
Administrativo	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2022/0007056-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 327.591,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2022/0002746-0	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 250.000,00	R\$ 270.002,39	R\$ 42.329,56	R\$ 42.329,56	16,93%
Museu/Acervo	Cripta da Independência	Projeto Executivo de Restauro	6025.2020/0015001-2	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾	R\$ 284.346,00	R\$ 218.015,13	R\$ 218.015,13	R\$ 218.015,13	76,67%
Centro Cultural	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 550.000,00	R\$ 513.076,43	R\$ 497.943,94	R\$ 497.943,94	90,54%
Museu/Acervo	Memorial dos Afritos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3	98.25.13.391.3001.5.421.44906100.08.0 ▾	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.091.703,38	R\$ 8.091.703,38	100,00%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Brasilândia	Implantação da EMIA - Brasilândia	6025.2022/0002632-3	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 140.598,45	R\$ 140.599,91	R\$ 135.808,33	R\$ 135.808,33	96,59%
Centro Cultural	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	Sem processo21	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Última atualização em: 09/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Casa de Cultura	Casa de Cultura M' Boy Mirim	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Itororó	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Casa de Cultura	Casa de Cultura do Itaim Paulista	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Hip-Hop Sul - Cora Coralina	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Museu/Acervo	Casa da Imagem	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%

Última atualização em: 09/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Museu/Acervo	Solar da Marquesa	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Museu/Acervo	Arquivo Histórico Municipal	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Arthur Azevedo	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0016747-7	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Museu/Acervo	Chácara Lane	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%

Última atualização em: 09/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Teatro	Teatro Paulo Eiró	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Centro Cultural	Centro Cultural Santo Amaro	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Cacilda Becker	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Museu/Acervo	Cadopô - Torre da Memória	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%

Última atualização em: 09/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Biblioteca	Biblioteca Alceu Amoroso Lima	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Centro Cultural	Centro Cultural da Diversidade	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Alfredo Mesquita	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Flávio Império	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%

Última atualização em: 09/05/2023									
Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor ajustado	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Centro Cultural	Centro Cultural da Diversidade	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Alfredo Mesquita	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Teatro	Teatro Flávio Império	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾	R\$ 5.000,00	R\$ 4.722,83	R\$ 2.352,12	R\$ 2.352,12	47,04%
Diversos equipamentos	Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo ²⁰	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo ²¹	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.0 ▾	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
44					R\$ 19.585.248,29	R\$ 15.841.169,27	R\$ 14.818.484,60	R\$ 14.818.484,60	75,66%

1. Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas

Restauro e requalificação predial

Ação: Restauro e requalificação predial

Processo: 6025.2019/0003639-0

Valor: R\$ 1.039.500,00

Empenhado: R\$ 724.252,57

Liquidado: R\$ 636.947,09

Pago: R\$ 636.947,09

% de liquidação: 61,27%

Endereço: Rua Murmúrios da Tarde, 211

Distrito: José Bonifacio

Subprefeitura: Itaquera



Fotos tiradas em: 14/03/2023

2. Sítio da Ressaca

Obra de restauro

Ação: Obra de restauro

Processo:

6025.2019/0021342-0

Valor: R\$ 1.426.490,86

Empenhado: R\$ 838.159,75

Liquidado: R\$ 838.159,75

Pago: R\$ 838.159,75

% de liquidação: 58,76%

Endereço: Rua Nadra
Raffoul Mokodsi, 3

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



Fotos tiradas em: 28/02/2023

3. Biblioteca Belmonte

Reforma e requalificação predial

Ação: Reforma e requalificação predial

Processo: 6025.2020/0005987-2

Valor: R\$ 1.252.650,00

Empenhado: R\$ 1.119.937,87

Liquidado: R\$ 1.119.937,79

Pago: R\$ 1.119.937,79

% de liquidação: 89,41%

Endereço: Rua Paulo Eiró, 525

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro



Fotos tiradas em: 20/04/2023

4. Centro Cultural Vila Itororó

Reforma da Cobertura do Galpão

Ação 1: Reforma da Cobertura do Galpão

Processo: 6025.2020/0004294-5

Valor: R\$ 1.199.115,00

Empenhado: R\$ 755.199,49

Liquidado: R\$ 654.500,74

Pago: R\$ 654.500,74

% de liquidação: 54,58%

Endereço: R. Maestro Cardim, 60 - Bela Vista,
São Paulo - SP, 01323-000

Distrito: Bela Vista

Subprefeitura: Sé



Foto tirada em: 05/05/2023

5. Centro Cultural Vila Formosa

Requalificação geral

Ação: Requalificação geral

Processo: 6025.2018/0012899-4

Valor: R\$ 1.896.766,04

Empenhado: R\$ 1.320.072,56

Liquidado: R\$ 1.314.333,79


Pago: R\$ 1.314.333,79

% de liquidação: 69,29%

Endereço: Avenida Renata, 163

Distrito: Vila Formosa

Subprefeitura: Aricanduva-Formosa-Carrão

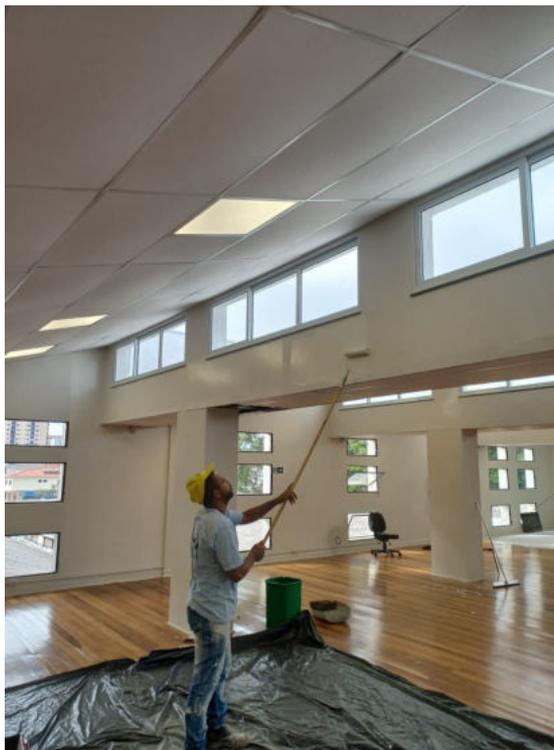

Fotos tiradas em: 24/01/2023

5. Centro Cultural Vila Formosa

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)

Processo: 025.2016/0007782-2

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Avenida Renata, 163

Distrito: Vila Formosa

Subprefeitura: Aricanduva-Formosa-Carrão

Não há relatório fotográfico.



5. Centro Cultural Vila Formosa

Despesa do exercício anterior - Reforma da cobertura e a requalificação com o foco na acessibilidade e na proteção e segurança contra incêndio

Ação: Despesa do exercício anterior - Reforma da cobertura e a requalificação com o foco na acessibilidade e na proteção e segurança contra incêndio

Processo: 6025.2022/0005078-0

Valor: R\$ 98.645,04

Empenhado: R\$ 98.645,04

Liquidado: R\$ 98.645,04

Pago: R\$ 98.645,04

% de liquidação: 100,00%

Endereço: Avenida Renata, 163

Distrito: Vila Formosa

Subprefeitura: Aricanduva-Formosa-Carrão



Fotos tiradas em: 24/01/2023



6. Casa de Cultura Cidade Ademar

Projeto Executivo

Ação: Projeto Executivo

Processo: 6025.2018/0003745-0

Valor: R\$ 305.842,32

Empenhado: R\$ 235.031,28

Liquidado: R\$ 161.750,32



Pago: R\$ 161.750,32

% de liquidação: 52,89%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar

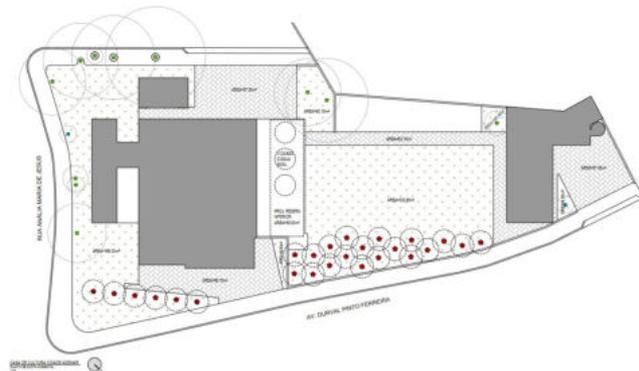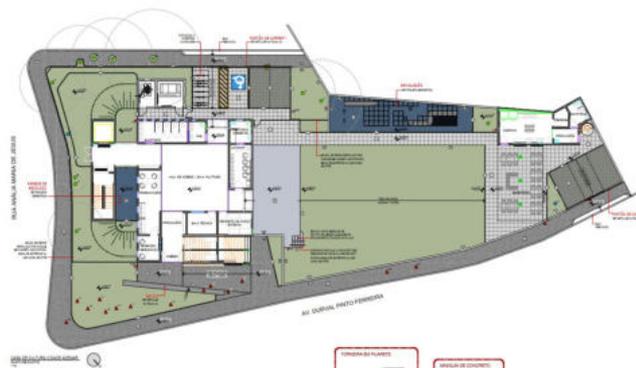

6. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Processo: 6025.2022/0018097-7

Valor: R\$ 700.000,00

Empenhado: R\$ 410.087,47

Liquidado: R\$ 54.981,21

Pago: R\$ 54.981,21

% de liquidação: 7,85%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



Fotos tiradas em: 04/05/2023



7. Casa de Cultura São Mateus

Projeto Executivo

Ação: Projeto Executivo

Processo: 6025.2022/0007515-4

Valor: R\$ 100.000,00

Empenhado: R\$ 39.600,50

Liquidado: R\$ 39.600,50


Pago: R\$ 39.600,50

% de liquidação: 39,60%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus

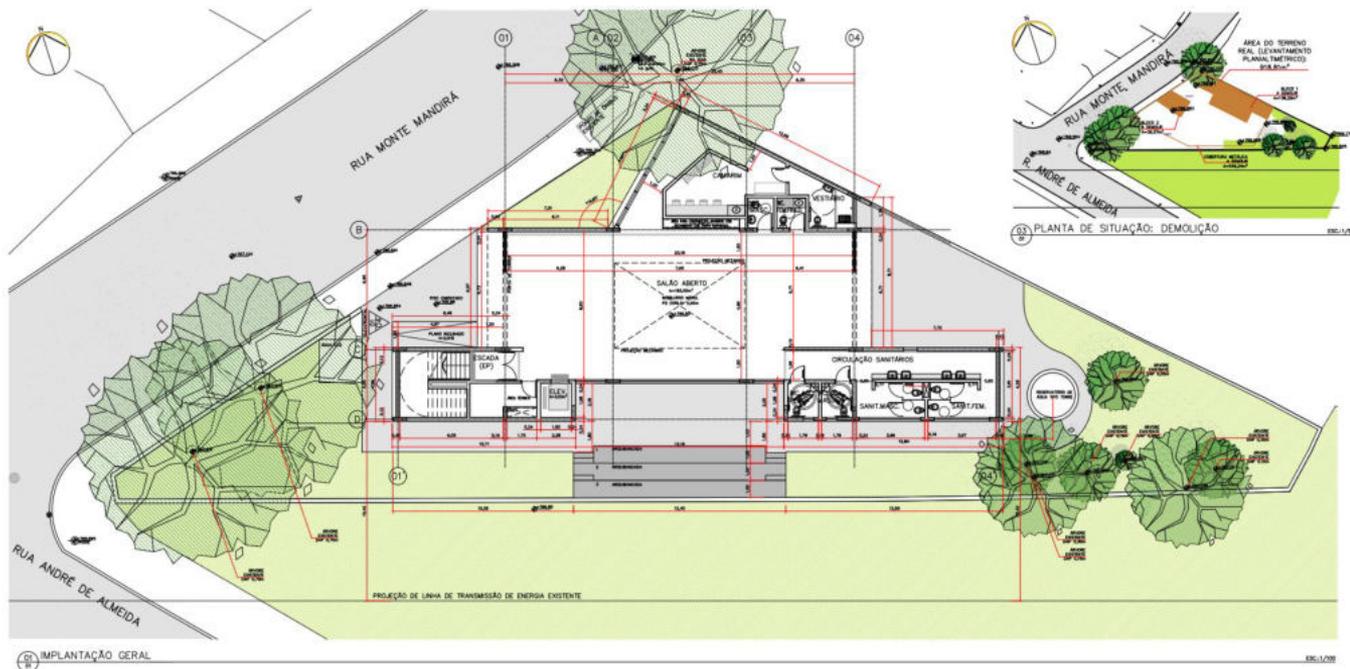

8. Centro Cultural Penha

Palco

Ação: Palco

Processo: 6025.2018/0010299-5

Valor: R\$ 120.000,00

Empenhado: R\$ 180.773,57

Liquidado: R\$ 180.773,57

Pago: R\$ 180.773,57

% de liquidação: 150,64%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha



Fotos tiradas em: 31/10/2022



Foto tirada em: 13/01/2023

8. Centro Cultural Penha

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

Não há relatório fotográfico.



10. Biblioteca Cora Coralina

Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Ação: Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Processo: 6025.2021/0010094-7

Valor: R\$ 200.000,00

Empenhado: R\$ 50.379,02

Liquidado: R\$ 50.379,02

Pago: R\$ 50.379,02

% de liquidação: 25,19%

Endereço: Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113

Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases



Fotos tiradas em: 12/05/2023

11. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

Processo: 6025.2022/0011336-6

Valor: R\$ 300.000,00

Empenhado: R\$ 164.304,84

Liquidado: R\$ 46.993,26




Pago: R\$ 46.993,26

% de liquidação: 15,66%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

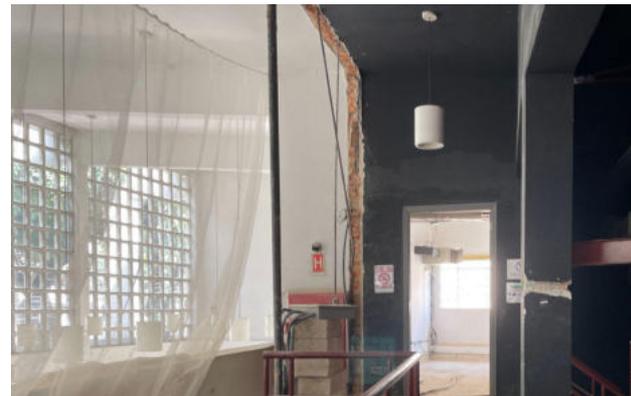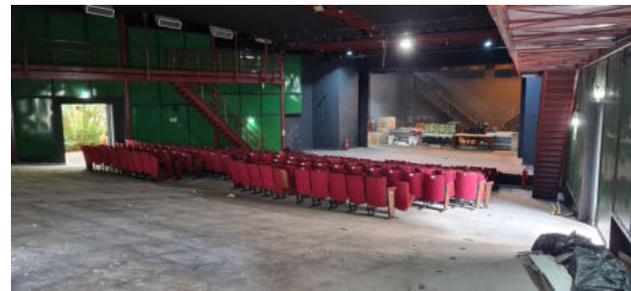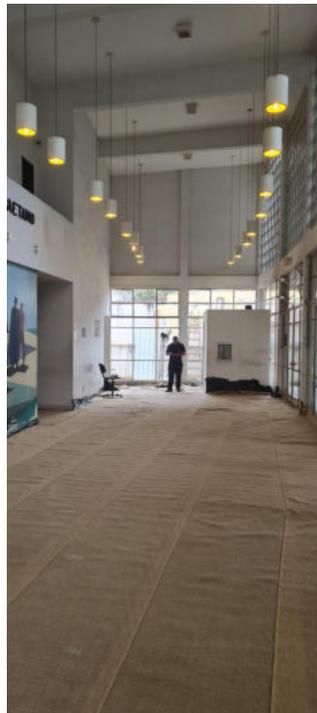

Fotos tiradas em: 31/03/2023

12. Biblioteca Helena Silveira

Reforma e requalificação

Ação: Reforma e requalificação

Processo: 6025.2022/0008158-8

Valor: R\$ 513.000,00

Empenhado: R\$ 600.485,56

Liquidado: R\$ 600.485,56


Pago: R\$ 600.485,56

% de liquidação: 117,04%

Endereço: Rua José Viriato de Castro, 78

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo

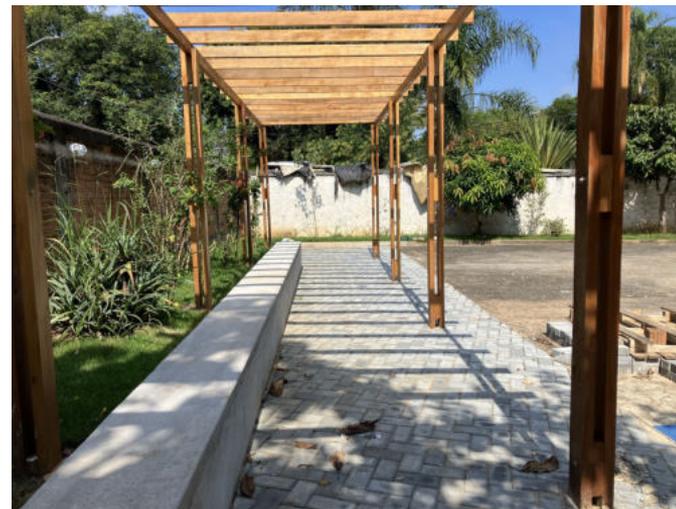

Fotos tiradas em: 04/05/2023

14. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

Ação: Manutenção Predial

Processo: 6025.2022/0002746-0

Valor: R\$ 250.000,00

Empenhado: R\$ 270.002,39

Liquidado: R\$ 42.329,56

Pago: R\$ 42.329,56

% de liquidação: 16,93%

Endereço: Rua Nazle Mauad Lufti, 169

Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros



Fotos tiradas em: 07/01/2023

15. Cripta da Independência

Projeto Executivo de Restauro

Ação: Projeto Executivo de Restauro

Processo: 6025.2020/0015001-2

Valor: R\$ 284.346,00

Empenhado: R\$ 218.015,13

Liquidado: R\$ 218.015,13


Pago: R\$ 218.015,13

% de liquidação: 76,67%

Endereço: Pça. do Monumento, s/no

Distrito: Ipiranga

Subprefeitura: Ipiranga

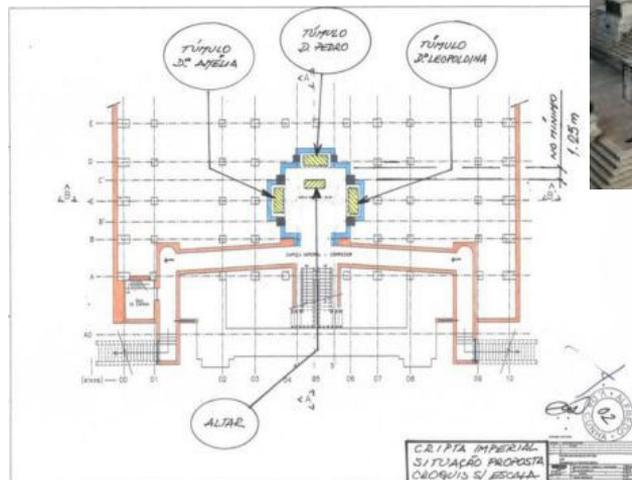

16. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 550.000,00

Empenhado: R\$ 513.076,43

Liquidado: R\$ 497.943,94


Pago: R\$ 497.943,94

% de liquidação: 90,54%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

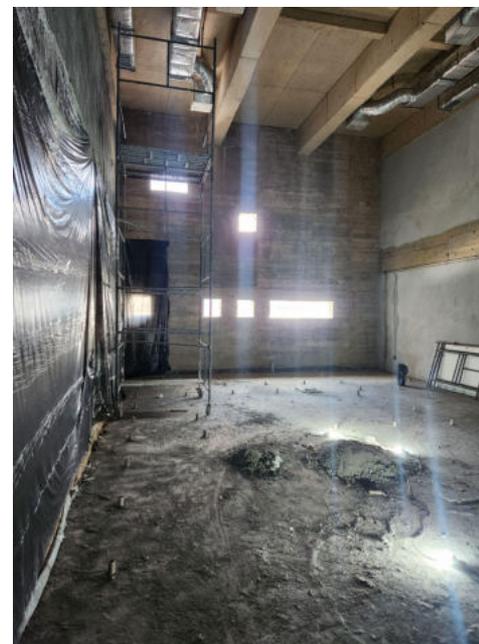

Fotos tiradas em: 19/04/2023

17. Memorial dos Aflitos

Implantação do Memorial

Ação: Implantação do Memorial

Processo: 6025.2019/0015893-3

Valor: R\$ 8.091.703,38

Empenhado: R\$ 8.091.703,38

Liquidado: R\$ 8.091.703,38

Pago: R\$ 8.091.703,38

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº 52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



18. Casa de Cultura Brasilândia

Implantação da EMIA - Brasilândia

Ação: Implantação da EMIA - Brasilândia

Processo: 6025.2022/0002632-3

Valor: R\$ 140.598,45

Empenhado: R\$ 140.599,91

Liquidado: R\$ 135.808,33

Pago: R\$ 135.808,33

% de liquidação: 96,59%

Endereço: Praça Benedita Cavalheiro,
s/nº

Distrito: Freguesia do Ó

Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia



Fotos tiradas em: 04/11/2022

31. Casa da Imagem

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Roberto Simonsen, 136-B

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.



32. Solar da Marquesa

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Roberto Simonsen, 136-B

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.



33. Arquivo Histórico Municipal

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes, 152

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.



34. Teatro Arthur Azevedo

Serviços Corretivos para AVCB e contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca

Não há relatório fotográfico.



35. Chácara Lane

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua da Consolação, 1024

Distrito: Consolação

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.



36. Teatro Paulo Eiró

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 765

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro

Não há relatório fotográfico.



37. Centro Cultural Santo Amaro

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Avenida João Dias, 822

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro

Não há relatório fotográfico.

38. Teatro Cacilda Becker

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Tito, 295

Distrito: Lapa

Subprefeitura: Lapa

Não há relatório fotográfico.



39. Cadopô - Torre da Memória

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes,
152

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.



40. Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777

Distrito: Pinheiros

Subprefeitura: Pinheiros

Não há relatório fotográfico.



41. Centro Cultural da Diversidade

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Cojuba, 45 B

Distrito: Itaim Bibi

Subprefeitura: Pinheiros

Não há relatório fotográfico.



42. Teatro Alfredo Mesquita

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1770

Distrito: Santana

Subprefeitura: Santana-Tucuruvi

Não há relatório fotográfico.



43. Teatro Flávio Império

Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Ação: Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Processo: 6025.2016/0007782-2

Valor: R\$5.000,00

Empenhado: R\$ 4.722,83

Liquidado: R\$ 2.352,12

Pago: R\$ 2.352,12

% de liquidação: 47,04%

Endereço: Rua Professor Alves Pedroso, 600

Distrito: Cangaíba

Subprefeitura: Penha

Não há relatório fotográfico.
