



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
CULTURA

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2023**

---

Planilha e Relatório Fotográfico

# **Prestação de contas do FUNDURB (98.25)**

Execução orçamentária por item do plano aprovado

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

## Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2023			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 4.320.559,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ -	R\$ 320.559,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 9.857.672,28	R\$ 8.107.363,46	R\$ 4.288.990,99	R\$ 549.991,26	R\$ 423.826,08
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 9.815.713,82	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 146.220,35	R\$ 146.220,35
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ -	R\$ 2.640.000,00	R\$ 2.640.000,00	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.511.228,94	R\$ 1.224.642,78	R\$ 1.224.642,78	R\$ 247.248,51	R\$ 247.248,51
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 20.784.088,76	R\$ 16.828.021,90	R\$ 15.432.513,36	R\$ 164.749,92	R\$ 164.749,92
	<b>R\$ 46.292.263,00</b>	<b>R\$ 32.420.587,34</b>	<b>R\$ 26.886.147,13</b>	<b>R\$ 1.108.210,04</b>	<b>R\$ 982.044,86</b>
		<b>70,03%</b>	<b>58,08%</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,12%</b>

\*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 10/05/2023.

Última atualização: 10/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Biblioteca	Biblioteca Nuto Sant'Anna	Reforma geral	6025.2018/0014294-6	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Casa do Caxingui	Cercamento e acessibilidade	6025.2018/0014821-9	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Casa Modernista	Obra de restauro	6025.2019/0009022-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural São Paulo	Reforma dos Banheiros	6025.2019/0021806-5	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Ermelino Matarazzo	Obra de reforma	6025.2019/0014189-5	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Affonso Taunay	Requalificação, pintura geral e manutenção geral de instalação hidráulica	Sem processo 25	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Restauro e Reforma geral da Cobertura	Sem processo 6	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Ipiranga - Chico Science	Reforma da Cozinha	Sem processo 14	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Narbal Fontes	Reforma do Telhado e Restauros pontuais	Sem processo 15	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Mário Schenberg	Construção de novo poço e instalação de elevador	Sem processo 18	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Monteiro Lobato	Reforma e manutenção predial	Sem processo 19	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Sítio da Ressaca	Obra de restauro	6025.2019/0021342-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.200.802,88	R\$ 492.990,99	R\$ 337.958,96	R\$ 276.666,31	28,1%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 8.923.376,20	R\$ 5.940.000,00	R\$ 146.220,35	R\$ 146.220,35	1,6%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Cidade Ademar	Gerenciamento	Sem processo 3	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 892.337,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Última atualização: 10/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Museu/Acervo	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 2.770.583,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Sítio Morrinhos	Restauero, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2018/0015944-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura São Mateus	Projeto Executivo	6025.2022/0007515-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 345.140,18	R\$ 201.997,62	R\$ 54.635,67	R\$ 54.635,67	15,8%
Centro Cultural	Centro Cultural Penha	Palco	6025.2018/0010299-5	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 75.000,00	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	57,6%
Centro Cultural	Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto Executivo de restauro	6025.2019/0024221-7	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 366.694,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Cora Coralina	Requalificação para Acessibilidade e AVCB	6025.2021/0010094-7	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 543.292,19	R\$ 468.855,32	R\$ -	R\$ -	0,0%
Teatro	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.	6025.2022/0011336-6	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 212.032,30	R\$ 147.159,77	5,9%
Biblioteca	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural Tendal da Lapa	Obra de AVCB e Cobertura	Sem processo 16	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Helena Silveira	Reforma e requalificação	6025.2022/0008158-8	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 769.576,05	R\$ 333.234,82	R\$ 66.921,47	R\$ -	8,7%
Administrativo	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2022/0007056-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 327.591,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2022/0002746-0	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 331.316,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Última atualização: 10/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Escola	Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauro e troca da cobertura da Casa 2	Sem processo 5	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 14.385.232,82	R\$ 15.609.875,60	R\$ 247.248,51	R\$ 247.248,51	1,7%
Centro Cultural	Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2021/0000521-0	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.436.228,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Memorial dos Afritos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Memorial dos Afritos	Projeto Executivo	6025.2020/0018377-8	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 320.559,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Teatro	Cine Art Palácio	Requalificação	Sem processo 22	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	6025.2022/0022073-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 404.042,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	Sem processo 26	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	Sem processo 26	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Distritos criativos	Distritos Criativos	Projeto para reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos	Sem processo 8	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Última atualização: 10/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Casa de Cultura	Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Requalificação para acessibilidade e instalação de novo padrão de medição de água e luz na Casa de Cultura	Sem processo 10	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Bibliotecas Cassiano Ricardo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Hans Christian Andersen	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Chácara do Castelo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca	Biblioteca Vicente de Carvalho	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura São Rafael	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura M'Boy Mirim	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura	Casa de Cultura do Itaim Paulista	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Última atualização: 10/05/2023

Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Casa de Cultura	Casa de Cultura Hip-Hop Sul - Cora Coralina	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Casa da Imagem	Obras de conservação de esquadrias e caixilhos de madeira e pintura externa da Casa da Imagem.	Sem processo 11	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Casa da Imagem	Serviços de proteção passiva contra incêndio para Museus - CMAR	Sem processo 11	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Itororó	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Itororó	Reforma da Cobertura do Galpão	6025.2020/0004294-5	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural	Centro Cultural Vila Itororó	Restauo Casa 9 e 10	6025.2021/0006570-0	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Solar da Marquesa	Obras de conservação de esquadrias e caixilhos de madeira da parte histórica do Solar da Marquesa de Santos.	Sem processo 12	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Solar da Marquesa	Serviços de proteção passiva contra incêndio para Museus - CMAR	Sem processo 12	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Museu/Acervo	Arquivo Histórico Municipal	Serviços de proteção passiva contra incêndio para Museus - CMAR	Sem processo 24	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%



Última atualização: 10/05/2023											
Tipo	Equipamento cultural	Ação	Processo	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC		
Teatro	Teatro Arthur Azevedo	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0016747-7	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Museu/Acervo	Chácara Lane	Serviços de proteção passiva contra incêndio para Museus - CMAR	Sem processo 23	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Casa de Cultura	Casa de Cultura Santo Amaro - Manoel Cardoso de Mendonça	Restauo e manutenção predial	6025.2018/0001423-9	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Casa de Cultura	Centro Cultural Santo Amaro	Instalação de Piso Flutuante para dança	6025.2016/0007782-2	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 175.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Teatro	Teatro Cacilda Becker	Reforma da cobertura	Sem processo 17	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Teatro	Teatro Flávio Império	Reforma da cobertura	Sem processo 17	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Teatro	Teatro Arthur Azevedo	Reforma da cobertura	Sem processo 17	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Diversos equipamentos	Diversos Equipamentos - Novo contrato em substituição do existente (não renovável)	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).	Sem processo 13	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Diversos equipamentos	Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo 20	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Diversos equipamentos	Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo 20	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
Diversos equipamentos	Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo 21	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%		
66					R\$ 46.392.263,00	R\$ 26.886.147,13	R\$ 1.108.210,04	R\$ 915.123,39			

## 12. Sítio da Ressaca

Obra de restauro

**Ação:** Obra de restauro

**Processo:** 6025.2019/0021342-0

**Valor:** R\$ 1.200.802,88

**Empenhado:** R\$ 492.990,99

**Liquidado:** R\$ 337.958,96

**Pago:** R\$ 276.666,31

**% de liquidação:** 28,1%

**Endereço:** Rua Nadra Raffoul  
Mokodsi, 3

**Distrito:** Jabaquara

**Subprefeitura:** Jabaquara



*Fotos tiradas em: 28/02/2023*

# 13. Casa de Cultura Cidade Ademar

## Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

**Ação:** Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

**Processo:** 6025.2022/0018097-7

**Valor:** R\$ 8.923.376,20

**Empenhado:** R\$ 5.940.000,00

**Liquidado:** R\$ 146.220,35

**Pago:** R\$ 146.220,35

**% de liquidação:** 1,6%

**Endereço:** Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

**Distrito:** Cidade Ademar

**Subprefeitura:** Cidade Ademar



Fotos tiradas em: 04/05/2023



# 16. Casa de Cultura São Mateus

## Projeto Executivo

**Ação:** Projeto Executivo

**Processo:** 6025.2022/0007515-4

**Valor:** R\$ 345.140,18

**Empenhado:** R\$ 201.997,62

**Liquidado:** R\$ 54.635,67


**Pago:** R\$ 54.635,67

**% de liquidação:** 15,8%

**Endereço:** Rua Monte Mandirá, 40

**Distrito:** São Mateus

**Subprefeitura:** São Mateus

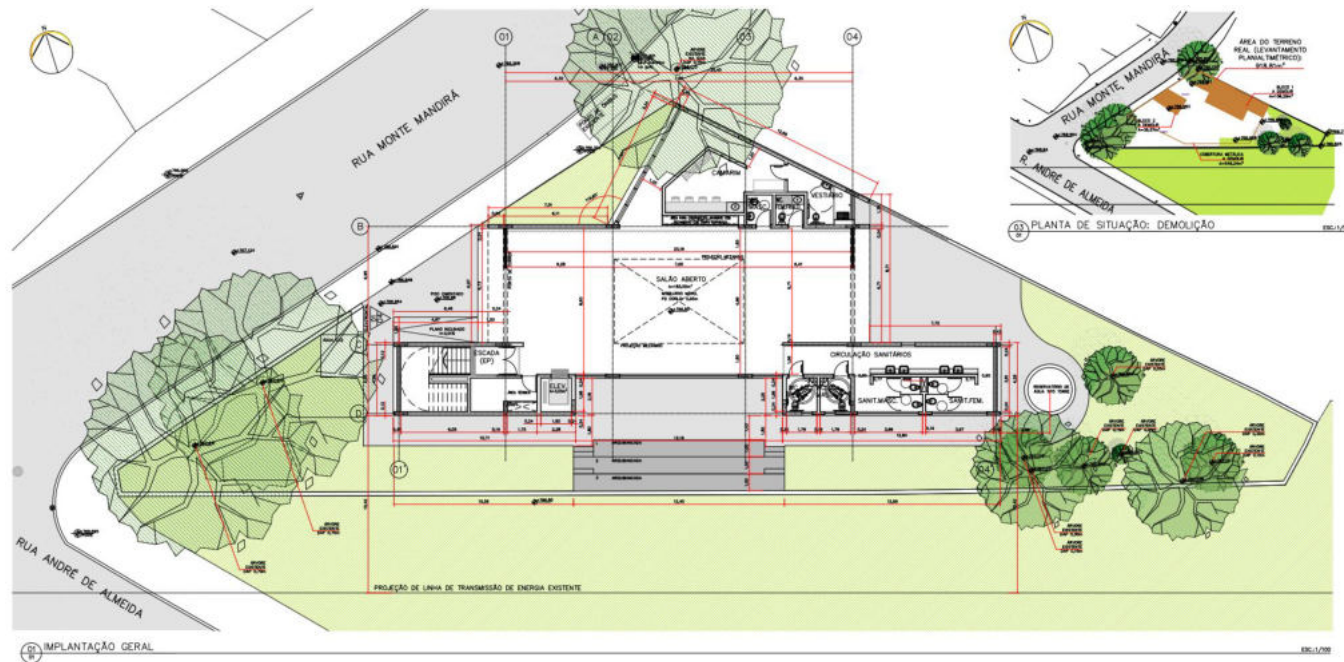

# 17. Centro Cultural Penha

## Palco

**Ação:** Palco

**Processo:** 6025.2018/0010299-5

**Valor:** R\$ 75.000,00

**Empenhado:** R\$ 43.192,78

**Liquidado:** R\$ 43.192,78


**Pago:** R\$ 43.192,78

**% de liquidação:** 57,6%

**Endereço:** Largo do Rosário, 20

**Distrito:** Penha

**Subprefeitura:** Penha

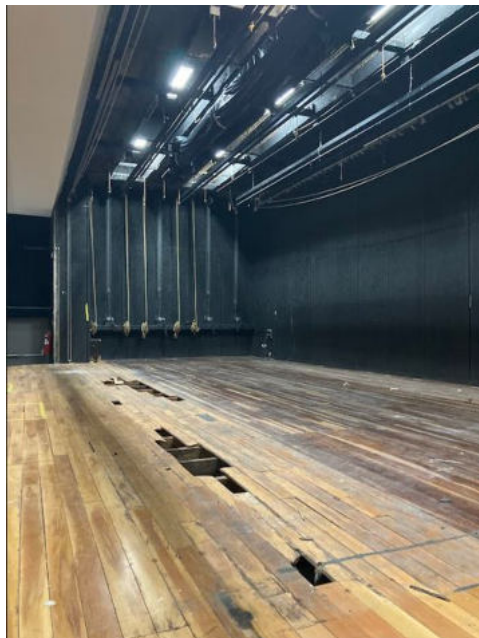

*Fotos tiradas em: 31/10/2022*



*Foto tirada em: 13/01/2023*

**Ação:** Requalificação para Acessibilidade e AVCB

**Processo:** 6025.2021/0010094-7

**Valor:** R\$ 543.292,19

**Empenhado:** R\$ 468.855,32

**Liquidado:** R\$ 0

**Pago:** R\$ 0

**% de liquidação:** 0%

**Endereço:** Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113

**Distrito:** Guaianases

**Subprefeitura:** Guaianases

# 19. Biblioteca Cora Coralina

## Requalificação para Acessibilidade e AVCB



Fotos tiradas em: 12/05/2023

## 20. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,  
Conservação e Restauro.

**Ação:** Reforma geral para Acessibilidade,  
Segurança contra incêndio, Conservação e  
Restauro

**Processo:** 6025.2022/0011336-6

**Valor:** R\$ 3.600.000,00

**Empenhado:** R\$ 3.600.000,00

**Liquidado:** R\$ 212.032,30




**Pago:** R\$ 147.159,77

**% de liquidação:** 5,9%

**Endereço:** Rua Borges Lagoa, 650

**Distrito:** Vila Mariana

**Subprefeitura:** Vila Mariana

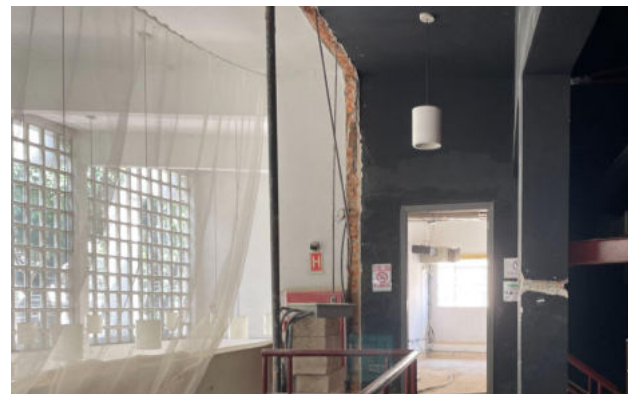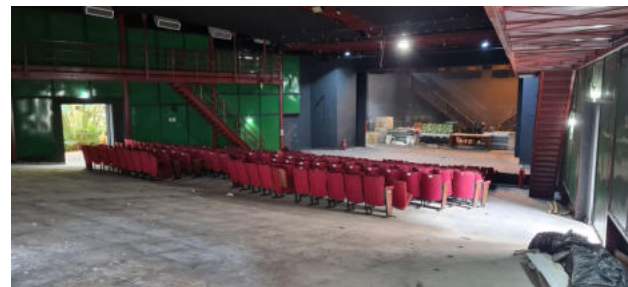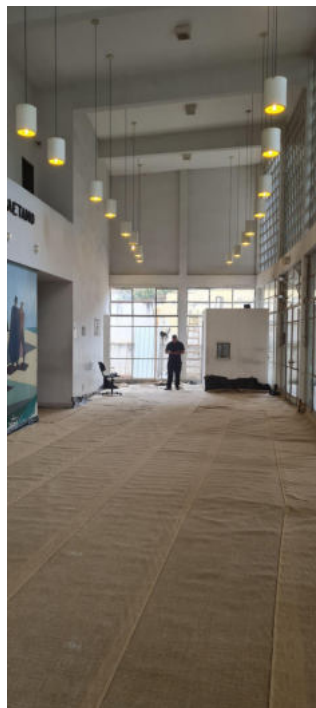

Fotos tiradas em: 31/03/2023

## 23. Biblioteca Helena Silveira

Reforma e requalificação

**Ação:** Reforma e requalificação

**Processo:** 6025.2022/0008158-8

**Valor:** R\$ 769.576,05

**Empenhado:** R\$ 333.234,82

**Liquidado:** R\$ 66.921,47

**Pago:** R\$ 0

**% de liquidação:** 8,7%

**Endereço:** Rua José Viriato de Castro, 78

**Distrito:** Campo Limpo

**Subprefeitura:** Campo Limpo



Fotos tiradas em: 04/05/2023



## 27. Praça das Artes

### 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

**Ação:** 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

**Processo:** 8510.2022/0000503-4

**Valor:** R\$ 14.385.232,82

**Empenhado:** R\$ 14.385.232,82

**Liquidado:** R\$ 0


**Pago:** R\$ 0

**% de liquidação:** 0%

**Endereço:** Avenida São João, 281

**Distrito:** República

**Subprefeitura:** Sé

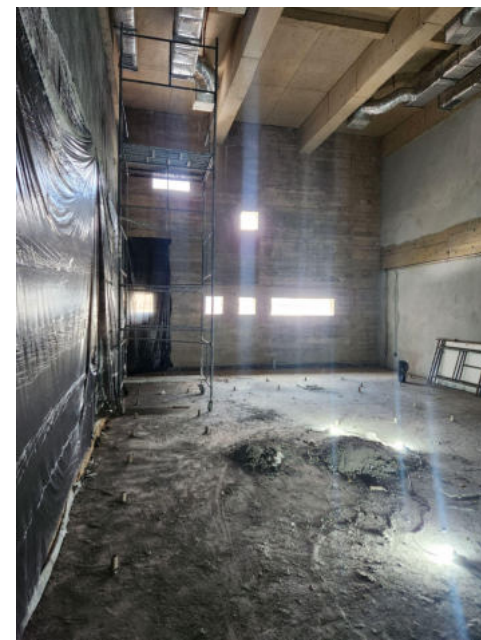

Fotos tiradas em: 19/04/2023

## 27. Praça das Artes

### 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

**Ação:** 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

**Processo:** 8510.2022/0000503-4

**Valor:** R\$ 1.436.228,94

**Empenhado:** R\$ 1.224.642,78

**Liquidado:** R\$ 247.248,51

**Pago:** R\$ 247.248,51

**% de liquidação:** 17,2%

**Endereço:** Avenida São João, 281

**Distrito:** República

**Subprefeitura:** Sé

**Não há relatório fotográfico.**

# 45. Teatro Arthur Azevedo

## Serviços Corretivos para AVCB

**Ação:** Serviços Corretivos para AVCB

**Processo:** 6025.2018/0016747-7

**Valor:** R\$ 196.000,00

**Empenhado:** R\$ 196.000,00

**Liquidado:** R\$ 0

**Pago:** R\$ 0

**% de liquidação:** 0%

**Endereço:** Avenida Paes de Barros, 955

**Distrito:** Mooca

**Subprefeitura:** Mooca

**Não há relatório fotográfico.**
