

PLANO DE INVESTIMENTO - 2021
SIURB X FUNDURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS – COM PEDIDO DE
ADEQUAÇÃO DO PLANO



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – COM PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO APENAS COM REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE OBJETOS APROVADOS.

MOBILIDADE / VIÁRIO / OAE's / OUTROS	PLANO APROVADO COM PROPOSTA DE REMANEJAMENTO			2021 - Execução Orçamentária Dados extraídos dia Maio/2022		
	PLANO APROVADO NA RESOL. 009/2021	PROPOSTA DE REMANEJAMENTO	TOTAL APÓS REMANEJAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$
Assentamento / Empreendimento						
Corredor Itaquera I - 30% Mobilidade	200.000,00	167.548,31	367.548,31			
Corredor Itaquera II - 30% Mobilidade	200.000,00	-189.940,00	10.060,00	10.060,00	8.244,00	8.244,00
Terminal Itaquera - 30% Mobilidade	500.000,00	-77.412,96	422.587,04	417.548,31	274.550,80	274.550,80
Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia - 30% Mobilidade	100.000,00	199.804,65	299.804,65	299.804,65		
Corredor Radial Leste - Trechos 1, 2 e 3 - 30% Mobilidade	100.000,00	-100.000,00	0,00			
Corredor Aricanduva - 30% Mobilidade	4.552.240,64		4.552.240,64	4.552.240,64	1.330.103,48	1.330.103,48
Corredor Chuchi Zaindan - 30% Mobilidade	200.000,00		200.000,00			
Req. Av. Itapeperica - 30% Mobilidade	1.000.000,00		1.000.000,00			
Req. Av. Imirim - 30% Mobilidade	1.000.000,00		1.000.000,00	128.615,73		
Req. Av. Amador Bueno - 30% Mobilidade	1.000.000,00		1.000.000,00	572.268,02		
Req. Av. Santo Amaro (Não OUFL) - 30% Mobilidade	1.656.942,70		1.656.942,70			
Req. Av. Interlagos - 30% Mobilidade	1.500.000,00		1.500.000,00			
Ponte Graúna-Gaiotas - 30% Mobilidade	17.000.000,00		17.000.000,00	7.066.734,42	385.417,16	385.417,16
Nova Ligação Pirituba-Lapa - 30% Mobilidade	8.047.759,36		8.047.759,36	3.109.861,26	1.732.796,29	1.732.796,29
Calçadão - Triângulo Histórico - 30% Mobilidade	5.000.000,00		5.000.000,00	2.215.088,12	1.630.628,00	1.630.628,00
Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais - OAE - 30% Mobilidade	46.647.224,01	-553.113,87	46.094.110,14	27.212.692,92	26.719.998,64	26.719.998,64
Inspeções e programa de requalificação em pontes, viadutos, túneis, passarelas, etc (OAE)	29.244.700,29		29.244.700,29	29.244.700,29	27.024.040,83	27.024.040,83
Minhocão	1.000.000,00	-583.705,02	416.294,98	416.294,98	416.294,98	416.294,98
Intervenções no Sistema Viário (Ligações e Obras Complementares)	8.251.649,60	5.417.279,75	13.668.929,35	13.668.929,35	13.668.018,03	13.668.018,03
Mobilidade - Trabalho Social e Cadastramento	1.000,00	-1.000,00	0,00			
Gerenciamento	8.672.003,00	3.075.739,69	11.747.742,69	11.747.742,69	11.746.572,82	11.746.572,82
Intervenções em próprios municipais.	1.117.973,41	-1.158,29	1.116.815,12	1.116.815,12	1.116.813,58	1.116.813,58
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.000,00	-1.000,00	0,00			
Ligações elétricas e remoção de interferências no Vale do Anhangabaú	509.957,68		509.957,68	509.957,68	509.957,68	509.957,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

MOBILIDADE / VIÁRIO / OAE's / OUTROS	PLANO APROVADO COM PROPOSTA DE REMANEJAMENTO			2021 - Execução Orçamentária Dados extraídos dia Maio/2022		
	PLANO APROVADO NA RESOL. 009/2021	PROPOSTA DE REMANEJAMENTO	TOTAL APÓS REMANEJAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$
Assentamento / Empreendimento						
Obra de Emergência - Recuperação de Margem e Recomposição de Taludes Córrego Jardim Letícia	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.551,32	1.960.551,32
Obra de Emergência - Contenção de Margens e Escorregamento de Taludes do Córrego Itaquera-Mirim	2.000.000,00	2.047.754,42	4.047.754,42	4.047.754,42	4.046.097,00	4.046.097,00
Obra de Emergência - recuperação das margens e contenção de taludes do córrego Caguacu	2.000.000,00	1.429.000,00	3.429.000,00	3.429.000,00	3.428.723,32	3.428.723,32
Obras Emergenciais para recomposição das margens do Córrego Jaguarezinho, localizado junto à Ria Deoclício Alves de Souza e Av. Dr. Silvio Margarido	2.900.000,00	-2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Obras Emergenciais para recomposição do passeio público, guias, sarjetas e sistema de Drenage de Águas Pluviais, obra de estabilização de talude entre a Rua ilha dos Papagaios X Rua Girassol Miúdo - Água Vermelha	4.573.197,30	1.965.948,18	6.539.145,48	6.539.145,48	5.505.493,79	5.505.493,79
Obra de Emergência - recuperação de recuperação dos muros de gabiões as margens do Córrego Morro Grande	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00			
Obra de Emergência - recuperação da margem e recomposição de taludes do Córrego Moenda	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00			
Obra de Emergência - EMF Chácara Sonho Azul (Contenção de talude e drenagem)	4.212.530,80	-4.212.530,80	0,00			
Obra de Emergência - Recolocação das testeiças deslocadas, na posição correta, que apresentam risco iminente de queda e revisão da fixação das demais	1.392.441,87	-1.392.441,87	0,00			
Obra de Emergência - Recuperação da Margem do Córrego Itararé - Trecho Av. Frei Macário de São João X Av. Gethsemani	4.357.804,58	3.329.311,10	7.687.115,68	7.687.115,68	7.687.115,68	7.687.115,68
Obra de Emergência - Recuperação de Galeria de águas pluviais, localizada na rua André-Lens	2.347.552,68	-2.347.552,68	0,00			
Obra de Emergência - Recomposição da Galeria de Águas Pluviais, na Rua Vascoelos Drummont	3.878.017,70	1.000.000,00	4.878.017,70	4.878.017,70	4.877.839,63	4.877.839,63
Obra de Emergência - Recuperação e Recomposição das margens do Córrego Diniz	533.013,98	-533.013,98	0,00			
Obra de Emergência - Recuperação parcial da margem direita do Córrego rola moça	2.775.217,65	-2.775.217,65	0,00			
Obra de Emergência - muros de arrimo e divisas dos fundos e lateral esquerda CEI Jd. Arpoador	398.740,27	-398.740,27	0,00			
Obra de Emergência - recuperação da GAP e canalização do córrego Maranhão	4.500.000,00	5.484.336,30	9.984.336,30	9.984.336,30	9.967.454,56	9.967.454,56
Obra de Emergência - recuperação e contenção de muro em gabião - Av. Inajar de Souza, Altura do n.º 6000	3.100.000,00	3.487.554,42	6.587.554,42	6.587.554,42	6.587.549,52	6.587.549,52
Obra de Emergência - recuperação de taludes, reoperação das escadarias e preenchimento dos vazios com solo de cimento injetado sob pressão - Ponte do Socorro	2.494.347,91	-1.202.505,57	1.291.842,34	1.291.842,34	1.291.810,01	1.291.810,01
Obra de Emergência - recomposição de talude e via comprometida Rua José Martins Veiga nº 549	1.628.956,32	-410.689,10	1.218.267,22	1.218.267,22	1.218.267,21	1.218.267,21
Obra de Emergência - recomposição de talude e via comprometida Rua Valter Miranda de Bitencourt	3.100.000,00	3.492.124,68	6.592.124,68	6.592.124,68	6.116.310,22	6.116.310,22
Obra de Emergência - Recuperação da Margem do Córrego e Contenção de Talude - Rua Pacari da Mata	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Obra de Emergência - Recuperação da Margem do Córrego e Contenção de Talude - Rua Rio Araranga	3.100.000,00	204.406,62	3.304.406,62	3.304.406,62	3.303.265,29	3.303.265,29
Obra de Emergência - Rua Clodomiro de Oliveira - Morro da Lua Contenção do talude	3.100.000,00	-2.360.786,06	739.213,94	739.213,94	735.189,14	735.189,14
Obra de emergência - Rua Lopes da Costa - recuperação dos encontros da ponte em suas duas extremidades	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00			
Obra de Emergência - Rua Manuel Luna - Contenção de Talude	2.849.986,59		2.849.986,59	2.849.986,59	2.849.265,78	2.849.265,78
Obra de Emergência - EMEI TOMAS GALHARDO, rua Inácio Pinto Lima, n.º 79, contenção de talude e recuperação da rede de drenagem	2.360.000,00	-2.360.000,00	0,00			
Obra de Emergência - CEI VILA MARILENA - contenção de talude, construção do muro de arrimo e sistema de drenagem	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00			
TOTAL FUNDURB	209.604.258,34	0,00	209.604.258,34	167.038.119,57	149.738.368,76	149.738.368,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Corredores e Terminal Itaquera I e II - 30% Mobilidade

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Corredor e Terminal Itaquera I	422.587,04	274.550,80
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento

- Prestação de Serviços Técnicos Especializados para assistência e subsídio de informações na implantação do Corredor e Terminal



Integração:

1. Terminal de Ônibus Vila Carrão
2. Terminal / Estação Itaquera (Linha 3 Metrô / Linha 11 CPTM)

Composição da Obra:

3. Obra de arte: Viaduto Eixos 1 e 2 Av. Aricanduva sobre Av. Itaquera.

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Corredor Itaquera II	10.060,00	8.244,00
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em análise

- Pagamento de tarifas de reprogramação, publicação e reanálise da Caixa Econômica Federal



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Corredor Aricanduva - 30% Mobilidade

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
------	--	----------


Corredor Aricanduva	4.552.240,64	1.330.103,48
---------------------	--------------	--------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	- Elaboração do Projeto Executivo
--------------	-----------------------------------

SUBPREFEITURAS:

1. Aricanduva/Formosa/Carrão; 2. Penha; 3. Itaquera, 4. Itaim e 5. São Mateus

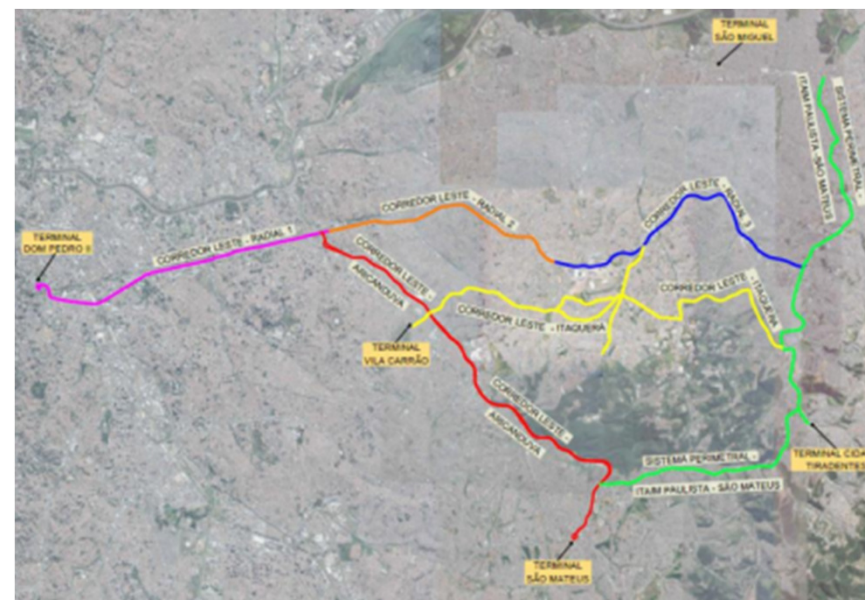

- ✓ **Corredor Aricanduva** – Corredor Leste - Aricanduva – possui 13,7 km de extensão, com início na Radial Leste 1, passando pelas áreas das subprefeituras Aricanduva e São Mateus. Compõem-se de uma sequência de vias desenvolvendo-se no sentido Sudeste a partir da confluência com a Radial Leste até o Terminal São Mateus da EMTU. O Corredor Leste Aricanduva permitirá interligação com os outros corredores de ônibus do programa: Corredores Radial Leste 1 e 2, Corredor Leste-Itaquera e Perimetral Itaim-São Mateus.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Ponte Graúna-Gaivotas - 30% Mobilidade

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
------	--	----------

Ponte Graúna-Gaivotas	17.000.000,00	385.417,16
-----------------------	---------------	------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	- Elaboração do Projeto Executivo
--------------	-----------------------------------

SUBPREFEITURAS:

1. Capela do Socorro

- ✓ O empreendimento denominado Integração viária Graúna-Gaivotas do Programa Municipal de Investimentos e Ações para a Melhoria do Transporte Público Coletivo e do Trânsito para a Cidade de São Paulo integrará os eixos: Corredor Sabará, Corredor Miguel Yunes, Corredor Gaivotas e Corredor Belmira Marin.
- ✓ A integração viária Graúna-Gaivotas através de Ponte e acessos dará suporte aos eixos viários existentes na região sul, com características de corredores de ônibus, visando uma melhor distribuição do tráfego nas regiões do Grajaú, Interlagos, Capela do Socorro, Santo Amaro e Marginal Pinheiros.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Ligação Pirituba-Lapa - 30% Mobilidade

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
------	--	----------

Ligação Pirituba-Lapa	8.047.759,36	1.732.796,29
-----------------------	--------------	--------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	- Projeto Executivo e Obras
--------------	-----------------------------

SUBPREFEITURAS:

1. Pirituba e 2. Lapa



Dezembro/21



Dezembro/21



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Calçada – Triângulo Histórico e Quadrilátero **30% Mobilidade**

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Calçada – Triângulo Histórico e Quadrilátero	5.000.000,00	1.630.628,00
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	- Projeto Executivo e Obras	

SUBPREFEITURAS:

1. Sé



Figura 1 – Área de Abrangência e Fases de Execução

A Fase 1 compreende as ruas 3 de Dezembro, João Bricola, trecho da XV de Novembro e Praça Antônio Prado.

A Fase 2 corresponde às ruas: São Bento, do Comércio, trecho da XV de Novembro, Miguel Couto, Largo do Café, Rua Álvares Penteado, Rua Direita, Rua Quintana, Largo da Misericórdia, Rua Anchieta, Praça Manoel da Nóbrega, Rua José Bonifácio, Rua Quintino Bocaiuva, Rua Barão de Paranapiacaba, Rua do Tesouro, Rua Benjamin Constant, Rua Boa Vista, Rua Libero Badaró e Largo São Francisco.

A área de abrangência da presente contratação é a Fase 2 da intervenção, exceto para os serviços relacionados às disciplinas indicadas abaixo, cujos produtos deverão ser desenvolvidos para a área completa do Triângulo Histórico, ou seja, a área da Fase 1 e da Fase 2:



Figura 1 – Área de Abrangência

A área de abrangência do Perímetro Centro Histórico República equivale a 37.785 m² e inclui toda a extensão das ruas Basílio da Gama e 24 de Maio, os calçadões das ruas Marconi, Barão de Itapeiranga, Dom José de Barros, Sete de Abril, Gabus Mendes, Conselheiro Crispiniano e ainda as calçadas limítrofes do perímetro nas ruas Xavier de Toledo, Bráulio Gomes, Sete de Abril, Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Avenida Ipiranga.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	46.094.110,14	26.719.998,64

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Obras de recuperação, reforço e juntas de dilatação.

SUBPREFEITURAS:

1. Pinheiros; 2. Mooca; 3. Ipiranga; 4. Butantã; 5. Lapa; 6. Santo Amaro; 7. Sé e 8. Jabaquara

- Viaduto T05 - Marginal Pinheiros
- Pontilhão de ligação da Av. Dr. Assis Ribeiro com a Av. Jacu Pêssego
- Ponte sob Rio Verde - Avenida Imperador x Avenida Jacu
- Viaduto de Interligação Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo- Consolação
- Passarela de pedestres sobre trilhos da CPTM
- Viaduto Ladeira do Xisto
- Ponte João Dias
- Ponte do Piqueri (Joelmir Beting)
- Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães
- Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães
- Ponte Domingos Franciulli Netto.
- Viaduto Pires do Rio
- Viaduto Gazeta do Ipiranga
- Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie
- Túnel Jânio Quadros
- Complexo Viário Aurélio Batista Félix
- Pontilhão na marginal tietê com Av. José Maria de Faria - pista central
- Viaduto Bresser

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

Viaduto T-05



Viaduto Bresser



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade


Viaduto Gazeta do Ipiranga



Jul/21



Av. dos Tajurás sobre o Túnel Jânio Quadros

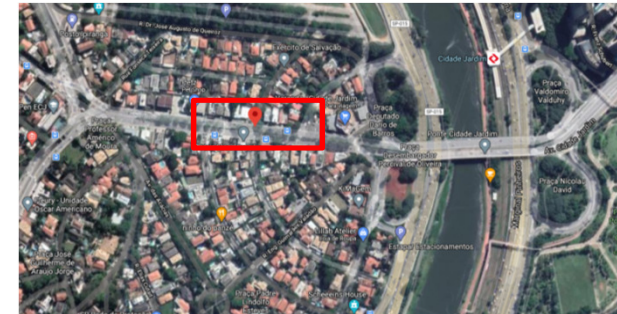

Jun/21


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

Pontilhão Marginal Tiete



Nov/21

VD. DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES

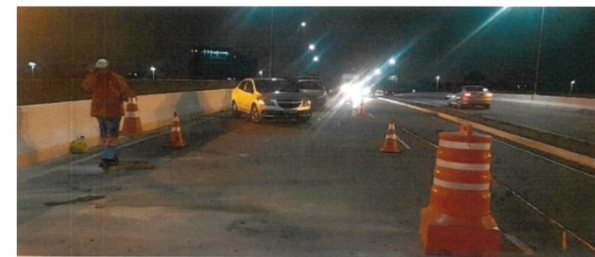

Jun/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

**VIADUTO RAIMUNDO PEREIRA
DE MAGALHÃES**



Ago/21

PONTE DO PIQUERI



Jul/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

**PONTE DOMINGOS FRANCIULLI
NETO**



Jul/21

**COMPLEXO VIÁRIO ESCOLA DE ENGENHARIA
MACKENZIE**



Jul/21


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

Viaduto Aurélio Batista Félix



Out/21

Viaduto Pires do Rio

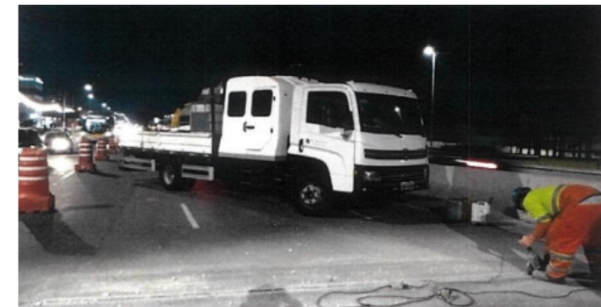

Nov/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

Ladeira do Xisto



PONTE JOÃO DIAS



Jun/21



Jun/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's 30% Mobilidade

Pontilhão de ligação da Av. Dr. Assis Ribeiro com a Av. Jacu Pêssego



Maí/21


Ponte sobre o Rio Verde - Avenida Imperador x Avenida Jacu



Jul/21



Nov/21

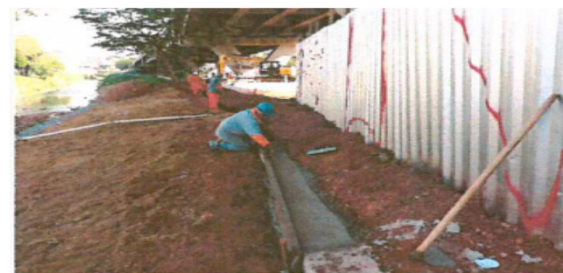

Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

Viaduto de Interligação Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo-Consolação



Ago/21



Dez/21

Passarela de pedestres sobre trilhos da CPTM



Out/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - OAE's – Inspeções Especiais

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
------	-----------------------------	----------

Inspeções e programa de requalificação em pontes, viadutos, túneis, passarelas, etc (OAE) 29.244.700,29 27.024.040,83

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento

- Inspeções especiais em pontes, viadutos, túneis, passarelas, etc (OAE's)

1	Beneficência Portuguesa.	27	Ponte Transamérica	53	Viaduto da China.	79	Viaduto General Euclides Figueiredo
2	Complexo Sem. Antônio Emygdio de Barros Filho	28	Ponte Vitorino Goulart da Silva.	54	Viaduto Deputado Ulysses Guimarães.	80	Viaduto Guadalajarajara
3	Complexo Viário Aurélio Batista Félix.	29	Pontes dos Remédios	55	Viaduto do Café	81	Viaduto Guilherme de Almeida
4	Complexo Viário Escola Engº Mackenzie	30	Pontes João Dias	56	Viaduto do Chá	82	Viaduto Honestino Monteiro Guimarães
5	Complexo Viário Jacú Pêssego	31	Pontilhão Raimundo Pereira de Magalhães.	57	Viaduto Domingos de Moraes.	83	Viaduto Incinerador Vergueiro.
6	Complexo Viário João Jorge Saad	32	Viaduro Gov. Roberto Abreu Sodré	58	Viaduto Dona Matilde	84	Viaduto Jabaquara
7	Complexo Viário Maria Maluf	33	Viaduto Antonio Sanches de Lagaroti Júnior.	59	Viaduto Dona Mora Guimarães	85	Viaduto Jacarei.
8	Elevado Minhocão.	34	Viaduto Diário Popular	60	Viaduto Dona Paulina	86	Viaduto Jacu Pessêgo.
9	Passarela Ciccilo Matarazzo	35	Viaduto 25 de Março - OAE	61	Viaduto dos Bandeirantes	87	Viaduto João Beizola
10	Passarela Dr. Emilio Athiê (Incor)	36	Viaduto 31 de Março	62	Viaduto dos Imigrantes.	88	Viaduto João Julião C. Aguiar
11	Ponte Anhembí	37	Viaduto Alberto Badra.	63	Viaduto Doutor Eusébio Stevaux	89	Viaduto José Colassuonno
12	Ponte Aricanduva	38	Viaduto Antártica.	64	Viaduto Doutor Manuel José Chaves	90	Viaduto Luiz Alfredo Falcão Bauer
13	Ponte Bernado Goldfarb.	39	Viaduto Antonio Abdo.	65	Viaduto Dr. Arnaldo	91	Viaduto Major Quedinho.
14	Ponte da Av. Santos Dumont	40	Viaduto Antonio Nakashima	66	Viaduto Dr. Eduardo Saiegh	92	Viaduto Martinho Prado
15	Ponte da Vila Guilherme	41	Viaduto Antônio Sylvio Cunha Bueno	67	Viaduto Dr. João Tranchesi.	93	Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro
16	Ponte do Arujá	42	Viaduto Arapuã	68	Viaduto Dr. Plínio de Queiroz	94	Viaduto na Av. Olavo Fontoura sobre Av. Assis Ribeiro.
17	Ponte do Guarapiranga.	43	Viaduto Armando Puglisi	69	Viaduto Elias Nagib Brein	95	Viaduto Naor Guelfi.
18	Ponte do Limão.	44	Viaduto Ary Torres.	70	Viaduto Eng. Antonio de Carvalho Aguiar	96	Viaduto Nove de Julho
19	Ponte do Morumbi.	45	Viaduto Autregésilo de Athayde	71	Viaduto Eng. Orlando Murgel	97	Viaduto Pacaembu.
20	Ponte Estaiada (Otavio Frias de Oliveira)	46	Viaduto Borges Lagoa	72	Viaduto Euclides Figueiredo	98	Viaduto Pacheco Chaves.
21	Ponte Estaiada Av. do Estado	47	Viaduto Brigadeiro Luis Antonio.	73	Viaduto Florêncio de Abreu	99	Viaduto Padre Adelino.
22	Ponte Júlio de Mesquita Neto	48	Viaduto Cadeião.	74	Viaduto Frederico Eduardo Mayr	100	Viaduto Paraíso
23	Ponte Jurubatuba	49	Viaduto Carlito Maia.	75	Viaduto Gal Milton Tavares de Souza.	101	Viaduto Paulina
24	Ponte Piqueri	50	Viaduto Carlos de Campos	76	Viaduto Gal. Couto de Magalhães	102	Viaduto Pedro de Toledo
25	Ponte Santos Dias da Silva	51	Viaduto Cidade Osaka.	77	Viaduto Gal. Marcondes Salgado	103	Viaduto Rodovia Imigrantes.
26	Ponte Senador José Ermirio de Moraes	52	Viaduto Condessa de São Joaquim	78	Viaduto Gasômetro	104	Viaduto Romero Zander
						105	Viaduto Santa Efigênia
						106	Viaduto Santo Amaro
						107	Viaduto São Carlos.
						108	Viaduto Sumaré.
						109	Viaduto Washington Luiz

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Minhocão

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Minhocão	416.294,98	416.294,98

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Implantação de gradil metálico no elevado Presidente João Goulart.

SUBPREFEITURAS:
1 - Sé



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Intervenções no Sistema Viário

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Intervenções no Sistema Viário (Ligações e Obras Complementares)	13.668.929,35	13.668.018,03
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	Obras - Avenida Jacú Pêssego - Contenção de talude e ref. do Viário - Av. 9 de Julho - Troca da grelha - Viário nos encontros da ponte sobre o Córrego Tremembé - Avenida Jardim Japão, nº 1493/1462 - Talude e reforço viário	
SUBPREFEITURAS:		

1 – Sé, 2 – Itaquera, 3 – Tremembé e 4 – Vila Maria.



Ago/21



Dez/21



Dez/21



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Intervenções em Próprios Municipais

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Intervenções em Próprios Municipais	1.116.815,12	1.116.813,58
ESTÁGIO	AÇÃO	
Concluído	Obras – 1 -Contenção e recomposição de talude muro na UPA Parelheiros. 2 - Demolição de Fachada de Edifício na Av. Santo Amaro nº 908.	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Parelheiros e 2 – Santo Amaro.		



Nov/21



Mai/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Jardim Leticia

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Jardim Leticia	2.000.000,00	1.960.551,32

ESTÁGIO	AÇÃO
Em Andamento	Obra de Emergência - Recuperação de Margem e Recomposição de Taludes Córrego Jardim Leticia

SUBPREFEITURAS:
1 – M'Boi Mirim



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Itaquera-Mirim

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Itaquera-Mirim	4.047.754,42	4.046.097,00

ESTÁGIO	AÇÃO
Em Andamento	Obra de Emergência - Contenção de Margens e Escorregamento de Taludes do Córrego Itaquera-Mirim

SUBPREFEITURAS:
1 – Guaianases



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Caguaçu

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Caguaçu	3.429.000,00	3.428.723,32
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - recuperação das margens e contenção de taludes do córrego Caguaçu.	

SUBPREFEITURAS:

1 – São Mateus



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Jaguarezinho

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Jaguarezinho	500.000,00	500.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obras Emergenciais para recomposição das margens do Córrego Jaguarezinho, localizado junto à Rua Deolício Alves de Souza e Av. Dr. Silvio Margarido	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Campo Limpo		



Nov/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Água Vermelha

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Água Vermelha	6.539.145,48	5.505.493,79
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obras Emergenciais para recomposição do passeio público, guias, sarjetas e sistema de Drenagem de Águas Pluviais, obra de estabilização de talude entre a Rua ilha dos Papagaios X Rua Girassol Miúdo - Água Vermelha	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Vila Prudente		



Ago/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Itararé

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Itararé	7.687.115,68	7.687.115,68
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - Recuperação da Margem do Córrego Itararé - Trecho Av. Frei Macário de São João X Av. Gethsemani	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Butantã		



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Rua Vasconcelos Drummont

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Vasconcelos Drummont	4.878.017,70	4.877.839,63
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - Recomposição da Galeria de Águas Pluviais, na Rua Vasconcelos Drummont	



SUBPREFEITURAS:

1 – Ipiranga



Jul/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Córrego Maranhão

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Córrego Maranhão	9.984.336,30	9.967.454,56
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - recuperação da GAP e canalização do córrego Maranhão	
SUBPREFEITURAS:		

1 – Mooca



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Av. Inajar de Souza

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Av. Inajar de Souza	6.587.554,42	6.587.549,52
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - Recuperação e contenção de muro em gabião - Av. Inajar de Souza, Altura do n.º 6000	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Freguesia/Brasilândia		



Out/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Ponte do Socorro

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
------	--	----------

Ponte do Socorro	1.291.842,34	1.291.810,01
------------------	--------------	--------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em Andamento	Obra de Emergência - Recuperação de taludes, recuperação das escadarias e preenchimento dos vazios com solo de cimento injetado sob pressão - Ponte do Socorro.
--------------	---

SUBPREFEITURAS:

1 – Capela do Socorro



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Rua José Martins Veiga

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua José Martins Veiga	1.218.267,22	1.218.267,21
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em Andamento	Obra de Emergência - Recomposição de talude e via comprometida Rua José Martins Veiga nº 549	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Capela do Socorro		



Set/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Rua Valter Miranda de Bitencourt

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Valter Miranda de Bitencourt	6.592.124,68	6.116.310,22
ESTÁGIO	AÇÃO	
Concluído	Obra de Emergência - recomposição de talude e via comprometida Rua Valter Miranda de Bitencourt	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Capela do Socorro		




Out/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Rua Pacari da Mata

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Pacari da Mata	3.100.000,00	3.100.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	Obra de Emergência - Recuperação da margem do Córrego e Contenção de talude - Rua Pacari da Mata	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Vila Prudente.		

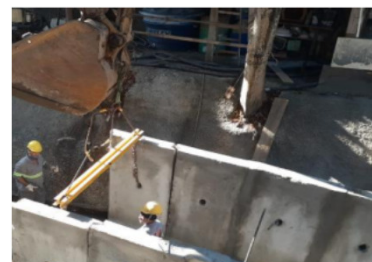

Out/21

Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Rua Rio Araranga

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Rio Araranga	3.304.406,62	3.303.265,29
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	Obra de Emergência - Recuperação da Margem do Córrego e Contenção de Talude - Rua Rio Araranga	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Itaim Paulista.		



Out/21



Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Morro da Lua

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Clodomiro de Oliveira - Morro da Lua	739.213,94	735.189,14
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	Obra de Emergência - Rua Clodomiro de Oliveira - Morro da Lua Contenção do talude	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Campo Limpo.		



Out/21




Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Rua Manuel Luna

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Rua Manuel Luna	2.849.986,59	2.849.265,78
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	Obra de Emergência - Rua Manuel Luna - Contenção de Talude	
SUBPREFEITURAS:		
1 – Jaçanã Tremembé		



Out/21

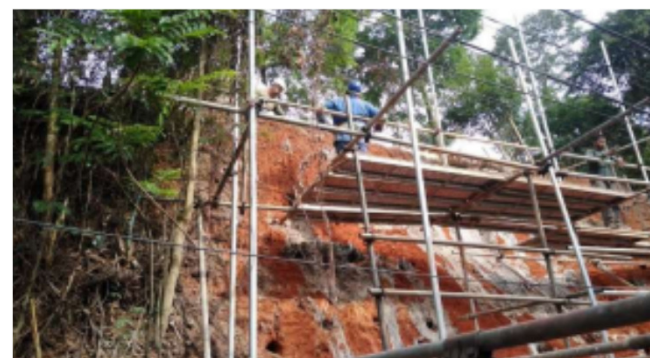

Dez/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – Gerenciamento e Remanejamento de Rede

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Gerenciamento	11.747.742,69	11.746.572,82
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento - Gerenciamento e apoio técnico.

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO APÓS REMANEJAMENTO (R\$)	VLR PAGO
Remoção de interferências no Vale do Anhangabaú	509.957,68	509.957,68
ESTÁGIO	AÇÃO	

Concluído - Pagamento complementar ref. remoção de interferências no Vale do Anhangabaú.

