



**CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO**

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO - 2020

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

25ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 26/02/2021

4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS (PARCIAL)

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 009/2020 (02/08/2020)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 010/2020 (04/11/2020)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 011/2020 (02/12/2020)	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5403	Obras	130.597.821	130.597.821	133.329.445	129.449.043	103.951.718	103.884.558
Construção de Habitação de Interesse Social	Serviços Técnicos	9.197.710	9.197.710	9.197.710	9.193.684	9.193.039	9.193.039
	Aquisição de Imóveis	52.421.666	52.421.666	49.690.042	30.262.675	29.444.877	29.444.877
TOTAL		192.217.197	192.217.197	192.217.197	168.905.402	142.589.634	142.522.474

NOME	PAGO (R\$)
-------------	-------------------

HELIÓPOLIS / GLEBA G
– CONDOMÍNIO B E
HELIÓPOLIS / SABESP
2 – COND. 4 E 5

23.657.887

ESTÁGIO	AÇÃO
----------------	-------------


EM ANDAMENTO

GLEBA G: 54 uh's
SABESP 2: 120 uh's



Heliópolis - Gleba G - Condomínio B: localização e implantação



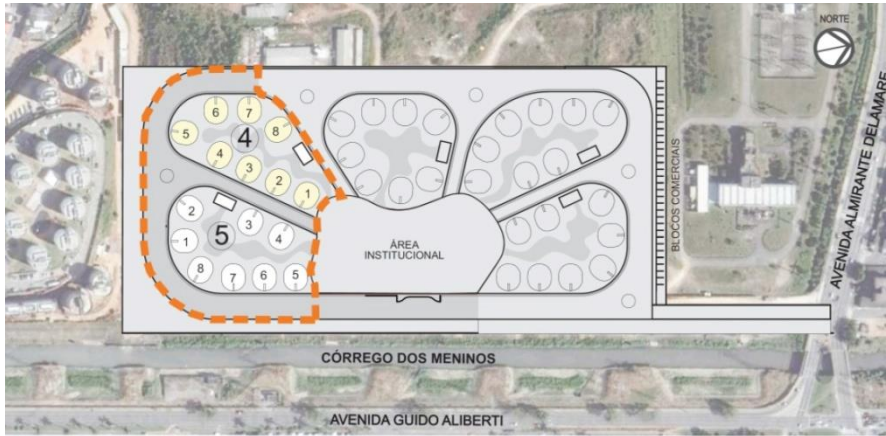

Heliópolis - Sabesp 2 - Condomínios 4 e 5: localização e implantação



Vista Condomínio 4



Vista Condomínio 5



Condomínio 4 - Estruturas

NOME

PAGO (R\$)

PARAISÓPOLIS /
SANFONA – FASE 1

4.611.501

ESTÁGIO

AÇÃO

ENTREGUE

50 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

BAMBURRAL / LIDIANE

14.970.941

ESTÁGIO

AÇÃO


EM ANDAMENTO

BAMBURRAL:

72 uh's entregues

162 uh's em andamento

LIDIANE:125 uh's
(Cond. 2) em andamento

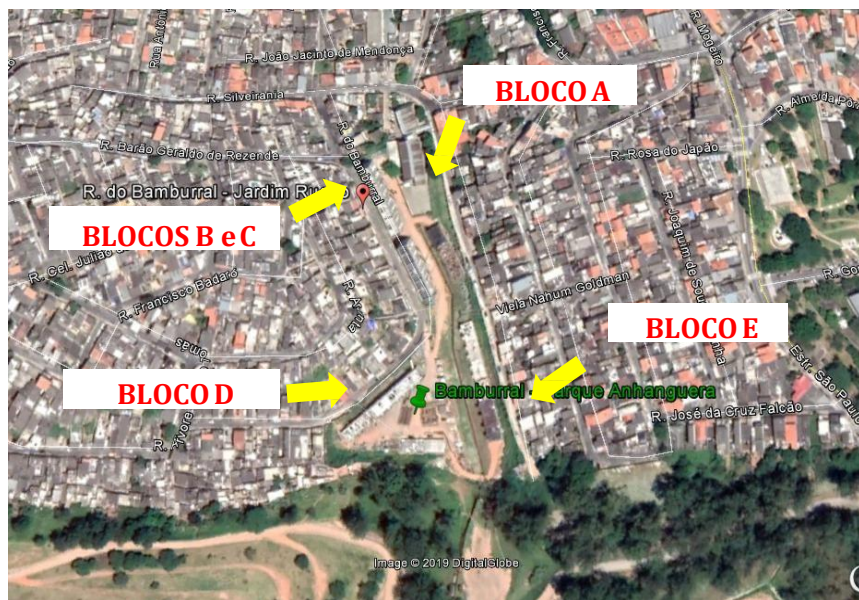

Vista Geral



Bloco D



Blocos B e C



Vista Panorâmica



Condomínio 1 – Quadra de Esportes



Bloco C

NOME

PAGO (R\$)

PONTE DOS REMÉDIOS

10.119.822

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

341 UNIDADES
HABITACIONAIS



Vista Panorâmica – Torre F1 e Torre F2



Quadra 4 - Torre A



Quadra 4 - Torre B

NOME

PAGO (R\$)

ALTO DA ALEGRIA

2.827.945

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

56 UNIDADES
HABITACIONAIS



Cond. 6ª - Alvenaria do 4º pavimento



Cond. 6B – Tirantes protendidos do muro de contenção

NOME

PAGO (R\$)

CHÁCARA DO CONDE /
FASE1

24.145.505

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

562 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

SAPÉ – COND. D e E

342.845

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

171 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

PARAISÓPOLIS
ANTONICO

438.100

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

PARQUE LINEAR E
CANALIZAÇÃO DO
CÓRREGO



NOME

PAGO (R\$)

HELIÓPOLIS / GLEBA H

1.400.443

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

03 UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME

PAGO (R\$)

JD CONTINENTAL/PQ DAS
FLORES

5.655.426

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

URBANIZAÇÃO DE
ASSENTAMENTO
PRECÁRIO



NOME

PAGO (R\$)

ESPANHA

239.633

ESTÁGIO

AÇÃO

ENTREGUE A SIURB

EQUIPAMENTO
PÚBLICO



NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	7.834.812

ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO DE OBRAS

NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	1.358.227

ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO SOCIAL

NOME	PAGO (R\$)
JOSÉ DIAS	13.394.457
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



NOME	PAGO (R\$)
PROJETO REDENÇÃO / CRACOLÂNDIA	7.796,418
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



NOME	PAGO (R\$)
COMANDANTE TAYLOR	3.580.000
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



NOME

PAGO (R\$)

BARÃO DE ANTONINA

3.291.799

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS



NOME

PAGO (R\$)

FORTE DO RIO BRANCO III

1.382.201

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS



NOME

PAGO (R\$)

BARÃO DE ANTONINA

2.731.623*


ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS

* *Desistência da desapropriação do imóvel
denominado Abrahão Calux com recurso
de 2015*

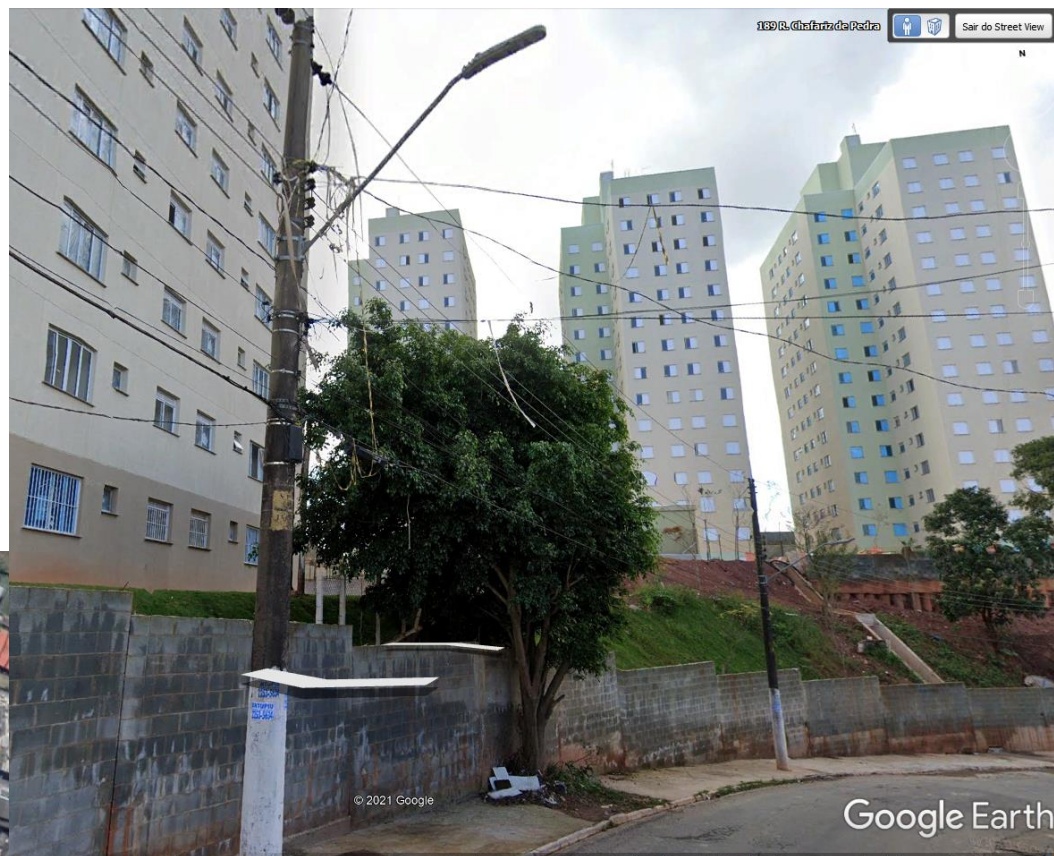

NOME	PAGO (R\$)
------	------------

FERNÃO DIAS (QUADRAS 9 E 10)	10.450.870 *
---------------------------------	--------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
--------------	------------------------

* Desistência da desapropriação do imóvel denominado *Abraão Calux* com recurso de 2015

