

# Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

<b>OBJETO DO GASTO</b>	<b>APROVADO</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO/PAGO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA</b>	<b>R\$ 6.972.186,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
<b>CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>R\$ 37.398.346,69</b>	<b>R\$ 17.121.766,08</b>	<b>R\$ 2.312.163,77</b>	<b>6%</b>
<b>IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS</b>	<b>R\$ 29.008.588,61</b>	<b>R\$ 29.008.588,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
<b>IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO</b>	<b>R\$ 2.053.627,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.432.749,11</b>	<b>46.130.354,69</b>	<b>R\$ 2.312.163,77</b>	<b>3%</b>

OBJETO	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO/PAGO	REALIZADO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	R\$ 37.398.346,69	R\$ 17.121.766,08	R\$ 2.312.163,77	6%



NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	LIQUIADO/PAGO
CAP PACHECO E CHAVES	1643	R\$212,438.84	0,00	0,00
BOSQUE DA SAUDE - BRAS GONCALVES - FRANCISCO DIAS	1324	R\$171,192.34	0,00	0,00
DOM MACARIO - NICOLAU ALBERTO - LUIS AUGUSTO	1644	R\$212,568.14	0,00	0,00
FRANCA - ANTONIO - OSVALDO - INHAIBA	1553	R\$200,801.90	0,00	0,00
CISPLATINA - PADRE MARCHETTI	1339	R\$173,131.83	0,00	0,00
NOSSA SRA DA SAÚDE	1559	R\$201,577.69	0,00	0,00
ABRAÃO DE MORAIS - RICARDO JAFET	3159	R\$408,456.66	0,00	0,00
LUCAS OBES - MUNICIPALIDADES - GRANDE SAO PAULO - FRANCISCO MESQUITA	1296	R\$167,571.96	0,00	0,00
AGOSTINHO GOMES	1221	R\$157,874.51	0,00	0,00
MANIFESTO	1889	R\$244,246.48	0,00	0,00
SANTA CRUZ - GENTIL DE MOURA - SALVADOR SIMOES - LEOPOLDINA	910	R\$117,662.41	0,00	0,00
BANDEIRANTES - AFFONSO D'ESCRAGNOLLE - MARIA MALUF - TANCREDO NEVES	9853	R\$1,273,986.53	0,00	0,00
JOSÉ DOS REIS	548	R\$70,856.05	0,00	0,00
AMPARO	686	R\$88,699.36	0,00	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR	VALOR EMPENHADO	LIQUIADO/PAGO
SALIM FARAH MALUF	2986	R\$386,087.87	0,00	0,00
APUCARANA - TIJUCO - SERRAT - CANUTO ABREU	2461	R\$318,205.71	0,00	0,00
PLATINA	1153	R\$149,082.15	0,00	0,00
PONTE TATUAPE - MICHELON - FRANCISCO LEOPOLDO - GALILEU GAIA	1478	R\$191,104.44	0,00	0,00
AIRTON PRETINI	645	R\$83,398.08	0,00	0,00
ASTARTE	734	R\$94,905.73	0,00	0,00
MENEZHINI - RIO DAS PEDRAS - ADHEMAR P DE BARRO	965	R\$124,773.88	0,00	0,00
MIGUEL ABRAHAO - ARICANDUVA	888	R\$114,817.83	0,00	0,00
ESTADO 3	1045	R\$135,117.82	0,00	0,00
RADIAL LESTE 2	2602	R\$336,436.92	0,00	0,00
RIBEIRO DE LIMA	431	R\$55,728.02	0,00	0,00
JOAO BOEMER - JOSE MONTEIRO - CLOVIS ARTHUR	1889	R\$244,246.48	0,00	0,00
CARLOS DE CAMPOS	706	R\$91,285.34	0,00	0,00
CONCEICAO - GERALDO BERTI - MILTON TAVARES	863	R\$111,585.34	0,00	0,00
GUILHERME	220	R\$28,445.86	0,00	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO/PAGO
MARIA CÂNDIDA	2348	R\$303,594.88	0,00	0,00
CANHONEIRA MEARIM - ALBERTO BYINGTON - MERE AMEDEA	3311	R\$428,110.16	0,00	0,00
OSAKA - SGTO MIGUEL - TENENTE AMARO	1856	R\$239,979.60	0,00	0,00
ROLAND GARROS	1303	R\$168,477.06	0,00	0,00
JARDIM JAPÃO	1416	R\$183,087.88	0,00	0,00
YORIMOTO - GUEIXAS	1053	R\$136,152.22	0,00	0,00
JOÃO FAGUNDES - PASSARELA SOBRE A DUTRA - JOSÉ MARIA FERNANDES	1916	R\$247,737.56	0,00	0,00
MARIA JOSE BARONE FERNANDES	1480	R\$191,363.04	0,00	0,00
FÁBIO PAVANI	530	R\$68,528.66	0,00	0,00
WALDEMAR ROBERTO	285	R\$36,850.32	0,00	0,00
ADHERBAL STRESSER - ASDRUBAL DA CUNHA - WALTER CARLSON	268	R\$34,652.23	0,00	0,00
CAMARGO 2	532	R\$68,787.26	0,00	0,00
SAPETUBA	461	R\$59,606.82	0,00	0,00
CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - VITAL BRASIL	5597	R\$723,688.48	0,00	0,00
BENJAMIN MANSUR - MARTINHO CLARO - DOMINGOS BARBIERI	1297	R\$167,701.26	0,00	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSAO (M)	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	LIQUIADO/PAGO
SANTA MARINA	770	R\$99,560.50	0,00	0,00
EDGAR FACÓ - PONTE DO PIQUERI - ERMANO MARCHETTI	2221	R\$287,173.86	0,00	0,00
GAGO COUTINHO - JOHN HARRISON DRONSFIELD - MALVIN JONES	1993	R\$257,693.61	0,00	0,00
POTSDAM - BRENTANO	1137	R\$147,013.36	0,00	0,00
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	94	R\$12,154.14	0,00	0,00
GUAIPA	1654	R\$213,861.13	0,00	0,00
MAJOR PALADINO	373	R\$48,228.66	0,00	0,00
QUEIROZ FILHO	1155	R\$149,340.75	0,00	0,00
JÁCOMO ZANELLA - ELIAS NAGIB BREIM - VIADUTO DA LAPA	697	R\$90,121.65	0,00	0,00
GASTÃO VIDIGAL - LATERAL DO VIADUTO	290	R\$37,496.81	0,00	0,00
PROFA VIRGILIA - ALCINDO BUENO	1500	R\$193,949.03	0,00	0,00
SANTA INES - VOLUNTARIOS DA PATRIA	1886	R\$243,858.58	0,00	0,00
MARIA AMALIA - MAMUD RAHD	4598	R\$594,518.43	0,00	0,00
MANUEL GAYA	1852	R\$239,462.40	0,00	0,00
DUMONT VILLARES - MARIA LAET	2792	R\$361,003.79	0,00	0,00
JOSE PARADA - ADVINCOLA - RUYTEMBERG - JOAO CREFF	922	R\$119,214.00	0,00	0,00
DUARTE DE AZEVEDO	1020	R\$131,885.34	0,00	0,00
ANTONIO CESAR NETO	780	R\$100,853.50	0,00	0,00
BENJAMIN PEREIRA	1660	R\$214,636.93	0,00	0,00

NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APOVADO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADADO/PAGO
Viaduto Bresser	1090	R\$707,488.92	504.854,61	0,00
José Maria Whitaker	1681	R\$510,320.11	363.002,09	0,00
República do Líbano	650	R\$397,220.52	261.301,59	248.886,10
Rui Barbosa - Treze de Maio - Santo Antônio	2270	R\$820,578.44	600.655,93	0,00
Dom Pedro I	1550	R\$1,262,912.33	840.558,40	0,00
Educador Paulo Freire	220	R\$160,183.67	106.573,61	0,00
Viaduto Itinguçu - Júlio Sayago	1100	R\$206,179.72	156.170,01	0,00
Nagib Farah Maluf	2250	R\$1,007,137.46	662.699,25	0,00
João Batista Conti	1600	R\$570,324.83	359.547,28	0,00
Miguel Yunes	1450	R\$91,427.66	61.737,64	0,00
Jacu Pêssego 2 (Laranja da China)	910	R\$373,415.20	250.890,00	0,00
Sena Madureira	2870	R\$1,156,349.89	779.997,96	745,775.42
Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi - Dona Avelina	1209	R\$316,972.47	235.991,61	0,00
Raimundo Pereira de Magalhães - Miguel de Castro - Cabo Adão Pereira - Manuel Barbosa	2120	R\$877,993.96	632.340,28	0,00
Ponte Cidade Universitária	485	R\$440,337.38	311.455,02	0,00





NOME DA INFRAESTRUTURA	EXTENSÃO (M)	VALOR APROVADO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO/PAGO
Jaguaré	610	R\$485,682.47	341.090,57	0,00
Gastão Vidigal - Ponte dos Remédios	1400	R\$479,339.82	332.873,54	0,00
Ponte Jaguaré	1500	R\$620,200.94	437.979,60	0,00
Praça Campo de Bagatelle	820	R\$422,063.24	266.949,52	0,00
Tiradentes - Santos Dumont	715	R\$1,149,778.02	744.299,65	0,00
Abraão Ribeiro	600	R\$414,885.91	270.612,56	0,00
Ponte da Freguesia do Ó - Comendador Martineli	1000	R\$833,573.74	548.609,70	0,00
Alvarenga	2425	R\$1,519,277.38	1.073.272,34	0,00
Mutinga	1531	R\$766,573.29	529.332,51	0,00
Ordem e Progresso - Ponte do Limão	1000	R\$621,201.32	410.323,74	0,00
Armando Arruda Pereira	1474	R\$639,392.92	456.916,58	0,00
Carlos Caldeira	3532	R\$1,612,645.35	1.191.114,34	0,00
Radial Leste	2971	R\$2,322,621.10	1.636.506,26	0,00
Indianópolis	3517	R\$1,913,888.91	1.376.626,78	1.317.502,25
Eng Alberto de Zagottis - Octales Marcondes Ferreira	1777	R\$989,051.34	723.448,77	0,00
Nações Unidas 1	1201	R\$627,494.04	435.423,34	0,00
Nações Unidas 2	843	R\$315,204.27	218.591,00	0,00

METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
650	R\$ 248.886,10	Em execução	República do Líbano	Av. República do Líbano	VILA MARIANA

Situação inicial



Situação atual

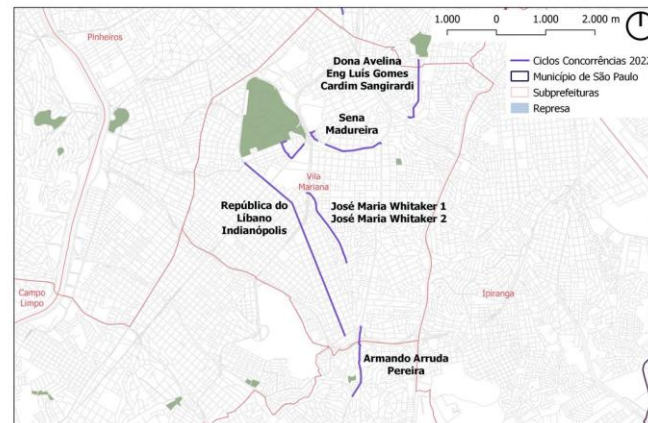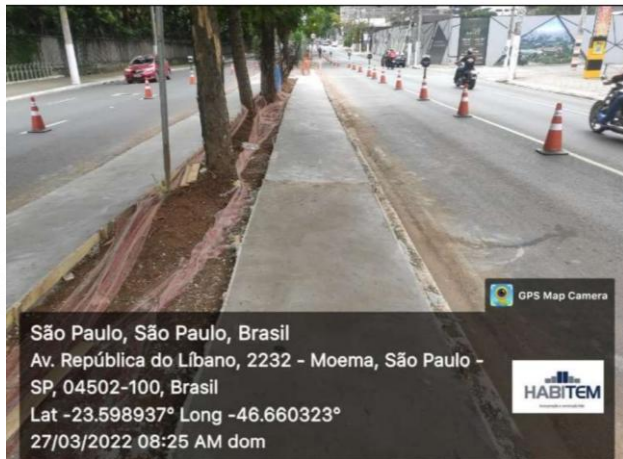


METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
2870	R\$745,775.42	Em execução	Sena Madureira	Av. Sena Madureira	VILA MARIANA

### Situação inicial




### Situação atual

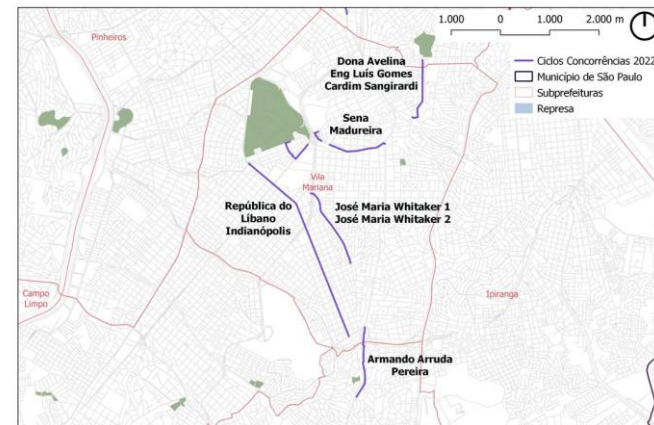

METROS	PAGO	SITUAÇÃO	ESTRUTURA	ENDEREÇO	SUBPREFEITURA
3517	R\$ 1.317.502,25	Em execução	Indianópolis	Av. Indianópolis	VILA MARIANA

Situação inicial

Situação atual

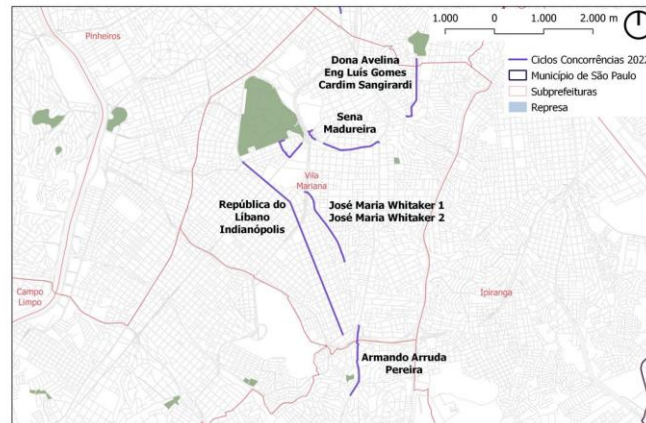

## Plano Aprovado para corredores e transporte hidroviário – valores empenhados

Objeto do gasto	Valor aprovado	Valor Empenhado	Valor Liquidado/Pago
Implantação de corredores de ônibus	R\$ 29.008.588,61	R\$ 29.008.588,61	R\$ 0,00
Implantação de transporte público hidroviário	R\$ 2.053.627,39	R\$ 0,00	0,00
<b>Total SETRAM</b>	<b>R\$ 31.062.216,00</b>	<b>R\$ 29.008.588,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>

# Corredor Celso Garcia



Termo de homologação de licitação N. 002/2022, publicado em 05.04.2022, para contratação de projeto básica e executivo.

Valor total aprovado: R\$ 4.950.000,00

# Corredor Itaquera-Líder




Itaquera I – Edital de licitação para obra complementar, publicado em 09.04.2022.

Itaquera II – Edital de licitação para projeto executivo e licenciamento ambiental, publicado em 26.03.2022.

Valor total aprovado:  
R\$ 16.600.000,00

# Corredores Miguel Yunes e Sabará

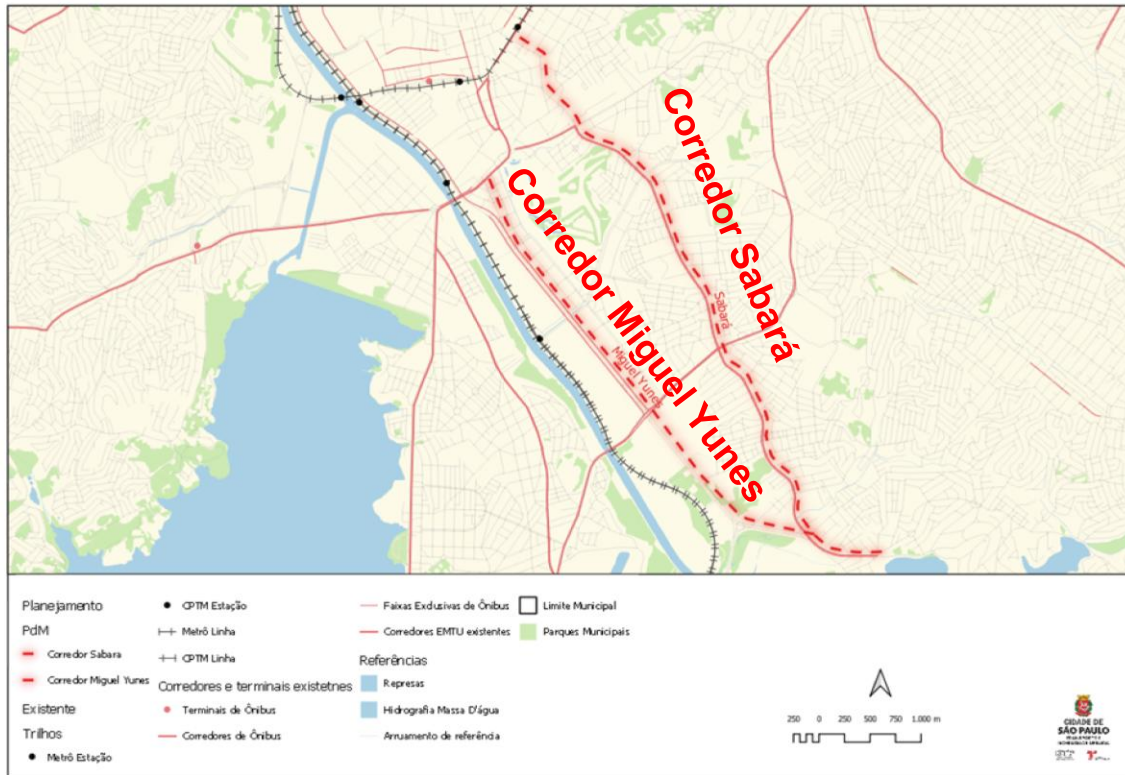

Editais de licitação previstos para 13.07.2022.

Valor total aprovado (Miguel Yunes): R\$ 3.505.536,65

Valor total aprovado (Nsa. Sra. Do Sabará): R\$ 3.953.051,96





**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**
