

# FUNDURB

CMPU – 15º Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – Atribuições

- O FUNDURB é um fundo de natureza contábil vinculado à SMDU.
- Os recursos do FUNDURB serão **aplicados** com a finalidade de **apoiar** ou **realizar investimentos** destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor Estratégico – PDE.  
(Decreto 47.661 – *caput* do Art. 2º)
- A aplicação dos recursos financeiros do FUNDURB é vedada em despesas de custeio, com ressalvas com despesas relacionadas:
  - elaboração de projetos destinados à execução das obras contempladas pelo FUNDURB, e
  - assistência técnica e jurídica eventualmente necessária nos processos regularização fundiária que abrange a reurbanização dos assentamentos de interesse social utilizados ou destinados à população de baixa renda.(Decreto 47.661 – *caput* do Art. 2º)

CMPU – 15º Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – Receitas

### ➤ Principais Receitas do FUNDURB:

- dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados pelo tesouro municipal;
- repasses/dotações de origem orçamentária da União ou do Estado;
- acordos, contratos, consórcios e convênios;
- empréstimos ou operações de financiamento internos ou externos;
- contribuições ou doações de pessoas físicas, jurídicas ou entidades internacionais;
- outorga onerosa e transferência do direito de construir;
- contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base na lei do Plano Diretor Estratégico (exceto resultado de proveniente do asfaltamento de vias públicas);
- receitas provenientes de concessão urbanística;
- rendimentos, retornos e resultados e obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
- Outras

Os recursos financeiros destinados à aplicação nos perímetros das operações urbanas consorciadas criadas por lei municipal não constituem receita do FUNDURB.

(Decreto 47.661 – Art. 3º - síntese)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – Aplicações

### ➤ Aplicação dos Recursos do FUNDURB:

Os recursos do FUNDURB serão assim aplicados, em consonância com as disposições do Estatuto das Cidades e do Plano Diretor Estratégico:

- na execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para a constituição de reserva fundiária;  
em transporte coletivo público urbano;
- no ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra-estrutura, drenagem e saneamento;
- na implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- na criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental.
- na proteção de outras áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, incluindo o financiamento de obras em imóveis públicos classificados como Zonas de Preservação Cultural – ZEPEC.

(Decreto 47.661 – Art. 5º - síntese)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB - Composição do Conselho Gestor

### ➤ Membros do FUNDURB:

- Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano;
  - Secretário Municipal de Finanças;
  - Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente;
  - Secretário Municipal de Habitação;
  - Secretário Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras;
  - Secretário do Governo Municipal;
  - Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras;
  - Secretário Municipal de Transportes;
  - Secretário Municipal de Cultura;
  - 3 (três) representantes do Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU.;
- (Decreto 47.661 – Art. 6º - síntese + Decreto 50.101 – Art. 1º)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – 2007 / 2008 / 2009 + Proposta 2010

### Execução Orçamentária 2007, 2008 e 2009 VALOR EMPENHADO

+

### Proposta Orçamentária para 2010

		( R\$ Mil)				
		2007	2008	2009 (JAN/AGO)	TOTAL	PROPOSTA 2010
SMSP	1169 Melhoria de Calçadas e Ruas (Obras)	12.276,7	17.866,3	2.040,7	32.183,7	15.000,0
SEHAB	1281 Regularização em Loteamentos Irregulares (Obras)	0,0	39.217,1	38.967,1	78.184,3	32.400,0
SMT	1234 Implant. Equip. Urbanos e Comunitários (Instalação)	10.249,2	19.837,8	12.326,1	42.413,0	15.000,0
SIURB	1231 Obras de Drenagem e Saneamento (Aricanduva e Outros)	28.763,9	67.430,1	55.963,9	152.158,0	32.400,0
SMC	5973 e 5977 Praça das Artes + Vila Iitororó (Obras + Desapropriações + Projeto)	7.286,5	7.055,1	15.077,1	29.418,6	34.800,0
SVMA	7136 Parque Lineares (Obras + Desapropriações)	15.784,5	36.229,4	22.494,6	74.508,5	32.400,0
		<b>74.360,8</b>	<b>187.635,8</b>	<b>146.869,5</b>	<b>408.866,1</b>	<b>162.000,0</b>

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – Orçado X Execução 2009

### Comparativo Proposta Orçamentária X Orçamento Aprovado

(R\$ Mil)

	ORÇAMENTO PROPOSTO	ORÇAMENTO APROVADO	Redução	EMPENHADO (JAN/AGO)
SMSP 1169 Melhoria de Calçadas e Ruas (Obras)	40.000,0	35.330,0	11,7%	2.040,7
SEHAB 1281 Regularização em Loteamentos Irregulares (Obras)	60.000,0	52.445,0	12,6%	38.967,1
SMT 1234 Implant. Equip. Urbanos e Comunitários (Instalação)	30.000,0	26.197,5	12,7%	12.326,1
SIURB 1231 Obras de Drenagem e Saneamento (Aricanduva e Outros)	60.000,0	52.395,0	12,7%	55.963,9
SMC 5973 e 5977 Praça das Artes + Vila Itororó (Obras + Desapropriações + Projeto)	50.000,0	43.662,5	12,7%	15.077,1
SVMA 7136 Parque Lineares (Obras + Desapropriações)	60.000,0	52.399,0	12,7%	22.494,6
	<b>300.000,0</b>	<b>262.429,0</b>	<b>12,5%</b>	<b>146.869,5</b>

Previsão de TOTAL de EMPENHO em 2009 = R\$ 206,0 milhões

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Projetos: Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

#### Aplicação de Recursos

(Valores R\$ Mil)

Projeto / Atividade	Empenhado			PROPOSTA 2010
	2007	2008	2009 (ago/09)	
Melhoria de Calçadas e Ruas	12.277	17.866	2.041	15.000

#### Destaques:

- Recursos do FUNDURB alocados em 2007, 2008 e 2009 para o Programa Passeio Livre (reforma de calçadas).
  - ✓ Em 2007 foram reformados 201,4 km linear de calçadas nas 31 Subprefeituras.
  - ✓ Em 2008 foram reformados 36,0 km linear de calçadas nas 31 Subprefeituras.
- Em 2009 é prevista a continuidade do programa em 23 Subprefeituras

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Obras concluídas em 2008

PROGRAMA EMERGENCIAL DE CALÇADAS PEC 2008		
Subprefeitura	Área (m²)	KM linear
Aricanduva	10.750,00	4,0
Cidade Tiradentes	7.862,00	3,9
Jabaquara	5.800,00	2,9
Mooca	17.249,22	8,6
Penha	5.600,00	2,8
Santana/Tucuruvi	8.641,00	4,3
São Miguel Paulista	19.708,93	1,3
Vila Mariana	10.400,00	5,2
Vila Prudente	5.970,00	3,0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91.981,15</b>	<b>36,0</b>

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Intervenções em Andamento – 2009

SUBPREFEITURA	LOCAL	Situação
Perus	Av Silvío de Campos e Estrada da Ligação	EM ANDAMENTO (2008/2009)
	Av Cel Gladiador, Virginia Castiglione e Eduardo Grusius	EM ANDAMENTO (2008/2009)
Santana/Tucuruvi	Rua Voluntários da Pátria	ORDEM DE INÍCIO (2009)
	Av Imirim	ORDEM DE INÍCIO (2009)
	Av Zumkeller	A LICITAR (2009)
Jaçanã/Tremembé	Av Abílio Pedro Ramos	OBRA CONCLUÍDA (2008/2009)
	Av Luis Stamatis	OBRA CONCLUÍDA (2008/2009)
	Rua Carlos Bastos Aranha	OBRA CONCLUÍDA (2008/2009)
Lapa	Rua Clélia	A LICITAR (2009)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Intervenções em Andamento – 2009

SUBPREFEITURA	LOCAL	Situação
Sé	Av Lins de Vasconcelos	A LICITAR (2009/2010)
	Av Brigadeiro Luis Antonio	LICITAÇÃO (2009/2010)
	Rua José Paulino	A LICITAR (2009/2010)
	Rua Oriente (projeto)	Projeto (2009)
	Rua Amaral Gurgel	A LICITAR (2009/2010)
	Av Liberdade	A LICITAR (2009/2010)
Pinheiros	Rua Fradique Coutinho	A LICITAR (2009/2010)
	R. Teodoro Sampaio	A LICITAR (2009/2010)
Vila Mariana	Prç Cidade de Milão	A LICITAR (2009/2010)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Intervenções em Andamento – 2009

SUBPREFEITURA	LOCAL	Situação
Penha	Av Amador B. da Veiga	EM ANDAMENTO (2008/2009)
	Rua Com Cantinho	LICITAÇÃO (2009)
São Miguel	Rua Salvador Medeiros Av Mal Tito	A LICITAR (2009/2010)
Vila Prudente/Sapopemba	Av do Oratório	LICITAÇÃO (2009/2010)
Cidade Tiradentes	Sara Kubistchek Rua Antonio Carlos Lopes Rua Alexandre Davidenko Rua Dr. Guilherme de Abreu Rua José Francisco Brandão Rua Inácio Monteiro	A LICITAR (2009/2010)

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMSP

### Obras concluídas

Praça José Maria Homem de Montes:

**Sub:** BT

**Concluído:** 2007



Av. Paulista:

**Sub:** SE

**Concluído:** 2008



CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SEHAB

### Projetos: Secretaria Municipal de Habitação

#### Aplicação de Recursos

Projeto / Atividade	Empenhado			PROPOSTA 2010
	2007	2008	2009 (ago/09)	
Regularização em Loteamentos Irregulares (Obras)	0	39.217	38.967	32.400

(Valores R\$ Mil)

#### Destaques:

- Secretaria alocou recursos para obras de regularização em 59 Loteamentos Irregulares, divididos em 06 lotes, beneficiando aproximadamente 28,1 mil famílias em 4,7 milhões de m<sup>2</sup>.
- Em 2008 foram concluídas 9 obras.
- Em 2009 já estão concluídas 5 obras, 32 estão em andamento e outras 8 já estão contratadas, a iniciar.
- Para a regularização de loteamentos irregulares são necessárias obras que envolvem a rede de água e esgoto, drenagem, pavimentação (guia e sarjetas), escadas e praças.

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SEHAB

### Obras concluídas em 2008

LOTE	LOTEAMENTOS	Áreas	SP	Qtd Lotes	Famílias beneficiadas
LOTE 1	CONJ. HABITACIONAL AMOIPA	6.665,8	IT	45	63
LOTE 1	NUCLEO ITAM RESIDENCIAL KATE KERO	6.767,0	G	34	48
LOTE 2	ESTRELA DA MANHÃ(JD.DAS FURNAS)	12.598,0	JT	113	158
LOTE 2	JARDIM BELA VISTA (JAÇANÃ) MUT. DOS POBRES	10.642,9	JT	120	168
LOTE 2	VILA NOVA PAULISTA (JD. JOAMAR)	6.914,3	JT	20	28
LOTE 2	VILA ROSÁLIA(VILA QUEIROZ)	12.738,5	JT	200	280
LOTE 3	FAZENDA DA JUTA - DETALHE 5	591,5	SM	31	43
LOTE 5	S/D ELISIO TEIXEIRA LEITE	7.042,0	FO	56	78
LOTE 6	S/D MORRO DOCE - REP. LOTE 68 QUADRA A	1.884,0	PR	17	24

No ano de 2008 foram atendidas 890 famílias,  
em 636 lotes com 9 obras concluídas

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SEHAB

### Obras concluídas em 2009

LOTE	LOTEAMENTOS	Áreas	SP	Qtd Lotes	Famílias beneficiadas
LOTE 1	JD. SÃO CARLOS - GL 2	6.665,8	G	232	325
LOTE 1	JARDIM SÃO JOÃO III - ESTRADADA CACHOEIRA	6.767,0	JT	180	252
LOTE 2	JARDIM BELA VISTA - MUT DOS POBRES	12.598,0	JT	120	168
LOTE 2	SÃO JOSÉ I	10.642,9	SM	192	269
LOTE 2	SÃO JOSÉ II	6.914,3	SM	360	504
LOTE 2	JARDIM DAS JABOTICABEIRAS	12.738,5	PJ	73	102

No ano de 2009 foram atendidas 1.620 famílias,  
em 1.157 lotes com 6 obras concluídas

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)



## FUNDURB – SEHAB

### Previsão de entrega de Obras – 2009 e 2010

Em 2009 é prevista a entrega de 27 obras que beneficiarão 13.713 famílias, em 9.795 lotes.

Em 2010 é prevista a entrega de mais 18 obras que beneficiarão 12.095 famílias, totalizando 8.639 lotes

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SEHAB

### Habitação: Jardim Jaçanã

Nº Total de Famílias beneficiadas: 168

Nº de Lotes: 120



ANTES



DEPOIS

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SEHAB

### Habitação: Francisco Reis

Nº Total de Famílias beneficiadas: 420

Nº de Lotes: 300



ANTES



DEPOIS

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB - SEHAB


### Lote 3 – Sub São Mateus

Jardim Nova Vitória e Cooperativa Jacu-Pêssego

Área = 624,2 mil m<sup>2</sup>

Lotes  
urbanizados = 2.388

Famílias  
atendidas = 3.343

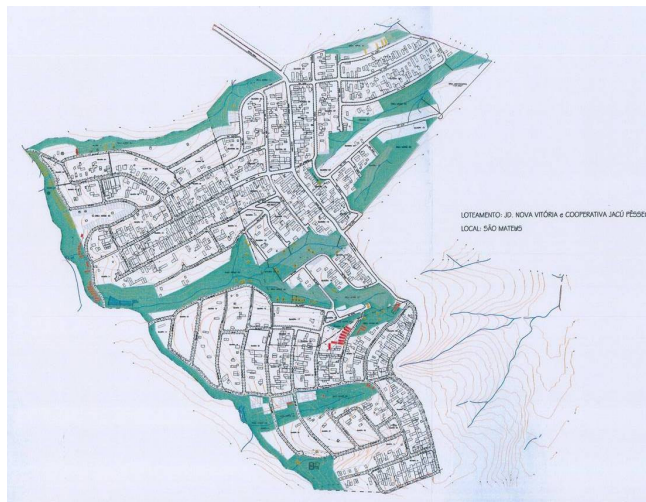

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMT

### Projetos: Secretaria Municipal de Transportes

#### Aplicação de Recursos

(Valores R\$ Mil)

Projeto / Atividade	Empenhado			PROPOSTA 2010
	2007	2008	2009 (ago/09)	
Implant. Equip. Urbanos e Comunitários (Instalação)	10249,2	19.838	12.326	15.000

#### Destaques:

- Recursos do FUNDURB alocados em 2008 e 2009 foram direcionados para projetos de Sinalização de Vias:
  - ✓ Sinalização Horizontal e Vertical
  - ✓ Placas de Orientação de Trânsito
  - ✓ Semáforos
- Em 2009 foram implantados ate 20/set aproximadamente 9,6 mil projetos de sinalização
- Para 2010 é prevista a continuidade do programa

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SIURB

### Projetos: Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Obras

#### Aplicação de Recursos

(Valores R\$ Mil)

Projeto / Atividade	Empenhado			PROPOSTA 2010
	2007	2008	2009 (ago/09)	
Obras de Drenagem e Saneamento (Aricanduva e Outros)	28.764	67.430	55.964	32.400

#### Destaques:

- Em 2009 SIURB utilizou o recurso do FUNDURB para a execução de 10 obras de canalização de córregos e para construção/recuperação de galerias e remanejamento de interferências
- 02 intervenções foram concluídas em 2007
- 03 intervenções foram concluídas em 2008
- 02 intervenções foram concluídas em 2009
- Para 2010 é prevista a alocação de recursos do FUNDURB para a conclusão da obra do Córrego Aricanduva

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SIURB

### Obras concluídas em 2007, 2008 e 2009

SUB	Localização	Intervenção	Conclusão	Valor
PE	Galeria Rua Dona Corina	Recuperação de Galeria	2007	3.113,2
FO	Córrego João Alves Pimenta	Canalização	2007	618,2
PJ	Córrego Cintra	Canalização Cabeceira	2008	489,7
MO	Galeria Rua Dulce	Drenagem	2008	636,4
ST	Córrego Buraco da Onça	Drenagem	2008	969,6
PE	Clube Desportivo da Penha	Recuperação de Galeria	2009	755,1
JT	Córrego dos Freitas - Av. Ushikishi Kamia	Canalização - Galeria	2009	2.377,7

CMPU – 12ª Reunião Extraordinária (24/09/2008)

## FUNDURB – SIURB

### Obras em Andamento - 2009

SP	Obras em andamento
AF/PE	Canalização do Córrego Aricanduva e Construção de Diques
SE	Obras de Drenagem Rua Prates
ST	Canalização do Córrego IPESP Tremembé
VM	Canalização do Córrego Artur Thiré (Licenciamento de Obra e Projeto Executivo)
CV	Canalização do Córrego da Rua Carandaí/Alambari
IP	Córrego Ipiranga (Obras e Serviços - continuidade)
VP	Canalização do Córrego Água Vermelha
SA	Canalização do Córrego Poli

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SIURB

### Obras concluídas

#### Recup. da Galeria da Rua Dona Corina:

Obra recuperação de galeria do Córrego Tiquatira, em trecho de 350 m, que se encontrava em péssimo estado, com risco de desabamento, como ocorrido em ocasiões anteriores quando necessitou de obra emergencial.



**Concluída:** dez/2007

**Investimento Fundurb:** R\$ 3,2 milhões

#### Córrego dos Freitas:

Execução das obras de canalização do Córrego na Av Ushikishi Kamia.



**Concluída:** 2009

**Investimento FUNDURB:** R\$ 2,4 milhões

CMPU – 12ª Reunião Extraordinária (24/09/2008)

## FUNDURB – SIURB

### Obras em andamento

#### Córrego Aricanduva:

Obras do Córrego Aricanduva, compreendendo o alteamento de 3 pontes, drenagem das áreas baixas, alargamento da calha entre as estacas 414 e 635, construção de reservatório e pavimentação da Avenida Aricanduva.



**Previsão de conclusão:** 2010

**Investimento Fundurb:** R\$ 97,7 milhões (total)

#### Córrego da Rua Carandaí / Alambari:

Canalização e reforço de galerias, para o córrego da rua Carandaí desde a rua Alambari e Angélico Bessone até junto ao emboque no rio Tiête.



**Previsão de conclusão:** 2009

**Investimento Fundurb:** R\$ 198,0 mil

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMC

### Projetos: Secretaria Municipal de Cultura

#### Aplicação de Recursos

Projeto / Atividade	Empenhado			(Valores R\$ Mil)
	2007	2008	2009 (ago/09)	PROPOSTA 2010
Praça das Artes + Vila Itororó (Obras + Desapropriações + Projeto)	7.287	7.055	15.077	34.800

#### Destaques:

- Recursos do FUNDURB alocados em 2007 e 2008 para processos de desapropriação.
- Em 2009:  
Praça das Artes - Recursos investidos em desapropriações e obras  
Vila Itororó – Contratação do Projeto Executivo para a intervenção.
- Para 2010:  
Continuação das obras de Praça das Artes, início das obras da Vila Itororó e elaboração do Projeto Executivo do Circo-Escola Piolin.

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)


## FUNDURB – SMC

### Praça das Artes

Trecho compreendido entre a Av. São João, Rua Formosa e Conselheiro Crispiniano

#### Destaques 2009:

- 9 dos 17 imóveis que compõe a quadra 27 tiveram a desapropriação concluída (52%).
- Obra iniciada em maio - primeiras demolições concluídas, com início dos serviços de fundação e de restauro do Conservatório Dramático Musical.

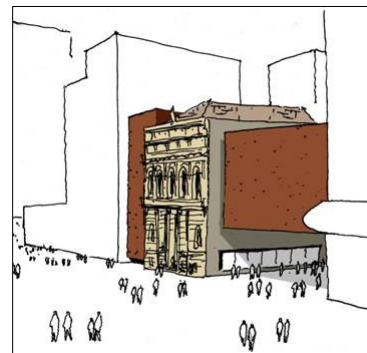

Conservatório Dramático e Musical

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)



## FUNDURB – SMC

### Praça das Artes




Quadra da intervenção

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMC

### Praça das Artes

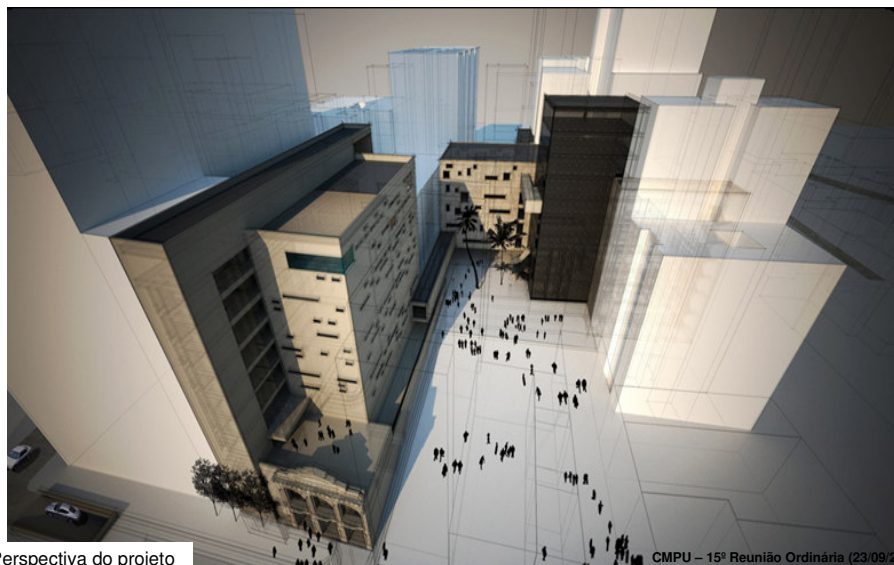

Perspectiva do projeto

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SMC

### Escola de Circo Piolin (Complexo Praça da Artes)

Região do Largo do Paíçandu (esquina com a Avenida Rio Branco), antigo reduto circense entre o início do século passado e 1980, promovendo a sua recuperação

#### Conceito:

- Equipamento destinado à formação, atualização e aprimoramento de crianças, adolescentes e jovens em arte circense
- Contará com biblioteca, videoteca, salas especiais para aula, setor médico e área administrativa.
- Será um centro de formação referencial na arte circense.


#### Situação atual:

- Iniciada as desapropriações dos dois primeiros imóveis
- Investido em 2009: R\$ 1,3 milhões
- Contratação do Projeto Executivo prevista para 2009

CMPU – 12ª Reunião Extraordinária (24/09/2008)

## FUNDURB – SMC

### Escola de Circo Piolin

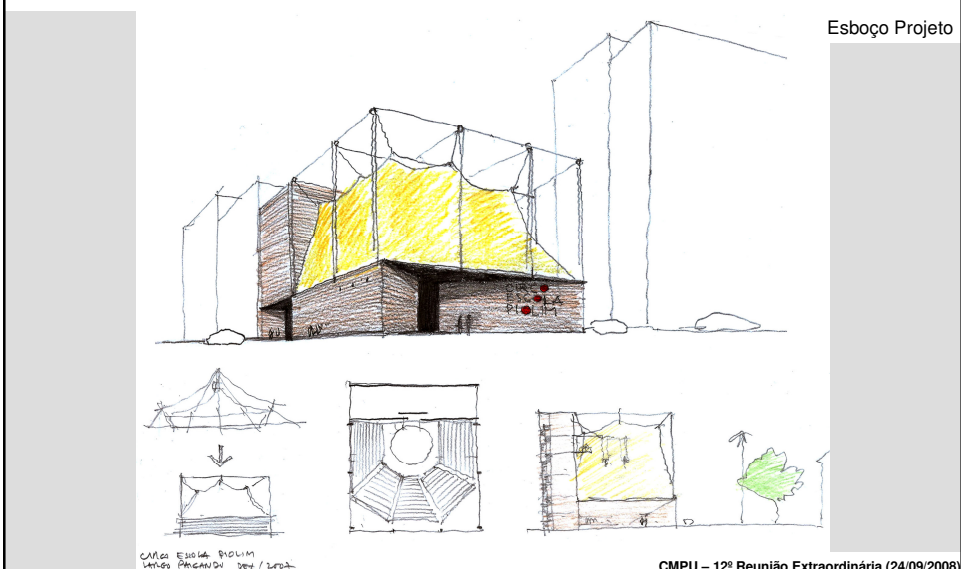



## FUNDURB – SMC

### Vila Itororó

Localizada na Bela Vista, região Central da cidade de São Paulo. Situado entre as ruas Martiniano de Carvalho e a Maestro Cardim

#### Destaques:

- Projeto de intervenção urbanística que transformará a Vila Itororó, histórico conjunto arquitetônico da Bela Vista, em um pólo de atividade cultural
- O local abriga um vila de 37 casas antigas com arquitetura portuguesa, que após a restauração, serão transformadas em um pólo cultural com atividades de:
  - ✓Teatro de Rua,
  - ✓Cinema ao ar livre
  - ✓Oficinas de figurino e cenografia
  - ✓Galeria de Arte
  - ✓Comércio Cultural
  - ✓Restaurante
  - ✓Museu de Artes Cênicas
  - ✓Biblioteca e Café Musical
- Em 2009 contratação do Projeto Executivo que será concluído no início de 2010.
- Desapropriações da parte do Estado e da Prefeitura concluídas.

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)


## FUNDURB – SMC

### Vila Itororó



## FUNDURB – SMC

### Vila Itororó

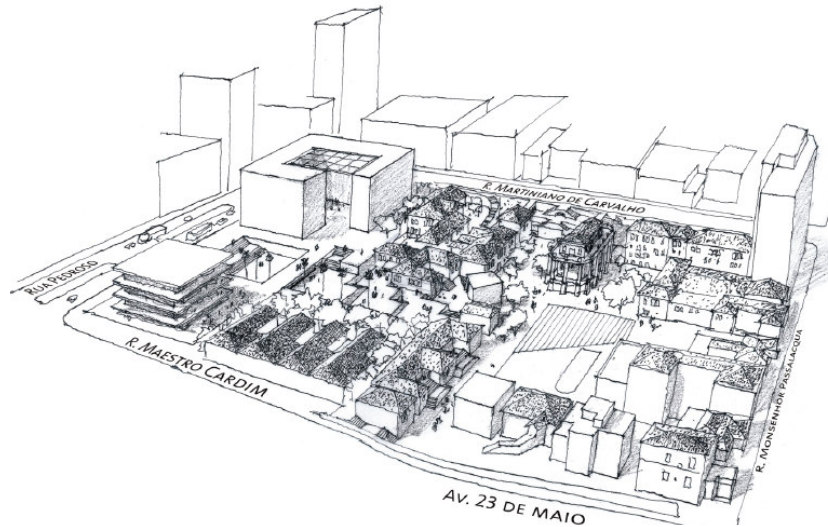

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SVMA

### Projetos: Secretaria Municipal de Verde e Meio-Ambiente

#### Aplicação de Recursos

Projeto / Atividade	Empenhado			PROPOSTA 2010
	2007	2008	2009 (ago/09)	
Parque Lineares	15.785	36.229	22.495	32.400

(Valores R\$ Mil)

#### Destaques:

- Foram concluídos 03 parques lineares em 2007 e 2008, construídos com recursos do Fundo
- Em 2009:
  - Obras em curso = R\$ 15,6 milhões (jan-ago/09)
  - Desapropriações = R\$ 6,6 milhões (jan-ago/09)
- Para 2010:
  - Continuação da implantação dos parques lineares previsto no Programa 100 Parques.

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SVMA

### Principais Intervenções em andamento - 2009

SP	Parque Linear	Área Prevista 1 (m2)	Observação Recursos Fundurb
CS	Cocaia	90.000	Em executando parcial (desapropriações - 1ª fase)
CS	Jacques Cousteau	67.327	Em Execução (obras)
MB	Herculano	75.277	Em Execução (obras)
MB	M'Boi Mirim	189.785	Em Execução (obras)
PA	Caulim	3.213.000	Em executando parcial (desapropriações - 1ª fase)
CT	Consciência Negra	130.135	Em Execução (obras)
EM	Mongaguá	64.061	Em Execução (obras + desapropriações)
G	Lajeado	36.000	Em Execução (obras + desapropriações)
IT	Águas	76.300	Em Execução (obras)
IT	Água Vermelha	124.207	Em Execução (obras da 1ª Fase)
CV	Bispo	1.209.604	Em execução parcial (desapropriações)

Nota: Fonte Site - SVMA

CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SVMA

### Obras concluídas

Parque Linear do Ipiranguinha:

**Sub:** AF

**Área:** 10.000 m<sup>2</sup>

**Concluído:** 2007

**Investimento Fundurb:** R\$ 912,1 mil



Parque Linear do Fogo (embrião):

**Sub:** PJ

**Área:** 28.900 m<sup>2</sup>

**Concluído:** 2008

**Investimento Fundurb:** R\$ 1,0 milhão



CMPU – 45ª Reunião Ordinária (23/09/2009)

## FUNDURB – SVMA

### Obras concluídas e em andamento

#### Parque Linear Itaim:

**Sub:** IT

**Área:** 21.000 m<sup>2</sup>

**Concluído:** 2008

**Investimento Fundurb:** R\$ 4,1 milhões



#### Parque Linear Herculano:

**Sub:** CS

**Área:** 75.277 m<sup>2</sup>

**Status:** Em implantação

**Investimento Fundurb:** R\$ 1,2 milhões



CMPU – 15ª Reunião Ordinária (23/09/2009)
