



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS


Requalificação de Calçadas SMSUB Panorama Geral PEC Julho/2020

SMSUB/ATOS

Resumo das calçadas do PEC executadas por SMSUB:


- A Meta 2.1 do Plano de Metas do Governo 2019/2020 prevê a construção e recuperação de 1.500.000,00 m² de calçadas, promovendo a qualidade, acessibilidade e seguranças dos transeuntes;
- Dentre esse montante, foram executadas aproximadamente 212 mil m² de calçadas no período;
- Atualmente estão em execução 617 mil m² de calçadas;

LOTE 02 - SE 2

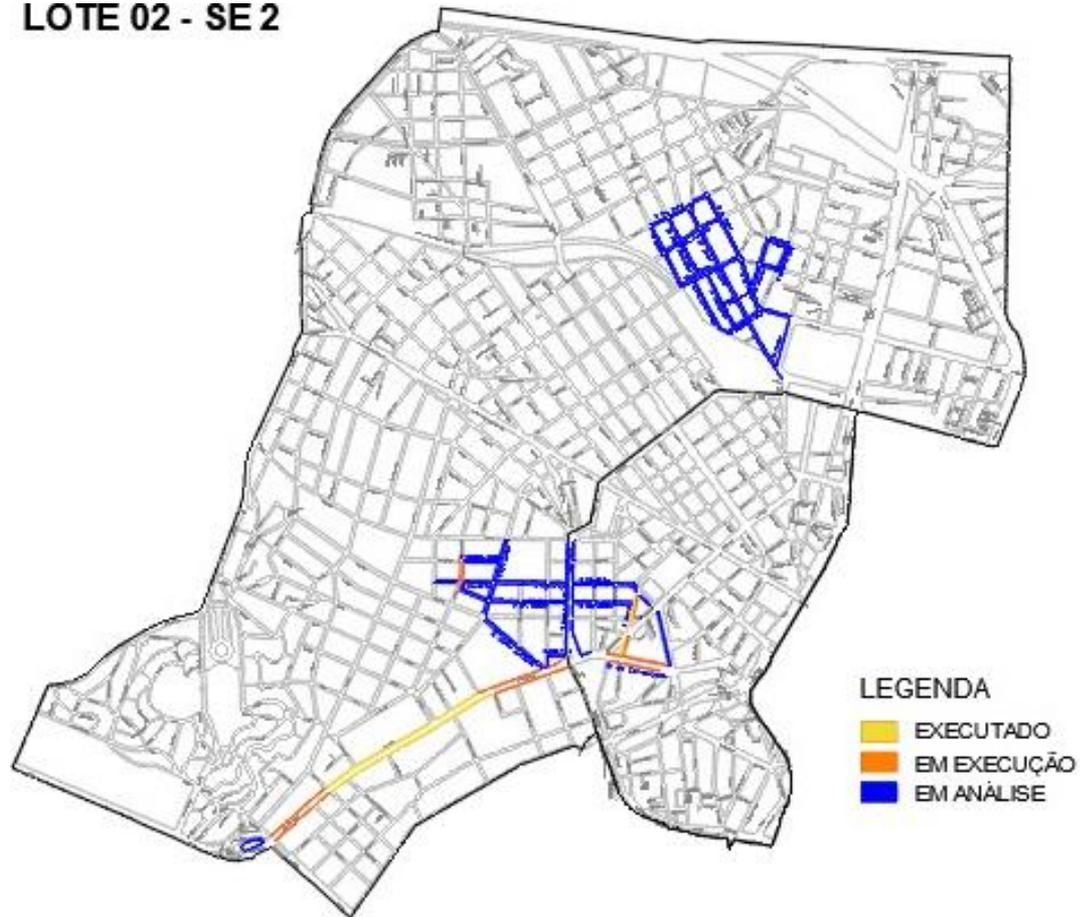


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Rua Maceió	Rua Piauí	3.255,00	Executado
SE	Rua da Consolação - LADO ÍMPAR	Rua Matias Aires	Rua Visconde de Ouro Preto	3.134,25	Executado
SE	Rua Araújo - LADO PAR	Praça da República	Rua da Consolação	1.610,66	Executado
SE	Rua Araújo - LADO ÍMPAR	Praça da República	Rua da Consolação	1.458,91	Em Execução
SE	Rua Aureliano Coutinho	Rua Martinico Prado	Rua Marquês de Itu	1.421,79	Em Execução
SE	Rua Sabará	Rua Marquês de Itu	Rua General Jardim		Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO ÍMPAR	Rua Martins Fontes	Praça Franklin Roosevelt	11.254,56	Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO ÍMPAR	Rua João Guimarães Rosa	Rua Visconde de Ouro Preto		Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO ÍMPAR	Avenida Paulista	Rua Matias Aires		Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Rua Piauí	Rua Rego Freitas		Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Avenida Ipiranga	Avenida São Luis		Em Execução
SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Avenida Paulista	Rua Maceió	22.135,17	Em Execução
				44.270,34	

LOTE 03 - VILA MARIANA

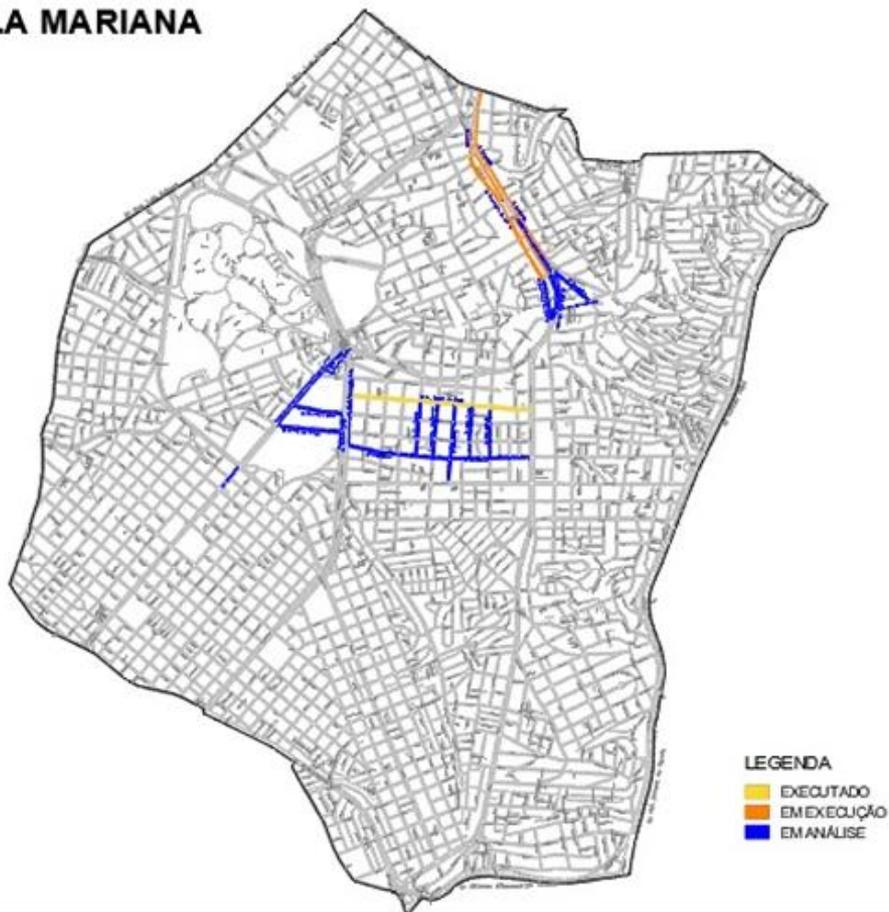

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR	Rua Domingos de Morais	Rua Napoleão de Barros	2.892,10	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR	Rua Napoleão de Barros	Avenida Rubem Berta	2.809,19	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua Domingos de Morais	Rua Coronel Lisboa	1.234,45	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua Coronel Lisboa	Rua Botucatu	1.080,00	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua Botucatu	Rua Napoleão de Barros	532,69	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua Napoleão de Barros	Rua Leandro Dupre	1.068,56	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua Leandro Dupre	Rua José Magalhães	1.115,40	Executado
VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR	Rua José Magalhães	Avenida Rubem Berta	592,12	Executado
VM	Rua Domingos de Morais - LADO ÍMPAR	Praça Doutor Afrodísio Vidigal	Praça Doutor Teodoro de Carvalho	14.216,92	Em Execução
VM	Rua Domingos de Morais - LADO PAR	Rua Estela	Praça Doutor Teodoro de Carvalho		Em Execução
VM	Rua Vergueiro - LADO ÍMPAR	Rua do Paraíso	Rua Dona Inácia Uchoa		Em Execução
VM	Rua Vergueiro - LADO PAR	Rua Correia Dias	Praça Doutor Teodoro de Carvalho		Em Execução
				25.541,43	

LOTE 04 - MOOCA

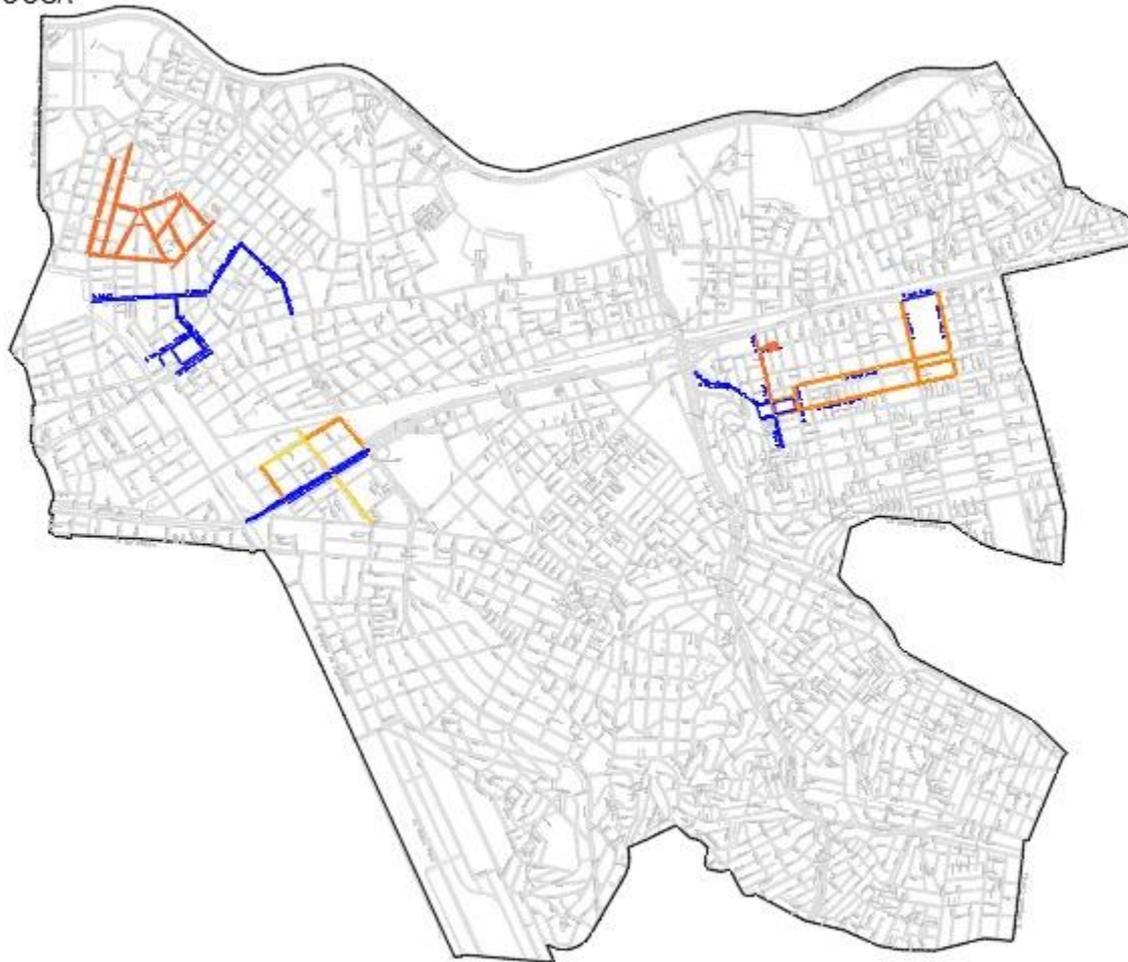


LEGENDA

-  EXECUTADO
-  EM EXECUÇÃO
-  EM ANÁLISE

Subprefeitura Mooca


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
MO	Rua Hipódromo	Rua Visconde de Parnaíba	Avenida Alcantara Machado	2.867,00	Executado
MO	Rua Hipódromo	Avenida Alcantara Machado	Rua dos Trilhos	3.061,78	Executado
MO	Rua Ipanema - LADO ÍMPAR	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Hipódromo	1.264,80	Executado
MO	Rua Ipanema - LADO PAR	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Hipódromo	1.312,50	Executado
MO	Rua Bresser - LADO ÍMPAR	Rua Ipanema	Rua Pires do Rio (Abaixo do Viaduto Bresser)	4.721,80	Em Execução
MO	Rua Bresser - LADO PAR	Rua Ipanema	Avenida Alcantara Machado		Em Execução
MO	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Ipanema	Avenida Alcantara Machado		Em Execução
MO	Rua Ipanema	Rua Hipódromo	Rua Bresser	20.412,00	Em Execução
MO	Praça Silvio Romero	Entorno da praça	Entorno da praça		Em Execução
MO	Rua Apucarana	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança		Em Execução
MO	Rua Coelho Lisboa	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança		Em Execução
MO	Rua Monte Serrat	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança		Em Execução
MO	Rua Serra de Bragança	Rua Coelho Lisboa	Rua Monte Serrat		Em Execução
MO	Rua Tijuco Preto	Rua Coelho Lisboa	Rua Monte Serrat		Em Execução
MO	Avenida Vautier	Rua João Teodoro	Rua Itaqui		Em Execução
MO	Rua Tiers	Rua João Teodoro	Rua Jurua		Em Execução
MO	Rua Hannemann	Rua Tiers	Rua Rodrigues dos Santos		Em Execução
MO	Rua Dr. Ornelas	Rua Maria Marcolina	Praça Eduardo Rudge	Em Execução	
MO	Rua Paraiba	Rua Maria Marcolina	Rua Mendes Junior	Em Execução	
MO	Praça Eduardo Rudge - LADO PAR	Rua Dr. Ornelas	Rua Paraiba	Em Execução	
MO	Rua Mendes Gonçalves	Avenida Carlos de Campos	Rua Silva Teles	Em Execução	
MO	Rua Silva Teles - LADO ÍMPAR	Rua Bresser	Rua João Teodoro	Em Execução	
MO	Rua Silva Teles - LADO PAR	Rua Bresser	Rua Maria Marcolina	Em Execução	
MO	Rua Casimiro de Abreu	Rua Silva Teles	Rua Paraiba	Em Execução	
MO	Rua Maria Marcolina - LADO PAR	Rua João Teodoro	Rua Dr. Ornelas	Em Execução	
MO	Rua Maria Marcolina - LADO ÍMPAR	Rua João Teodoro	Praça Pde. Bento	Em Execução	
MO	Praça Pde. Bento - LADO PAR	Rua Rodrigues dos Santos	Rua Maria Marcolina	Em Execução	
MO	Rua Rodrigues dos Santos - LADO PAR	Praça Pde. Bento	Rua João Teodoro	Em Execução	
MO	Rua Rodrigues dos Santos - LADO ÍMPAR	Rua Hannemann	Rua João Teodoro	Em Execução	
MO	Rua João Teodoro	Av. Vautier	Rua Maria Marcolina	Em Execução	
MO	Rua Tuiuti - LADO ÍMPAR	Rua Pde. Avelino	Rua Platina	Em Execução	
MO	Rua Tuiuti - LADO PAR	Rua Pde. Avelino	Rua Melo Freire	Em Execução	
MO	Rua Platina	Rua Tuiuti	Rua Cel. Joaquim Antonio Dias	Em Execução	
MO	Praça Cel. Sandoval de Figueiredo	Rua Cel. Joaquim Antonio Dias	Rua Cel. Luis Americano	Em Execução	
MO	Rua Cel. Joaquim Antonio Dias - LADO PAR	Entorno da praça		Em Execução	
MO	Rua Cel. Luis Americano - LADO ÍMPAR	Entorno da praça		Em Execução	
MO	Rua Apucarana	Rua Melo Freire	Rua Tijuco Preto	Em Execução	
MO	Rua Monte Serrat	Rua Melo Freire	Rua Tijuco Preto	Em Execução	
MO	Rua Serra de Botucatu	Rua Apucarana	Rua Monte Serrat	Em Execução	
				82.094,47	

LOTE 05 - SÃO MIGUEL PAULISTA

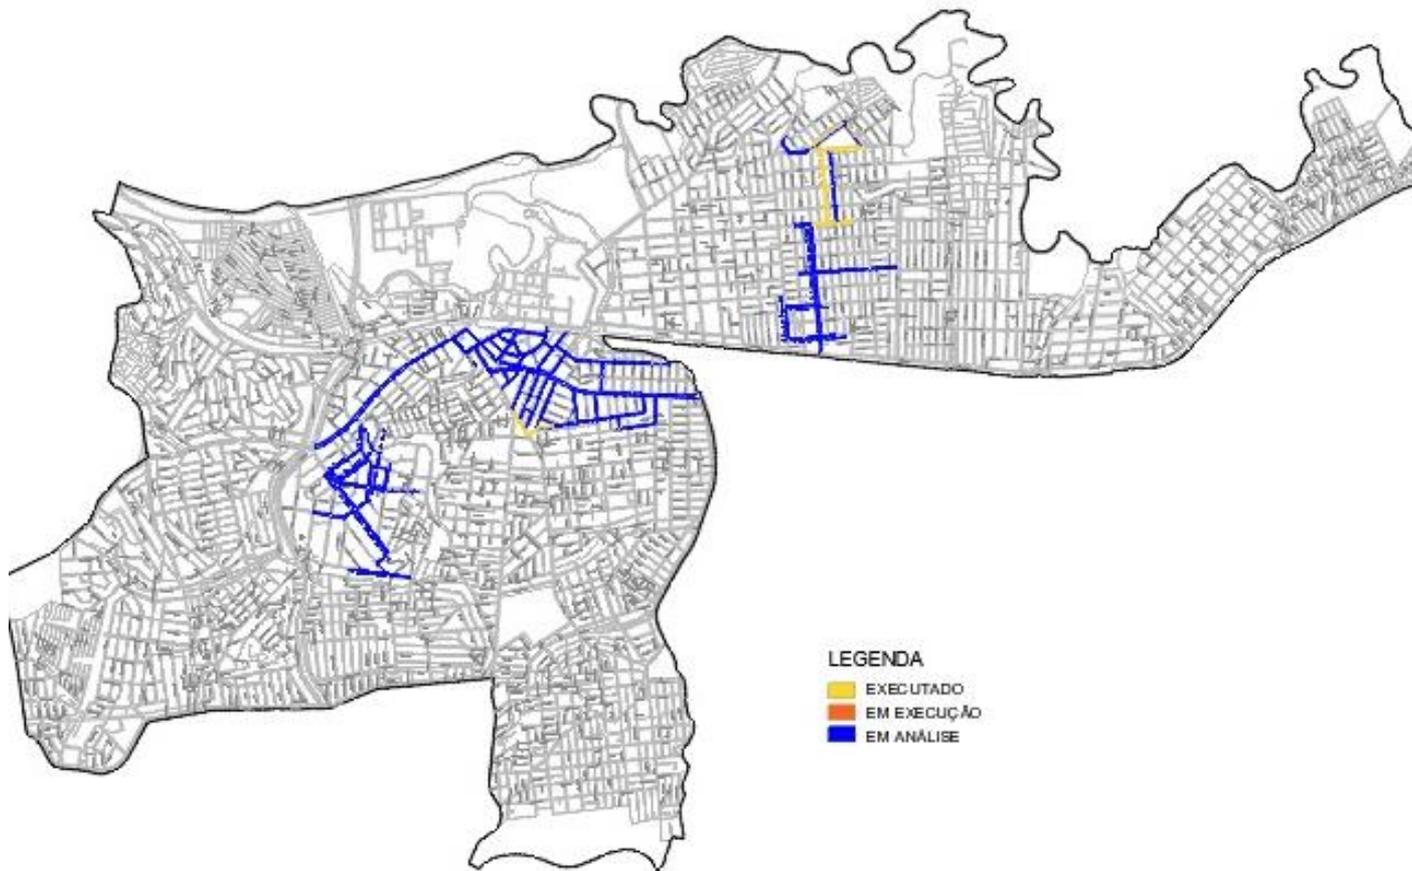


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
MP	Avenida Nordestina	Rua Amadeu Gamberine	Rua Pascoal Daniel	3.499,24	Executado
MP	Rua Doutor Guilherme Eiras	Entre Avenida Nordestina	entorno da Área Municipal (Quadra F839)		Executado
MP	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	Avenida Kumaki Aoki	709,65	Suspenso
MP	Avenida Kumaki Aoki	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	1.348,15	Suspenso
MP	Rua Cirilo Alves da Silva	Avenida Kumaki Aoki	Praça Craveiro do Campo		Suspenso
MP	Avenida Kumaki Aoki - LADO PAR	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	1.337,42	Suspenso
MP	Rua Boicuaiba	Rua Santa Rosa da Serra	Rua Tujumirim	847,65	Suspenso
MP	Rua Santa Rosa da Serra	Entre a Avenida Kumaki Aoki	Rua Boicuaiba		Suspenso
MP	Avenida José Martins Lisboa	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Tujumirim	1.391,13	Suspenso
MP	Rua Santa Rosa da Serra	Rua Boicuaiba	Avenida José Marins Lisboa		Suspenso
MP	Rua Salvador Fernandes Cardia	Avenida José Marins Lisboa	Rua Doutor José de Porciuncula	1.148,15	Suspenso
MP	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Doutor José de Porciuncula	Avenida Oliveira Freire	750,62	Suspenso
MP	Rua Altos do Oiti - LADO ÍMPAR	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Sara-Sara	3.201,25	Em análise
MP	Rua Altos do Oiti - LADO PAR	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras	Rua Sara-Sara		Em análise
MP	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO ÍMPAR	Rua Adriano Seabra	Rua Altos do Oiti		Em análise
MP	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO PAR	Rua Alvaro Coelho	Rua Altos do Oiti		Em análise
				14.233,26	

LOTE 06 - ITAIM PAULISTA

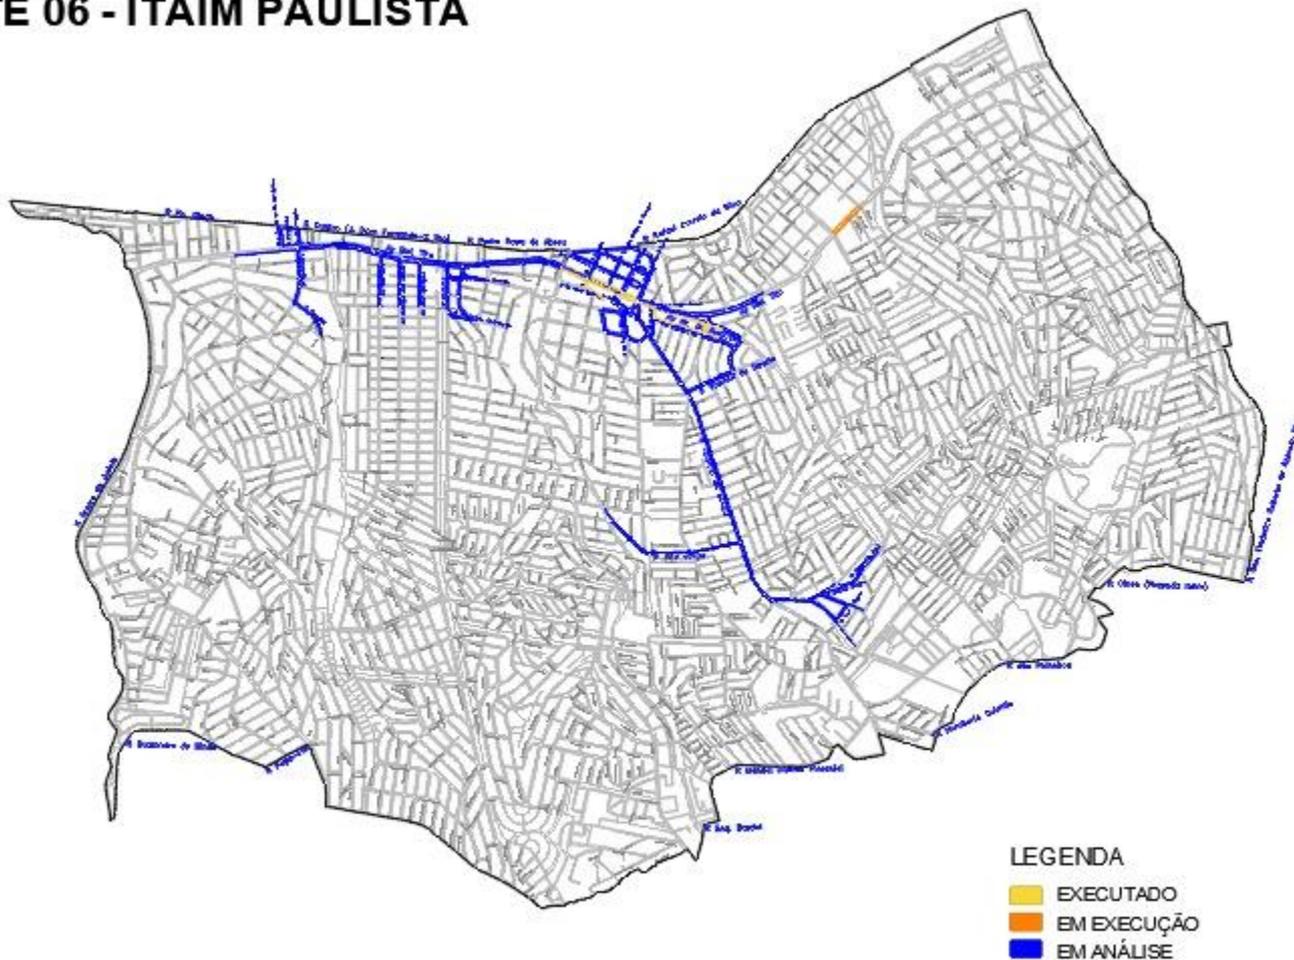


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
IT	Avenida Marechal Tito - LADO PAR	Estrada Dom João Nery	Praça Silva Teles	3.478,58	Executado
IT	Rua Iguiri	Avenida Marechal Tito	Rua Doutor Oscar Egídio de Araújo		Executado
IT	Rua Oscar de Araújo	Rua Iguiri	final da Rua		Executado
IT	Avenida Marechal Tito - LADO ÍMPAR	Rua Francisco Vaz Moniz	Rua Alarico Cavalcanti	3.322,54	Executado
IT	Avenida Barão de Alagoas	Lote 0054	Rua Pascoal de Miranda	1.273,00	Executado
IT	Avenida Marechal Tito - LADO PAR	Lote 0054	Praça Silva Teles		Executado
IT	Rua Manoel de Castilho - LADO ÍMPAR	Rua Pascoal de Miranda	Rua Ribeiro Escobar	920,00	Em Execução
IT	Rua Pascoal de Miranda - LADO PAR	Avenida Barão de Alagoas	Rua Manoel de Castilho		Em Execução
IT	Rua Ribeiro Escobar - LADO ÍMPAR	Rua Manoel de Castilho	Avenida Marechal Tito		Em Execução
IT	Avenida Barão de Alagoas - LADO PAR	Rua Pascoal de Miranda	Praça Bernardo Ravasco	599,00	Em Execução
IT	Rua Manoel de Castilho - LADO ÍMPAR	Rua Pascoal de Miranda	Praça Bernardo Ravasco		Em Execução
IT	Rua Pascoal de Miranda - LADO ÍMPAR	Avenida Barão de Alagoas	Rua Manoel de Castilho		Em Execução
IT	Avenida Marechal Tito	Rua Clemente Martins de Matos	Avenida Itaim	1.267,60	Em Execução
				10.860,72	

LOTE 07 - PINHEIROS

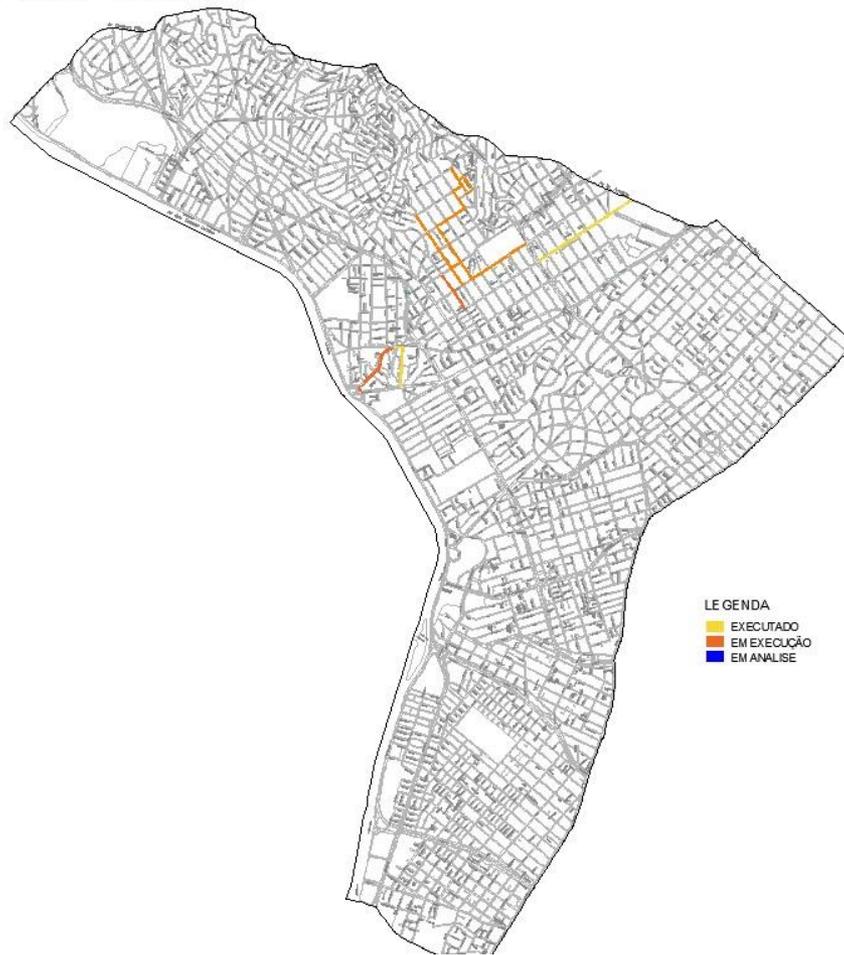

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
PI	Rua Butantã - LADO ÍMPAR	Avenida Eusébio Matoso	Rua Paes Leme	2.391,00	Em Execução
PI	Rua Butantã - LADO PAR	nº 490 da Rua Butantã	Rua Paes Leme	2.005,00	Em Execução
PI	Rua Cardeal Arcoverde	Avenida Eusébio Matoso	Rua Paes Leme	2.974,00	Executado
PI	Rua Teodoro Sampaio	Avenida Doutor Arnaldo	Rua Capote Valente	3.252,00	Executado
PI	Rua Teodoro Sampaio	Rua Capote Valente	Rua Henrique Schaumann	3.722,00	Executado
PI	Rua Simão Álvares - LADO ÍMPAR	Rua Inácio Pereira da Rocha	Rua Teodoro Sampaio	1.456,00	Em Execução
PI	Rua Simão Álvares - LADO PAR	Rua Inácio Pereira da Rocha	Rua Teodoro Sampaio	1.410,00	Em Execução
PI	Rua Cardeal Arcoverde	Rua Fradique Coutinho	Rua Henrique Schaumann	23.597,82	Em Execução
PI	Rua Costa Lobo	Rua Filinto de Almeida	Rua Jerico		Em Execução
PI	Rua Filinto de Almeida	Rua Original	Rua Costa Lobo		Em Execução
PI	Rua Fradique Coutinho	Rua Wisard	Rua Cardeal Arcoverde		Em Execução
PI	Rua Harmonia	Rua Wisard	Rua Purpurina		Em Execução
PI	Rua Inacio Pereira da Rocha	Rua Fradique Coutinho	Rua Mourato Coelho		Em Execução
PI	Rua Jerico	Rua Original	Rua Rodesia		Em Execução
PI	Rua Mourato Coelho	Rua Purpurina	Rua Teodoro Sampaio		Em Execução
PI	Rua Purpurina	Rua Jerico	Rua Harmonia		Em Execução
PI	Rua Wisard	Rua Fradique Coutinho	Rua Harmonia		Em Execução
				40.807,82	


LOTE 09 - M'BOI MIRIM

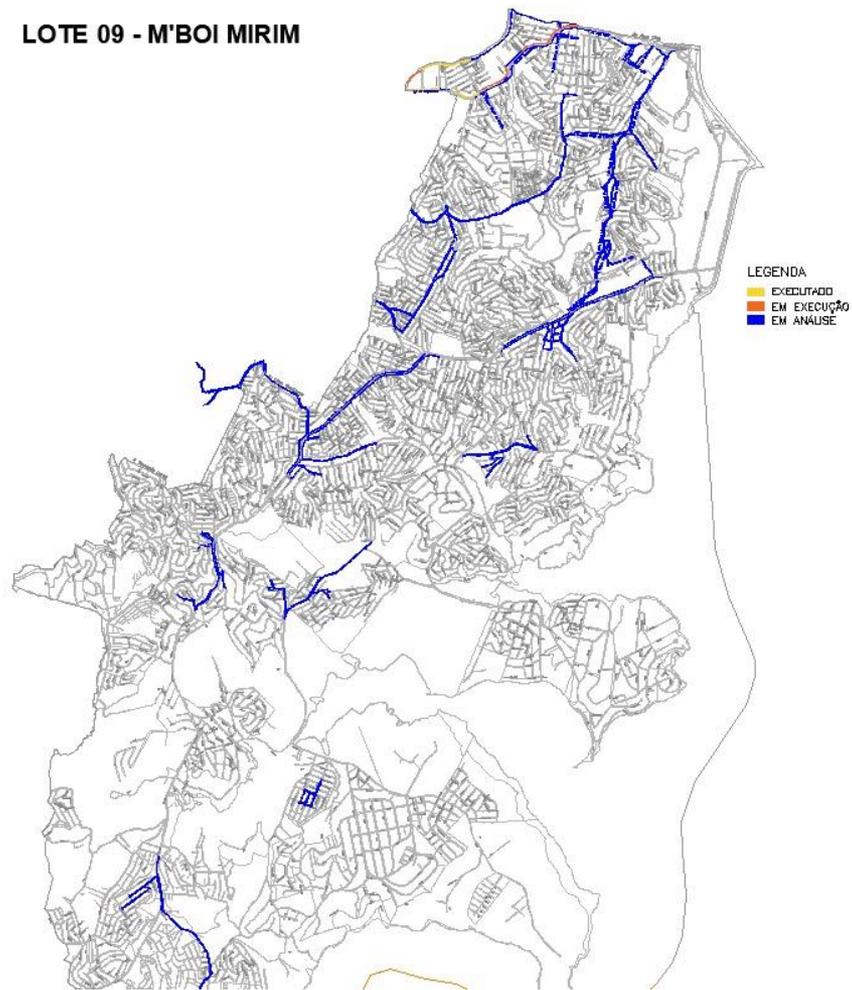

Subprefeitura M'Boi Mirim

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
MB	Rua José Barros Magaldi - LADO ÍMPAR	Avenida M'Boi Mirim	Avenida Luiz Gushiken	3.136,71	Executado
MB	Rua José Barros Magaldi - LADO PAR	Avenida M'Boi Mirim	Rua Jean de Brienne		Executado
MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Adalgisa de Abreu Ramalho	Rua Thereza Maia Pinto	1.535,58	Executado
MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Thereza Maia Pinto	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	1.104,56	Executado
MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	Estrada do Campo Limpo	705,50	Em Execução
MB	Estrada do Campo Limpo - LADO PAR	Avenida Carlos Caldeira Filho	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	1.121,72	Executado
MB	Estrada do Campo Limpo - LADO PAR	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	Rua Antônio Carneiro	994,74	Executado
MB	Estrada de Itapeperica - LADO PAR	Rua Antônio Carneiro	Rua Baldomero Carqueja	1.102,82	Executado
MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Avenida das Belezas	Rua Amadeu Simei	9.127,80	Em Execução
MB	Avenida das Belezas - LADO ÍMPAR	Rua Isabel Ribeiro da Silva	Avenida Carlos Caldeira Filho		Em Execução
MB	Estrada de Itapererica - LADO PAR	Rua Baldomero Carqueja	RP B (J. Oliveiras JDS)		Em Execução
MB	Estrada de Itapererica - LADO PAR	Rua Zulmira Cavalheiro Faustino	Avenida das Belezas		Em Execução
MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR	Rua Quarteto do Imperador	Rua Canuto Luiz do Nascimento		Em Execução
MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR	Avenida Fim de Semana	Avenida João Gomes Carneiro		Em Execução
MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR	Rua João Fernandes C. Nova Junior	Rua Luis Antonio Verney		Em Execução
MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR	Rua Antonio de Sena	Rua José Manoel Camisa Nova		Em Execução
				18.829,43	

LOTE 10 - JAÇANÃ

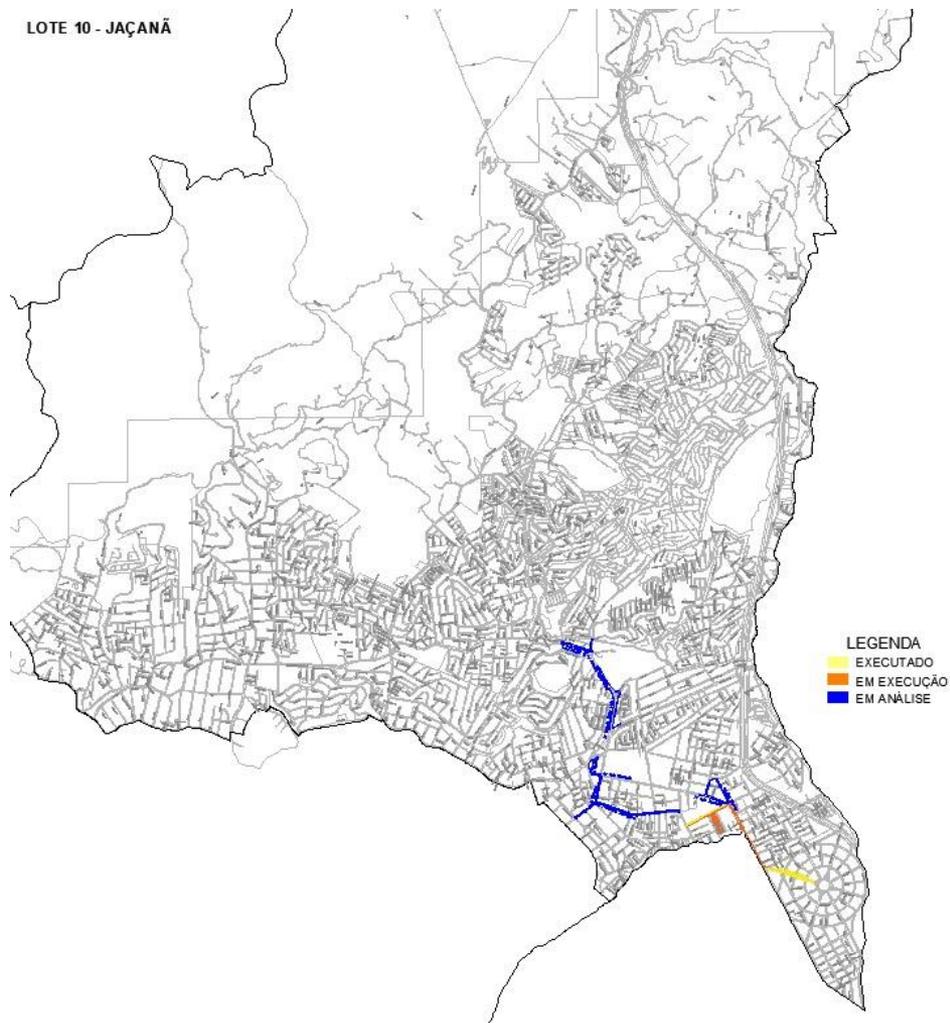


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
JT	Avenida Roland Garros	Praça Comandante Eduardo de Oliveira	Rua Rei Alberto	2.377,50	Executado
JT	Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR	Rua Rei Alberto	Avenida Sanatório	1.254,39	Em Execução
JT	Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR	Avenida Sanatório	Rua Alto Paraguai	1.047,93	Em Execução
JT	Avenida Edu Chaves - LADO PAR	Travessa Antonio Balzano	Rua Alto Paraguai	901,02	Em Execução
JT	Rua Alto Paraguai - LADO PAR	Avenida Edu Chaves	Avenida Mendes da Rocha	1.311,07	Em Execução
JT	Rua Alto Paraguai - LADO ÍMPAR	Avenida Edu Chaves	Avenida Mendes da Rocha	1.183,28	Executado
				8.075,19	


Subprefeitura Santana / Tucuruvi

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
ST	Avenida Alvaro Machado Pedrosa	Avenida Luiz Dummont Villares	Avenida Tucuruvi	14.826,00	Em Execução
ST	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Tucuruvi	Rua José de Albuquerque		Em Execução
ST	Avenida Guapira	Avenida Maest. Villa Lobos	Avenida Tucuruvi		Em Execução
ST	Avenida Luiz Dummont Villares	Avenida Tucuruvi	Rua do Tramway		Em Execução
ST	Avenida Nova Cantareira	Rua Barra Mansa	Rua José de Albuquerque Medeiros		Em Execução
ST	Avenida Tucuruvi	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Nova Cantareira		Em Execução
ST	Rua Domingos Calheiros	Rua Juncal	Avenida Tucuruvi		Em Execução
ST	Rua dos Ferroviarios	Rua Paulo de Freire	Rua Guapira		Em Execução
ST	Rua Doutor Antonio Maria Laet	Rua Ausonia	Avenida Tucuruvi		Em Execução
ST	Rua José de Albuquerque	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Alvaro Machado Pedrosa		Em Execução
ST	Rua Paranabi	Rua Paulo de Freire	Avenida Doutor Antonio Maria Laet		Em Execução
ST	Rua Paulo de Freire	Avenida Tucuruvi	Altura da Quadra F0189		Em Execução
ST	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Leite de Moraes	Rua Darzan		2.622,00
ST	Rua Darzan	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Ezequiel Freire	Executado	
ST	Rua Ezequiel Freire	Rua Leite de Moraes	Rua Gabriel Piza	Executado	
ST	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Alferes Magalhães	Rua Conselheiro Saraiva (Exceto F045)	26.535,89	Em Execução
ST	Rua Alfredo Pujol	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Frei Vicente do Salvador/Rua Perina		Em Execução
ST	Rua Conselheiro Saraiva	Rua Doutor Zuquim	Rua Voluntarios da Patria		Em Execução
ST	Rua Darzan	Rua Voluntarios da Patria	Rua Doutor Zuquim (Exceto F046,045)		Em Execução
ST	Rua Doutor Gabriel Piza	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Doutor Zuquim		Em Execução
ST	Rua Doutor Olavo Egídio	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Voluntarios da Patria		Em Execução
ST	Rua Doutor Zuquim	Rua Alferes Magalhães	Rua Duarte de Azevedo (Exceto F058)		Em Execução
ST	Rua Duarte de Azevedo	Rua Voluntarios da Patria	Rua Doutor Zuquim		Em Execução
ST	Rua Ezequiel Freire	Rua Alferes Magalhães	Rua Duarte de Azevedo (Exceto F044,052)		Em Execução
ST	Rua Leite de Moraes	Rua Ezequiel Freire	Rua Doutor Zuquim		Em Execução
ST	Rua Salete	Rua Doutor Cesar	Rua Alfredo Pujol		Em Execução
ST	Rua Voluntarios da Patria	Rua Alferes Magalhães	Rua Nunes Garcia (Exceto F364)		Em Execução
					43.983,89

LOTE 11 - CIDADE TIRADENTES

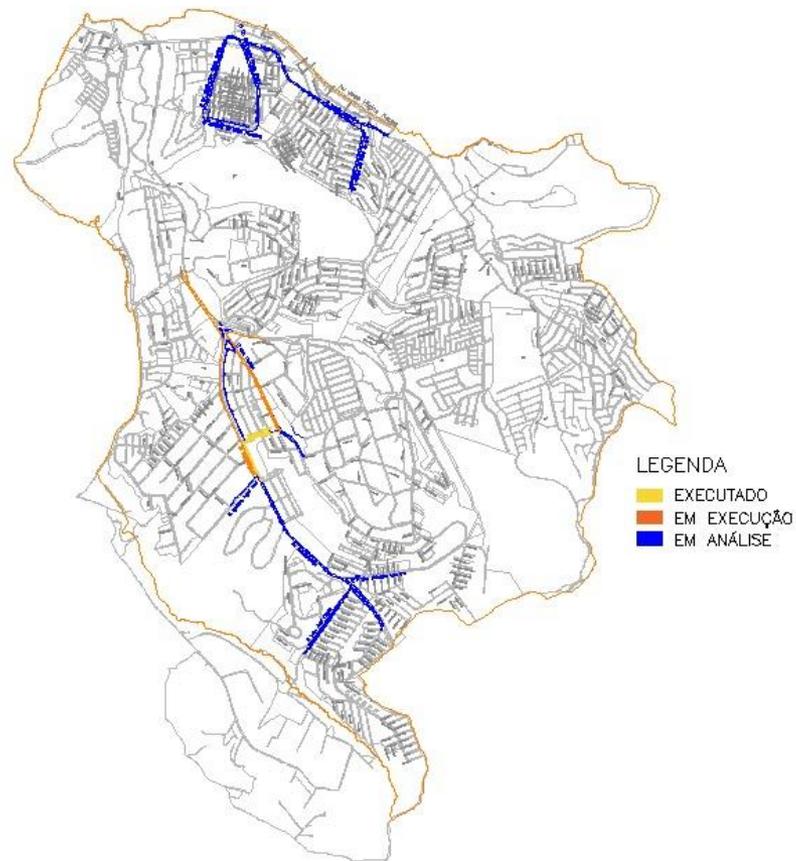


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
CT	Avenida dos Metalúrgicos	Rua Santo Rizzo	Rua Aquitânia	3.382,22	Executado
CT	Rua Santo Rizzo	Rua Jorge Riguetti	Avenida dos Metalúrgicos		Executado
CT	Rua Santo Rizzo	Rua dos Têxteis	Avenida dos Metalúrgicos	1.232,00	Executado
CT	Avenida Naylor de Oliveira	Rua dos Têxteis	Rua Sta. Etelvina	722,00	Em Execução
CT	Avenida Souza Ramos	Rua Marcio Beck Machado	Avenida Naylor de Oliveira	2.590,00	Em Execução
CT	Praça Felisberto Fernandes da Silva - LADO PAR	Entorno da Praça Felisberto Fernandes da Silva			Em Execução
CT	Avenida dos Metalurgicos - LADO PAR	Avenida dos Texteis	Rua Igarape Água Azul	4.797,00	Em Execução
CT	Avenida dos Têxteis - LADO ÍMPAR	Avenida Naylor de Oliveira	Rua Santo Rizzo		Em Execução
CT	Avenida dos Têxteis - LADO PAR	Rua Ernesto Cerreti	Rua Santo Rizzo		Em Execução
				12.723,22	

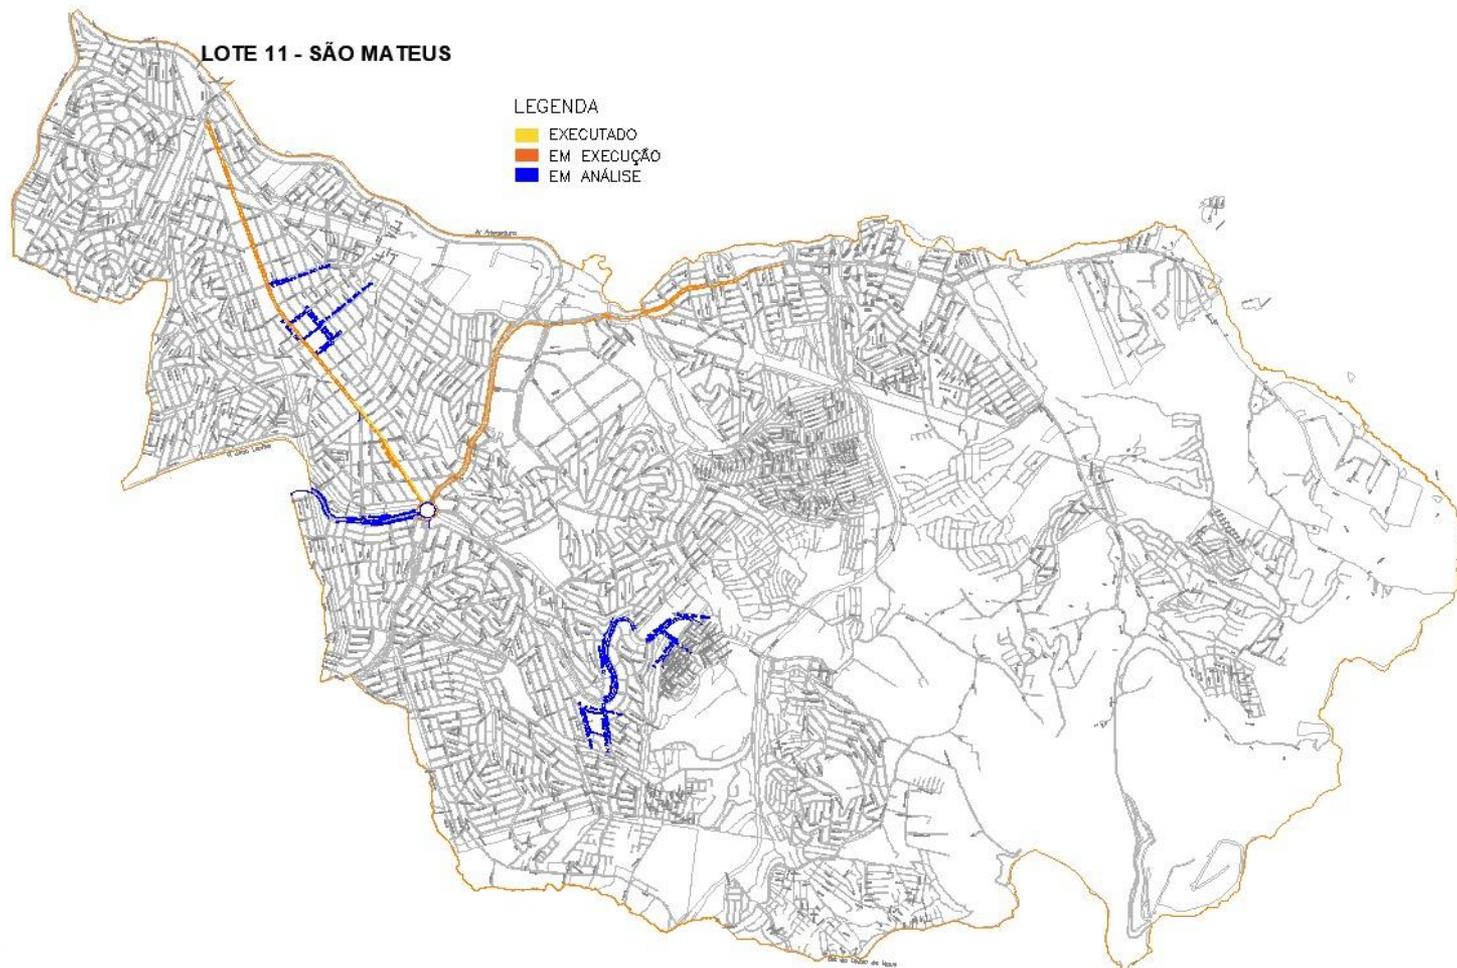

Subprefeitura São Mateus

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
SM	Avenida Mateo Bei	Praça Felisberto Fernandes da Silva	Rua Francisco Cordelli	3.093,64	Executado
SM	Avenida Mateo Bei	Rua Francisco Cordelli	Rua Tita Ruffo	1.191,00	Executado
SM	Avenida Mateo Bei	Rua Tita Ruffo	Rua Doutor Maria Cursi	1.122,00	Executado
SM	Avenida Mateo Bei	Rua Doutor Maria Cursi	Rua Carlos Vivaldi	594,00	Executado
SM	Avenida Ragueb Chohfi	Praça Felisberto Fernandes da Silva	Rua Forte de Macaé	23.375,16	Em Execução
SM	Avenida Ragueb Chohfi	Rua Forte de Macaé	Avenida Jacu Pêssego		Em Execução
SM	Avenida Mateo Bei	Rua Carlos Vivaldi	Avenida Rio das Pedras	27.100,00	Em Execução
SM	Avenida Mateo Bei - LADO PAR	Praça Felisberto Fernandes da Silva	Avenida Claudio Augusto Fernandes		Em Execução
				56.475,80	

LOTE 12 - CASA VERDE

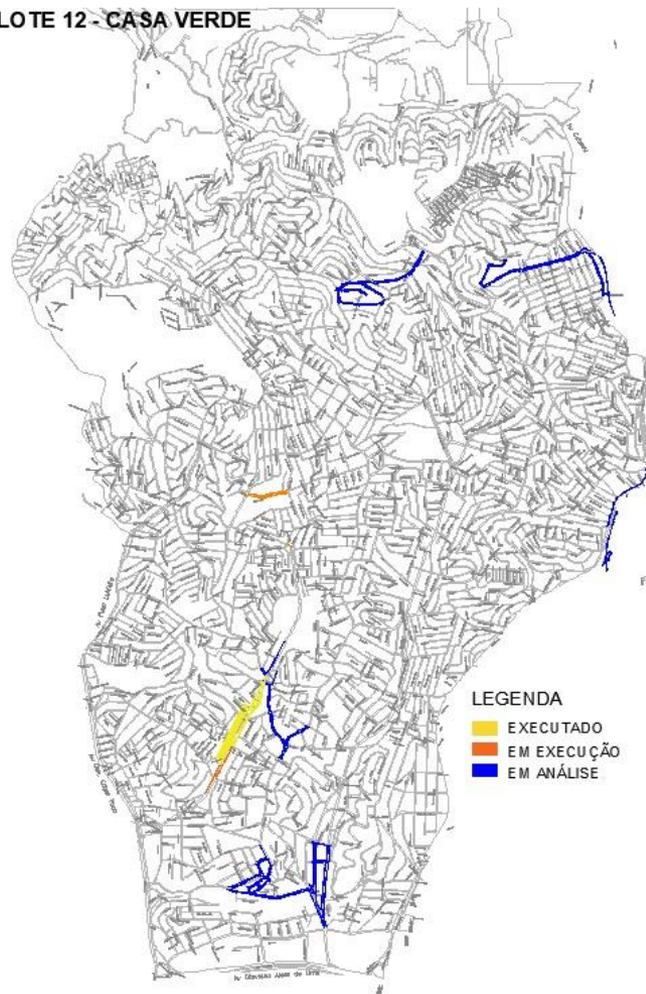

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
CV	Avenida João Marcelino Branco	Avenida Dep. Emílio Carlos	Avenida Imirim	3.033,04	Executado
CV	Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO PAR	Avenida João Marcelino Branco	Rua Maresias	897,30	Em Execução
CV	Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO PAR	Avenida Imirim	Rua Maresias	801,10	Em Execução
CV	Avenida Itaberaba - LADO PAR	Avenida Dep. Emílio Carlos	Lote F037	1.220,80	Em Execução
CV	Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO ÍMPAR	Avenida João Marcelino Branco	Avenida Itaberaba		Em Execução
CV	Avenida Parada Pinto - LADO ÍMPAR	Rua Julião Ferreira da Silva	Rua Vinte e Dois de Agosto	6.818,80	Em Execução
CV	Avenida Parada Pinto - LADO PAR	Rua Nove de Novembro	Largo do Japonês		Em Execução
				12.771,04	

Subprefeitura Freguesia do Ó / Brasilândia


LOTE 12 - FREGUESIA DO Ó



Subprefeitura Freguesia do Ó / Brasilândia


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
FB	Avenida Ministro Petrônio Portella	Rua Doutor Otávio Lobo	Praça Antônia Espinosa Picerni	3.045,77	Executado
FB	Avenida Ministro Petrônio Portella - LADO PAR	Rua Doutor Otavio Lobo	Rua Doutor Jorge Severiano Ribeiro	1.613,04	Em Execução
FB	Avenida Ministro Petrônio Portella - LADO ÍMPAR	Rua Fernando Marchesini	Rua João Cordeiro	1.355,94	Em Execução
FB	Rua José Carlos Monteiro - LADO PAR	Rua Albino Primo Nalim	Rua dos Morgados	102,60	Em Execução
FB	Rua Michihisa Murata	Estrada do Sabão	Rua João Rodrigues Chaves	2.171,00	Em Execução
				8.288,35	

Subprefeitura Sapopemba

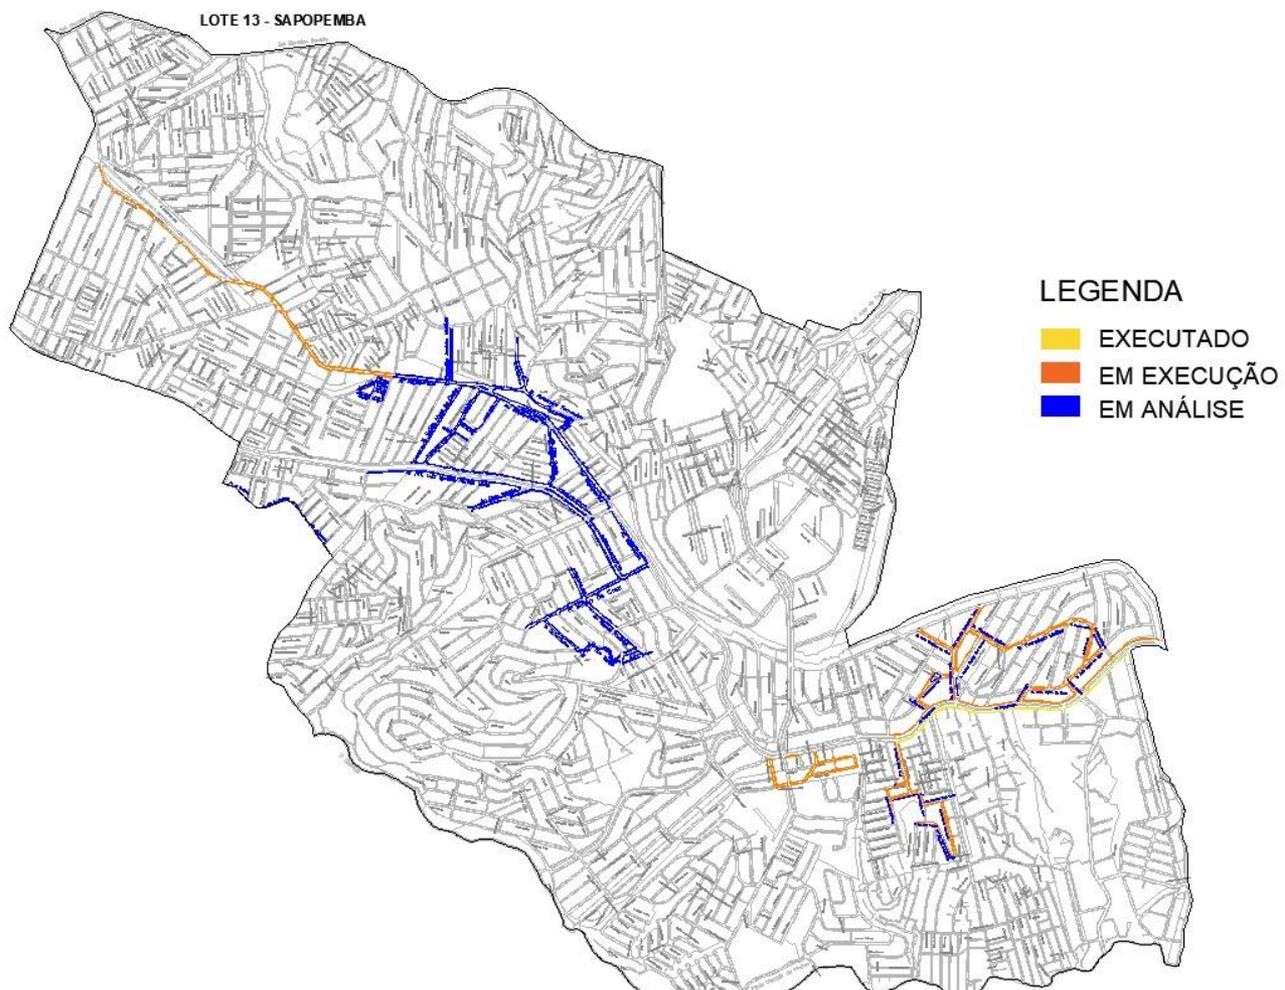

Subprefeitura Sapopemba

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
SB	Avenida Sapopemba	Rua Soldado Candido da Luz Paiva	Rua Alfonso Este	3.044,10	Executado
SB	Avenida Sapopemba	Rua Benjamin de Tudela	Rua Eduardo Antonio de Paulo	1.158,21	Executado
SB	Avenida Sapopemba	Rua Alfonso Este	Rua Benjamin de Tudela	939,92	Executado
SB	Avenida João Rodrigues Ruiz	Rua Victória Marconato Zonta	Avenida Sapopemba	25.603,53	Em Execução
SB	Avenida Sapopemba - LADO ÍMPAR	Divisa de São Mateus	Rua João das Neves		Em Execução
SB	Rua Alves de Torres	Avenida Sapopemba	Rua Cristóvão de Vasconcelos		Em Execução
SB	Rua Angelo Bunioto	Rua João Lopes de Lima	Rua Francisco Matias		Em Execução
SB	Rua Antônio Adorno	Rua João Lopes de Lima	Avenida Sapopemba		Em Execução
SB	Rua Antonio Leal da Silva	Avenida Sapopemba	Rua João Lopes de Lima		Em Execução
SB	Rua Antonio Villares	Rua Cristóvão de Vasconcelos	Rua Arcabuz		Em Execução
SB	Rua Arcabuz	Rua Cristóvão de Vasconcelos	Rua Antonio Villares		Em Execução
SB	Rua Cristóvão de Vasconcelos	Avenida Sapopemba	Rua Alves de Torres		Em Execução
SB	Rua Francisco Barroso	Rua João Pires Monteiro	Rua Victória Marconato Zonta		Em Execução
SB	Rua Francisco Matias	Rua João Lopes de Lima	Rua João Pires Monteiro		Em Execução
SB	Rua João Lopes de Lima	Avenida João Rodrigues Ruiz	Rua Antônio Adorno		Em Execução
SB	Rua José Barbosa da Silva	Avenida João Rodrigues Ruiz	Rua Manuel Quirino de Mattos		Em Execução
SB	Rua Leonardo de Oliveira	Avenida Sapopemba	Rua João Lopes de Lima		Em Execução
SB	Rua Manuel Franca dos Santos - LADO ÍMPAR	Rua Francisco Barroso	Avenida João Rodrigues Ruiz		Em Execução
SB	Rua Sargento Aires Silva Dias	Rua Sargento Luis Rodrigues Filho	Rua Soldado Candido da Luz Paiva		Em Execução
SB	Rua Sargento Benevides Valente Montes - LADO PAR	Rua Soldado Toribio da Silva	Rua Soldado Pedro Graciano Moreira		Em Execução
SB	Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto	Rua Soldado Toribio da Silva	Rua Sargento Luis Rodrigues Filho		Em Execução
SB	Rua Sargento Jorge Moncores	Rua Cabo Paulo Pereira da Silva	Rua Cabo Walmmir Ernesto Holder		Em Execução
SB	Rua Sargento Luis Rodrigues Filho	Rua Sargento Aires Silva Dias	Rua Soldado Luiz Manoel Ferreira		Em Execução
SB	Rua Soldado Candido da Luz Paiva	Avenida Sapopemba	Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto		Em Execução
SB	Rua Soldado Pedro Graciano Moreira	Rua Sargento Benevides Valente Montes	Rua Cabo Paulo Pereira da Silva		Em Execução
SB	Rua Soldado Toribio da Silva	Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto	Rua Sargento Benevides Valente Montes		Em Execução
SB	Rua Victória Marconato Zonta	Avenida João Rodrigues Ruiz	Rua Manuel Quirino de Mattos		Em Execução
SB	Avenida Sapopemba	Rua Padre Atilio Garret	Rua Antonio Pereira Pegas	8.089,53	Em Execução
SB	Avenida Sapopemba - LADO PAR	Rua Galeão	Rua Padre Atilio Garret	8.089,53	Em Execução
				38.835,29	

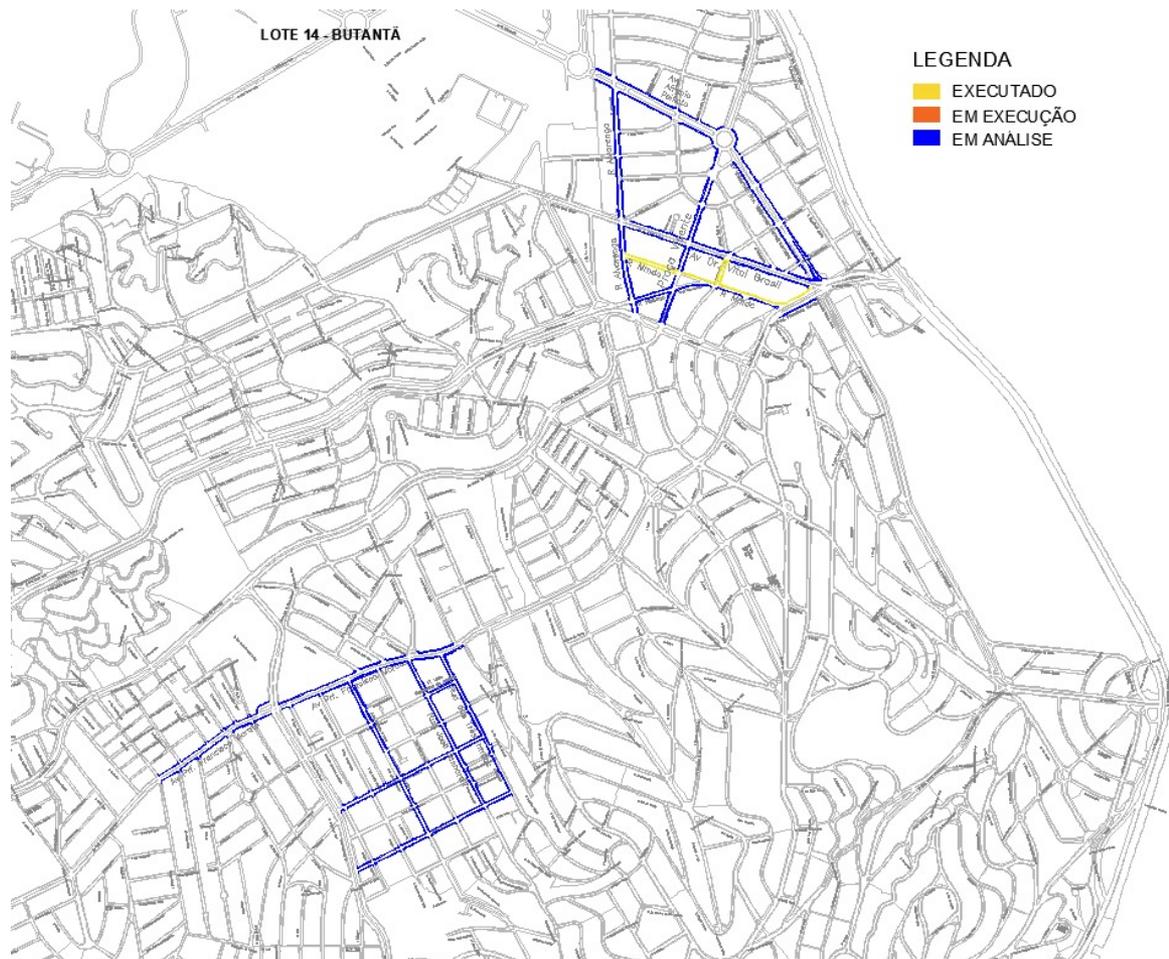


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
BT	Avenida Francisco Morato	Rua M.M.D.C.	Rua Vital Brasil	3.530,03	Executado
BT	Rua Pirajussara	Rua Vital Brasil	Rua M.M.D.C.		Executado
BT	Rua. M.M.D.C.	toda a extensão			Executado
				3.530,03	

LOTE 14 - CAMPO LIMPO


LEGENDA

-  EXECUTADO
-  EM EXECUÇÃO
-  EM ANÁLISE

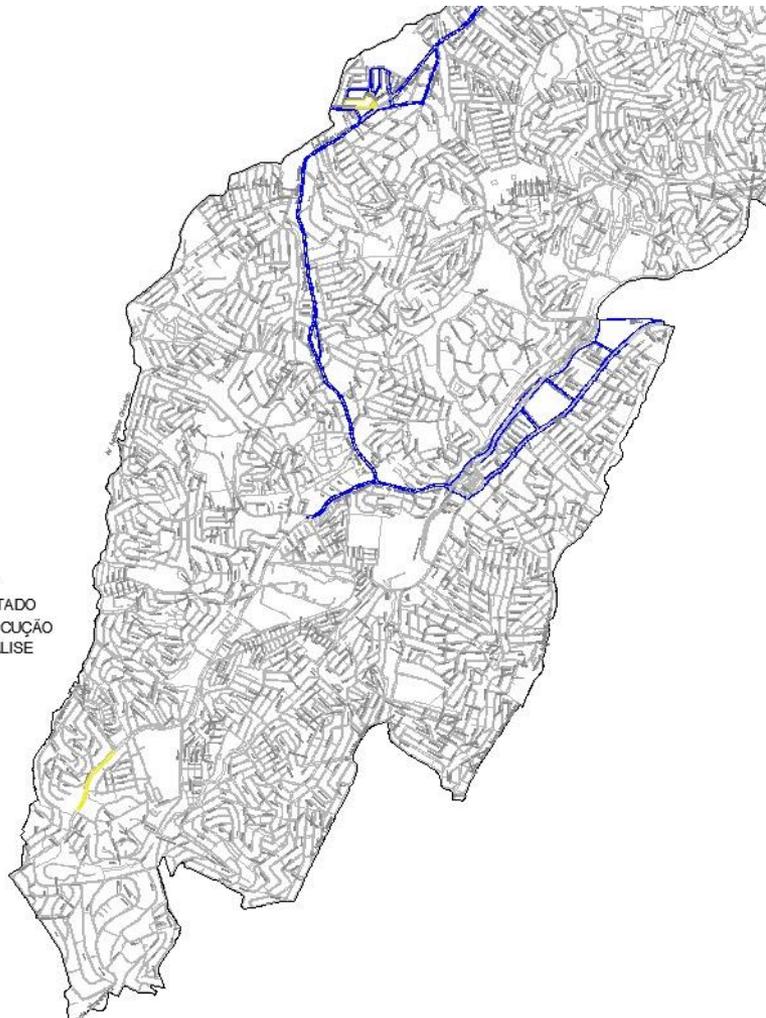


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
CL	Rua Aroldo de Azevedo	Rua Louis Boulanger	Rua Luicínio Rodrigues	2.327,58	Executado
CL	Rua Conrado de Deo	Rua João Batista de Reimão	Rua Lupicínio Rodrigues		Executado
CL	Rua João Batista de Remião	Rua Lupicínio Rodrigues	Rua José Viriato de Castro		Executado
CL	Rua José Viriato de Castro	entorno da praça			Executado
CL	Rua Joviniano Pacheco de Aguirre	Rua Louis Boulanger	Estrada Kizaemon Takeuti		Executado
CL	Rua Louis Boulanger	Rua Vittório Emanuelle Rossi	Rua Doutor Joviniano Pacheco de Aguirre		Executado
CL	Rua Lupicínio Rodrigues	Rua Aroldo de Azevedo	Rua Professor Conrado de Deo		Executado
CL	Estrada de Itapeperica	Rua da Moenda	Avenida Andorinha dos Beirais	3.499,00	Executado
				5.826,58	

LOTE 15 - JABAQUARA

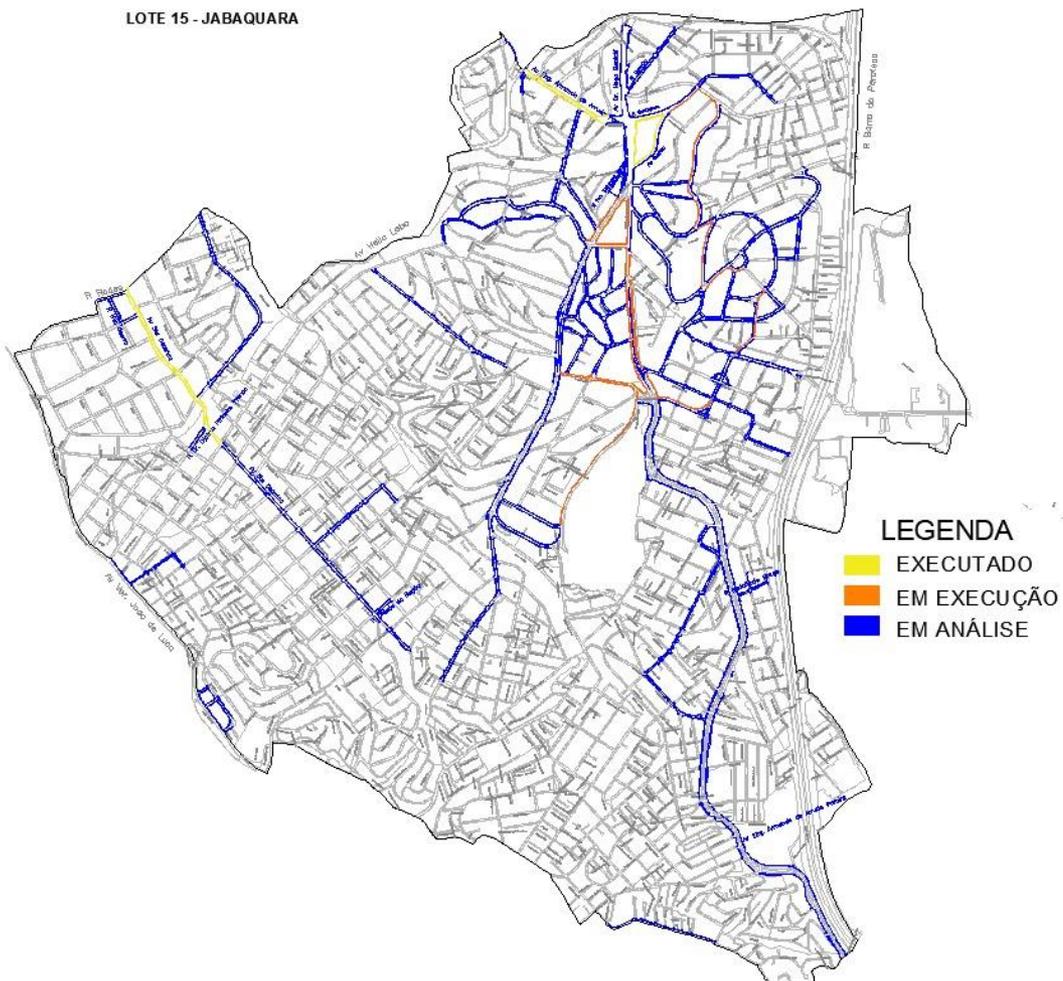

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Rua Rodes	Rua Viçosa do Ceará	3.126,00	Executado
JA	Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR	Avenida Doutor Lino de Moraes Leme	Avenida Damasceno Vieira		Executado
JA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	Avenida Arapuã	Rua das Carnaubearas	3.296,56	Executado
JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Rua Viçosa do Ceará	Avenida Mascote	945,72	Executado
JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Avenida Mascote	Rua Alba	772,59	Executado
JA	Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR	Rua Alba	Avenida Damasceno Vieira	1.296,25	Executado
JA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	Rua Guataparã	Avenida do Café	1.339,20	Executado
JA	Rua Guataparã - LADO PAR	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	Avenida do Café	695,60	Executado
JA	Avenida do Café - LADO ÍMPAR	Rua Guataparã	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	1.039,50	Executado
JA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - LADO PAR	Praça Seicho-No-Lê	Avenida General Valdomiro de Lima	2.131,22	Em Execução
JA	Avenida Engenheiro George Corbisier	Praça Seicho-No-Lê	Avenida General Valdomiro de Lima		Em Execução
JA	Avenida General Valdomiro de Lima	Avenida Armando A. Pereira	Avenida George Corbisier	Em Execução	
JA	Avenida Armando A. Pereira - LADO PAR	Rua dos Jequitibás	Avenida General Valdomiro de Lima	Em Execução	
JA	Avenida Armando A. Pereira - LADO ÍMPAR	Rua Mucuri	Rua dos Comerciários	Em Execução	
JA	Rua dos Jequitibas - LADO PAR	Av. Eng. George Corbisier	Av. Eng. Armando de Arruda Pereira	Em Execução	
JA	Rua dos Jequitibas - LADO ÍMPAR	Av. Francisco de Paula Q. Ribeiro	Avenida George Corbisier	Em Execução	
JA	Avenida Francisco de Paula Ribeiro - AMBOS OS LADOS	Rua dos Jequitibás	Rua Cruz das Almas	Em Execução	
JA	Avenida do Café - LADO PAR	Rua Guataparã	Avenida Diederichsen	Em Execução	
JA	Avenida Diederichsen - LADO PAR	Avenida do Café	Avenida Leonardo da Vinci	Em Execução	
JA	Avenida Leonardo da Vinci - LADO PAR	Avenida Diederichsen	Rua Bicudo de Brito	Em Execução	
JA	Avenida Leonardo da Vinci - LADO ÍMPAR	Rua Lussanvira	Praça Nova América	Em Execução	
JA	Rua Bicudo de Brito - LADO PAR	Avenida Leonardo da Vinci	Rua Lussanvira	Em Execução	
JA	Rua Lussanvira - LADO PAR	Rua Bicudo de Brito	Av Leonardo da Vinci	Em Execução	
JA	Praça Nova América	Entorno da Praça		Em Execução	
JA	Rua Inatajuba - LADO PAR	Praça Nova América	Rua Bicudo de Brito	Em Execução	
JA	Rua Bicudo de Brito - LADO ÍMPAR	Rua Inatajuba	Rua Ouricana	Em Execução	
JA	Rua Ouricana - LADO ÍMPAR	Rua Bicudo de Brito	Rua Ocarina	Em Execução	
JA	Rua Ouricana - LADO PAR	Rua Ocarina	Rua Pampa	Em Execução	
JA	Rua Charruas - LADO PAR	Rua Pampa	Avenida Getúlio Vargas Filho	Em Execução	
JA	Rua dos Comerciários - LADO ÍMPAR	Av. Eng. Armando de Arruda Pereira	Praça Dacio Pires Correia	Em Execução	
JA	Praça Dacio Pires Correia	Rua dos Comerciários	Rua Nelson Fernandes	Em Execução	
				33.339,33	


LOTE 16 - LAPA

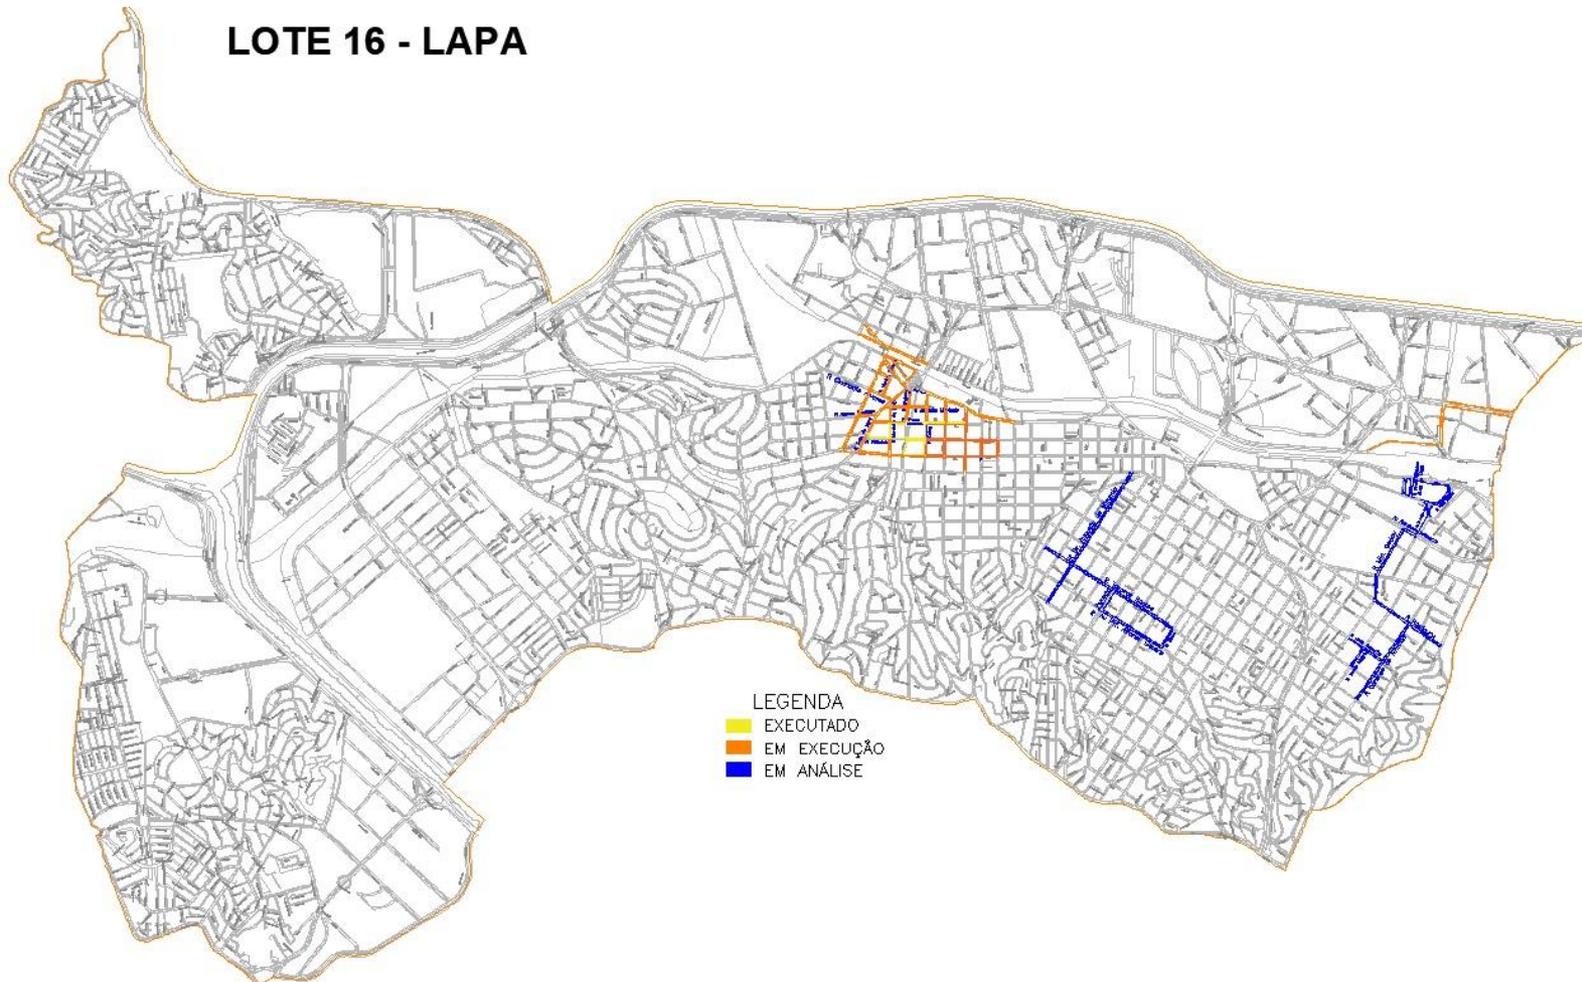

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
LA	Rua Faustolo	Rua Jeroaquara	Rua Nossa Senhora da Lapa	3.342,00	Executado
LA	Rua Roma	Rua Aurélia	Rua Trajano		Executado
LA	Rua Faustolo - LADO PAR	Rua Catão	Rua Jeroaquara	977,21	Executado
LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Faustolo	Rua Roma		Executado
LA	Rua Faustolo - LADO ÍMPAR	Rua Jeroaquara	Rua Catão	828,50	Executado
LA	Rua Jeroaquara - LADO ÍMPAR	Rua Clélia	Rua Faustolo		Executado
LA	Rua Catão - LADO PAR	Rua Roma	Rua Clélia	1.303,24	Executado
LA	Rua Clélia - LADO PAR	Rua Catão	Rua Jeroaquara		Executado
LA	Rua Faustolo	Rua Aurélia	Rua Cipão	3.615,29	Em Execução
LA	Rua Aurélia	Rua Guaicurus	Rua Coriolano		Em Execução
LA	Avenida Doutor Abraao Ribeiro - LADO PAR	Rua Professor Joaquim Monteiro de Carvalho	Avenida Marq. De São Vicente	10.704,00	Em Execução
LA	Avenida Marq. de São Vicente	Avenida Doutor Abraao Ribeiro	Rua Quirino dos Santos		Em Execução
LA	Rua Jornalista Alysio Biondi - LADO ÍMPAR	Avenida Thomas Edson	Avenida Antartica		Em Execução
LA	Rua Quirino dos Santos	Avenida Marquês de São Vicente	Avenida Thomas Edson		Em Execução
LA	Rua Cipião	Rua Roma	Rua Clélia	10.449,55	Em Execução
LA	Rua Clélia	Rua Catão	Rua Vespasiano		Em Execução
LA	Rua Clélia - LADO ÍMPAR	Rua Catão	Rua Jeroaquara		Em Execução
LA	Rua Espartaco	Rua Faustolo	Rua Clélia		Em Execução
LA	Rua Faustolo	Rua Catão	Rua Cipião		Em Execução
LA	Rua Faustolo	Rua Aurélia	Rua Vespasiano		Em Execução
LA	Rua Roma - LADO ÍMPAR	Rua Catão	Rua Aurélia		Em Execução
LA	Rua Vespasiano	Rua Faustolo	Rua Clélia		Em Execução
LA	Rua Engenheiro Fox	Rua William Speers	Rua Engenheiro Aubertin	5.060,58	Em Execução
LA	Rua William Speers	Rua Engenheiro Aubertin	Rua Antonio Brito Marques		Em Execução
LA	Rua Afonso Sardinha	Rua Nossa Senhora Da Lapa	Rua Doze de Outubro	31.221,17	Em Execução
LA	Rua Catão	Rua Guaicurus	Rua Roma		Em Execução
LA	Rua Cipião	Rua Guaicurus	Rua Roma		Em Execução
LA	Rua Clelia	Rua Doze de Outubro	Rua Jeroaquara		Em Execução
LA	Rua Clemente Alvares	Rua Doze de Outubro	Rua Nossa Senhora Da Lapa		Em Execução
LA	Rua Conrado Moreschi - LADO PAR	Rua John Harrison	Rua Hebart		Em Execução
LA	Rua Doze de Outubro	Rua John Harrison	Rua Br. de Jundiáí		Em Execução
LA	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Doze de Outubro	Rua Hebart		Em Execução
LA	Rua Dronsfield	Rua Doze de Outubro	Rua Martim Tenorio		Em Execução
LA	Rua Guaicurus	Rua Catão	Rua Caio Graco		Em Execução
LA	Rua Hebart - LADO ÍMPAR	Rua John Harrison	Rua Conrado Moreschi		Em Execução
LA	Rua Joaquim Machado	Rua Nossa Senhora da Lapa	Rua Catão		Em Execução
LA	Rua John Harrison	Rua Doze de Outubro	Rua Hebart		Em Execução
LA	Rua Martim Tenorio	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Clemente Alvares		Em Execução
LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Joaquim Machado	Rua Roma		Em Execução
LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Faustolo	Rua Clelia		Em Execução
LA	Rua Nossa Senhora da Lapa	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Clelia	Em Execução	
LA	Rua Roma	Rua Nossa Senhora Da Lapa	Rua Monteiro de Melo	Em Execução	
LA	Rua Trajano	Praça Malvin Jones	Rua Roma	Em Execução	

33.339,33


LOTE 17 - GUAIANASES

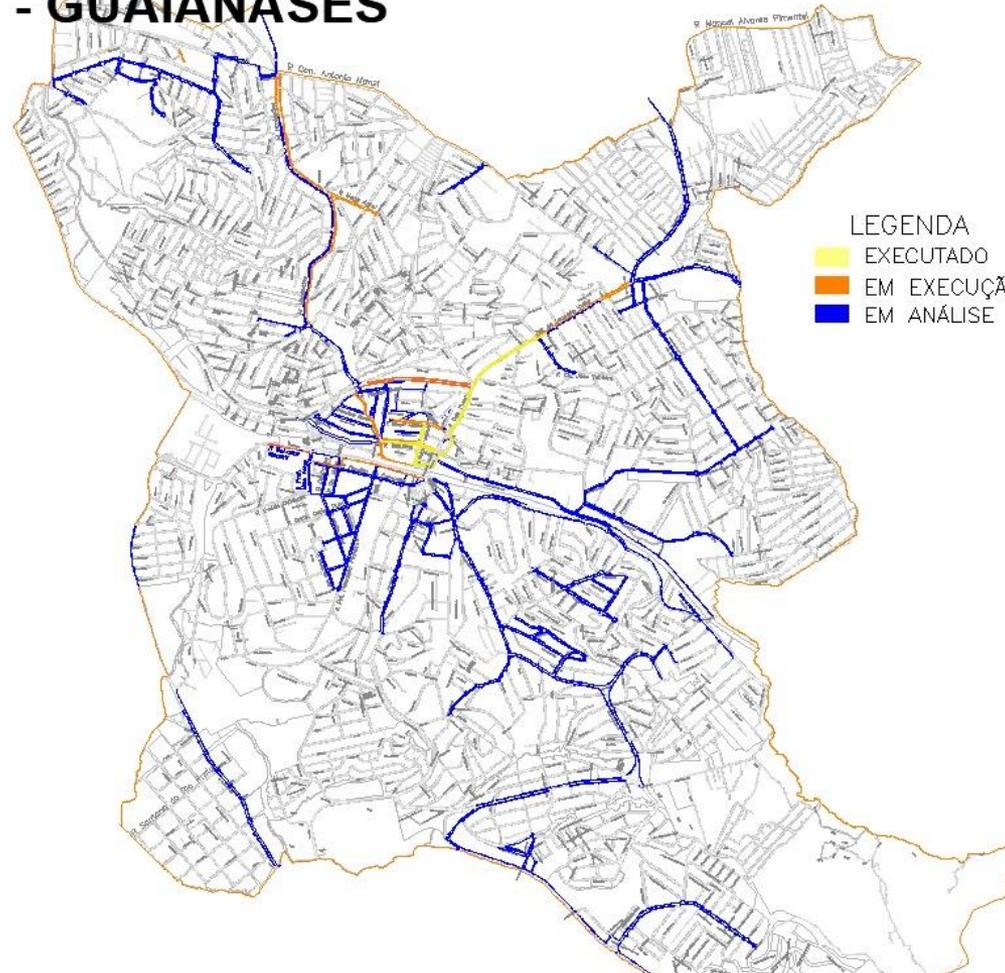

Subprefeitura Guaianases

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
G	Estrada Lageado Velho	TrAvenida Domingo na Praça	Rua Capitão Pucci	3.400,05	Executado
G	Rua Capitão Pucci	Estrada Lageado Velho	Rua Professor Cosme Deodato Tadeu		Executado
G	Rua Belmiro Valverde -LADO PAR	Rua Gaspar Aranha	Rua Getulina	707,78	Executado
G	Rua Getulina	Rua Belmiro Valverde	Viaduto Antônio Silvio Cunha Bueno		Executado
G	Rua Belmiro Valverde	Rua Getulina	Rua Antonio Caria	1.366,89	Executado
G	Rua Getulina	Rua Belmiro Valverde	Rua Serra dos Cristais		Executado
G	Rua Belmiro Valverde - LADO PAR	Rua Getulina	Rua Copenhague	1.010,31	Executado
G	Rua Copenhague	Rua Belmira Valverde	Rua Capitão Pucci		Executado
G	Rua Getulina - LADO ÍMPAR	Rua Belmiro Valverde	Rua Capitão Pucci		Executado
G	Rua General Americano Freire - LADO ÍMPAR	Rua Cap. Pucci	Rua Paracuru	8.531,21	Em Execução
G	Rua General Americano Freire - LADO PAR	Rua Andes	Rua Brig. Hadman		Em Execução
G	Rua Hipolito de Camargo - LADO PAR	Rua Doutor Meira Pena	Rua Buerarema		Em Execução
G	Rua Salvador Gianetti - LADO PAR	Rua Lepidolita	Rua Prof Melo Paiva		Em Execução
G	Rua Salvador Gianetti - LADO PAR	Rua Professor Francisco Pinheiro	Travessa Joaquim Leite		Em Execução
G	Avenida Nordeste - LADO ÍMPAR	Rua Porto do Bezerra	Rua Com. Antonio Manzi		Em Execução
G	Estrada do Lageado Velho - LADO ÍMPAR	Rua Igarape Mirim	Rua Doutor José Gravonski	12.191,02	Em Execução
G	Estrada do Lageado Velho - LADO PAR	Rua Dom José Antonio do Couto	Rua Planície dos Goitacases		Em Execução
G	Rua Bom Jesus da Penha	Rua Tristão Gago	Rua Copenhague		Em Execução
G	Rua Copenhague - LADO PAR	Rua Bom Jesus da Penha	Rua Belmiro Valverde		Em Execução
G	Rua Getulina - LADO PAR	Rua Serra dos Cristais	Rua Belmiro Valverde		Em Execução
G	Rua Nanci Ackel	Avenida Nordeste	Rua Serra da Queimada		Em Execução
				27.207,26	


LOTE 18 - ITAQUERA

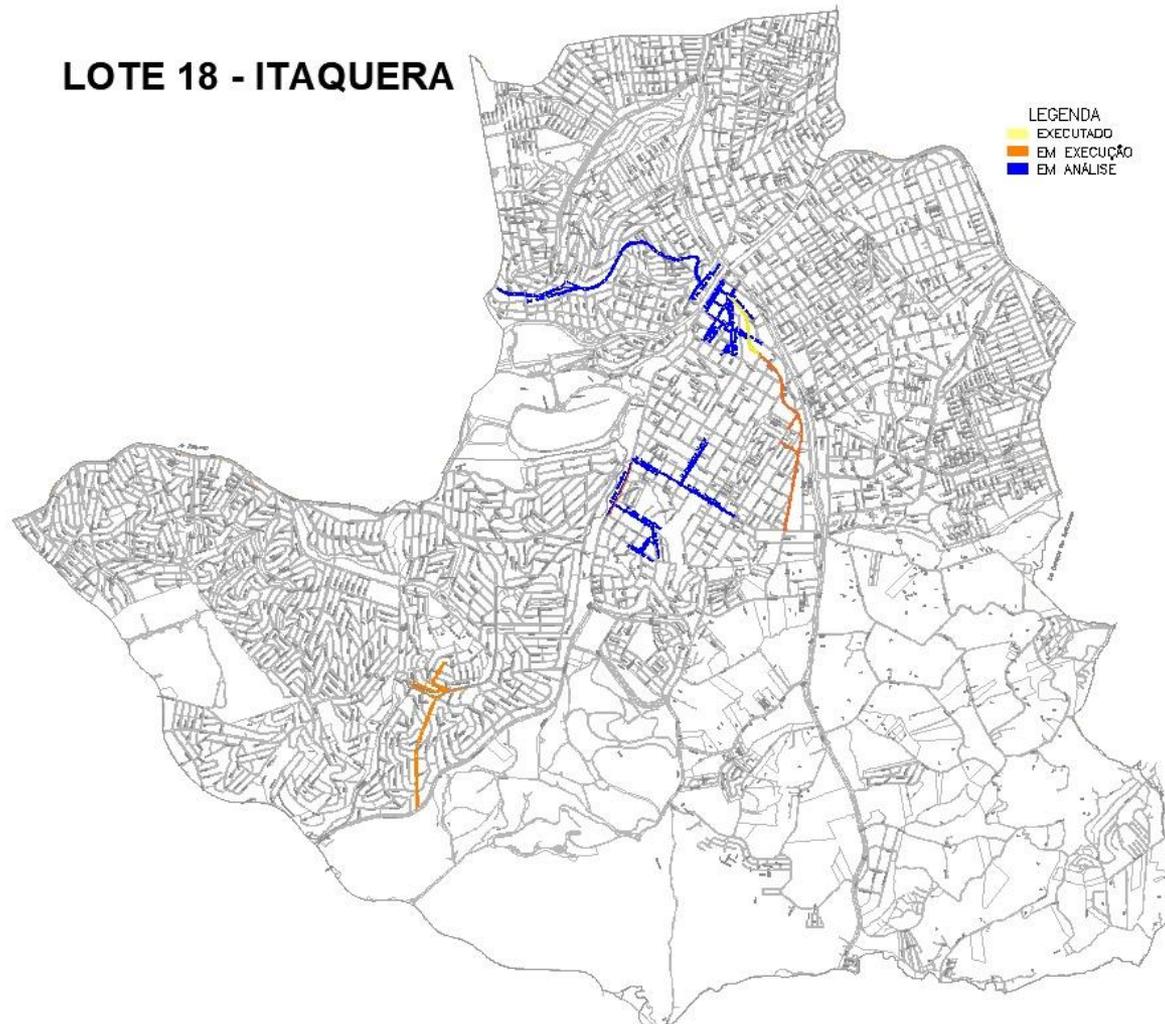

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
IQ	Rua Victório Santim	Rua Américo Salvador Novelli	Rua Fontoura Xavier	2.377,50	Executado
IQ	Rua Victório Santim	Rua Fontoura Xavier	Rua Toritama	987,00	Executado
IQ	Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR	Rua Flores do Piaui	Rua Fontoura	1.348,26	Em Execução
IQ	Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR	Rua Toritama	Rua Colonial das Missões		Em Execução
IQ	Rua Ipipoca	Rua Serra de São Domingos	Rua Victor Santim	11.871,12	Em Execução
IQ	Rua Serra de São Domingos - LADO ÍMPAR	Rua Victor Santim	Rua Almeirim		Em Execução
IQ	Rua Serra de São Domingos - LADO PAR	Rua Victor Santim	Rua Pedro Leopoldo		Em Execução
IQ	Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR	Rua S. Teodoro	Rua Colonial das Missões		Em Execução
IQ	Rua Victório Santim - LADO PAR	Rua S. Teodoro	Rua Andiratuba		Em Execução
IQ	Avenida Harry Dannermberg - LADO ÍMPAR	Rua Itapitanga	Rua S. João das Duas Barras	1.799,46	Em Execução
IQ	Avenida Maria Luiza Americano - LADO ÍMPAR	Avenida Afonso de Sampaio e Souza	Rua Biagio Marini	11.340,66	Em Execução
IQ	Avenida Maria Luiza Americano - LADO PAR	Avenida Afonso de Sampaio e Souza	Rua Povuacu		Em Execução
IQ	Rua Aquino Fonseca	Rua Pierre Gaetan Leymarie	Final da rua sem saída		Em Execução
IQ	Rua Coronel Albert de Rochas D'Algum - LADO ÍMPAR	Avenida Maria Luiza Americano	Rua Rolando Mario Ramacciotti		Em Execução
IQ	Rua Coronel Albert de Rochas D'Aiglum - LADO PAR	Avenida Maria Luiza Americano	Rua Gustavo Geley		Em Execução
IQ	Rua Estevão Dias Vergara	Avenida Maria Luiza Americano	Rua Peixoto Viegas		Em Execução
IQ	Rua Gustavo Geley - LADO ÍMPAR	Rua Bagio Marini	Travessa		Em Execução
IQ	Rua Gustavo Geley - LADO PAR	Rua Bagio Marini	Rua Aquino Fonseca		Em Execução
				29.724,00	

Subprefeitura Vila Maria / Vila Guilherme

LOTE 19 - VILA MARIA

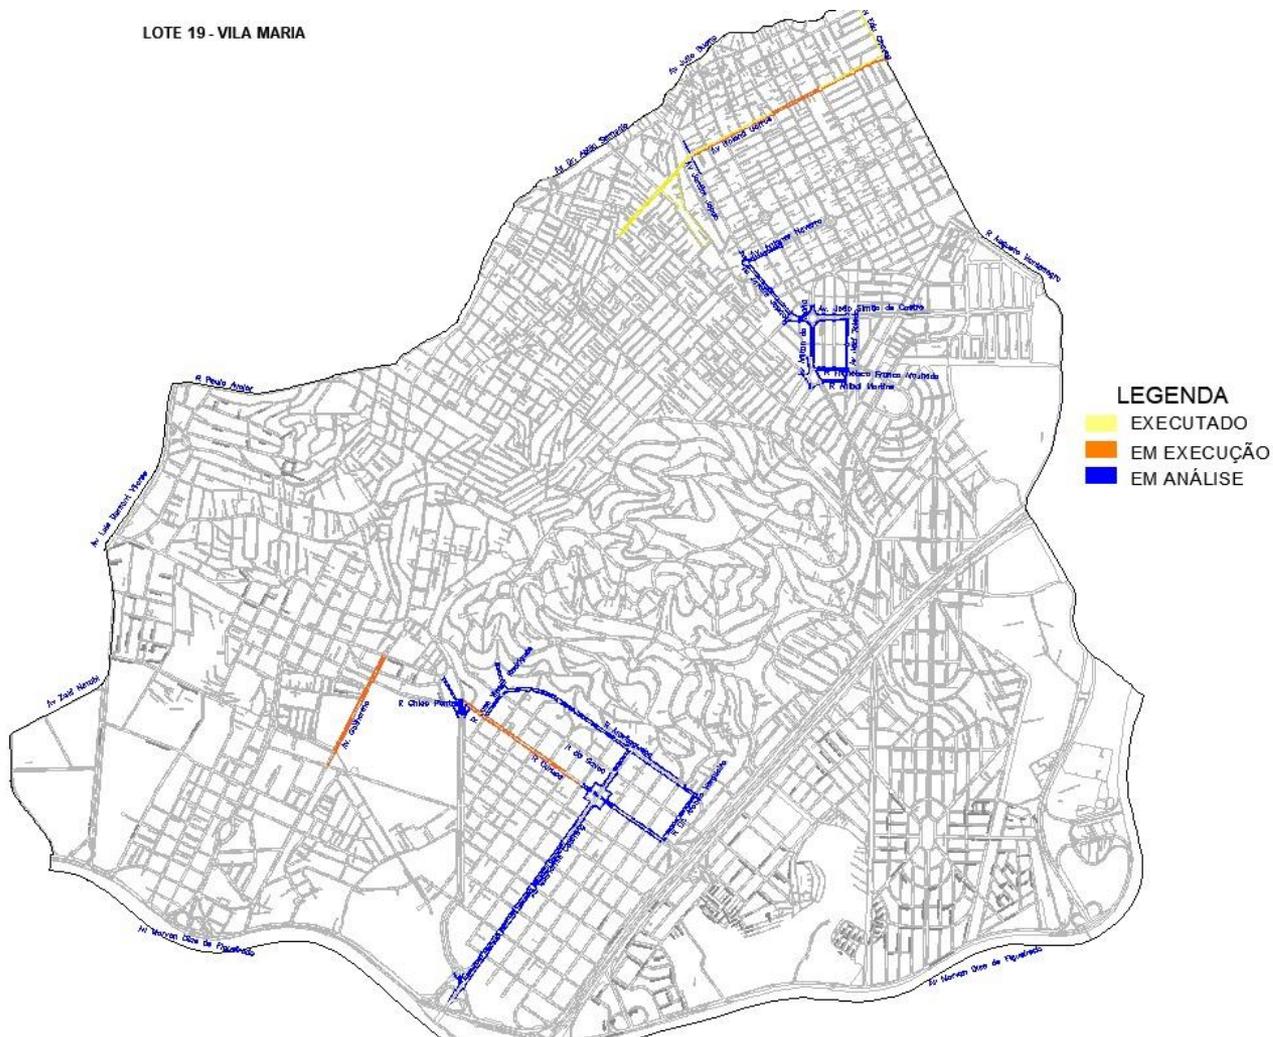


Subprefeitura Vila Maria / Vila Guilherme

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
MG	Avenida Roland Garros	Avenida Jardim Japão	Rua Odília de Medeiros	1.999,13	Executado
MG	Avenida Roland Garros - LADO PAR	Avenida Jardim Japão	Rua Edgar Ruzant	1.385,90	Em Execução
MG	Avenida Roland Garros	Rua Edgar Ruzant	Avenida Mendes da Rocha	1.530,75	Em Execução
MG	Avenida Roland Garros - LADO ÍMPAR	Avenida Mendes da Rocha	Avenida Edu Chaves	994,03	Executado
MG	Avenida Roland Garros - LADO PAR	Avenida Mendes da Rocha	Avenida Edu Chaves	1.084,23	Em Execução
MG	Avenida Edu Chaves - LADO PAR	Travessa Antonio Balzano	Avenida Roland Garros	1.338,34	Executado
MG	Avenida Roland Garros - LADO ÍMPAR	Avenida Jardim Japão	Rua Edgar Ruzant	1.407,64	Executado
MG	Avenida Guilherme - LADO ÍMPAR	Rua João Veloso Filho	Avenida Maria Cândida	12.415,25	Em Execução
MG	Avenida Guilherme - LADO PAR	Rua S. Quirino	Avenida Maria Cândida		Em Execução
MG	Rua Curuça - LADO ÍMPAR	Avenida Nadir Dias de Figueiredo	Rua Itauna		Em Execução
MG	Rua Curuça - LADO PAR	Rua Guaranesia	Rua Burarama		Em Execução
MG	Avenida Antenor Navarro	Av. Ramiz Galvão	Avenida Jardim Japão	13.298,20	Em Execução
MG	Avenida Jardim Japão	Tv. Gil Borges	Avenida João Simão de Castro		Em Execução
MG	Avenida João Simão de Castro	Avenida Jardim Japão	Rua Jaci Toledo		Em Execução
MG	Rua Canapolis - LADO ÍMPAR	Avenida Jardim Japão	Rua Rodrigues de Barros		Em Execução
MG	Rua Jaci Toledo	Avenida João Simão de Castro	Rua Francisco Franco Machado		Em Execução
MG	Avenida Milton da Rocha - LADO ÍMPAR	Avenida João Simão de Castro	Praça Angelo Conti		Em Execução
MG	Avenida Milton da Rocha - LADO PAR	Avenida João Simão de Castro	Rua Francisco Franco Machado		Em Execução
MG	Praça Angelo Conti - LADO ÍMPAR	Avenida Milton da Rocha	Avenida Gustavo Adolfo		Em Execução
MG	Praça Angelo Conti - LADO PAR	Avenida Gustavo Adolfo	Avenida Prof Castro Junior		Em Execução
MG	Praça Angelo Conti - LADO PAR	Rua Anibal Martins	Rua Francisco Franco Machado		Em Execução
MG	Rua Francisco Franco Machado	Praça Angelo Conti	Rua Jaci Toledo	Em Execução	
MG	Rua Anibal Martins	Avenida Mali Argolo	Rua Jaci Toledo	Em Execução	
MG	Avenida Guilherme Cotching - LADO PAR	Rua Izidoro Matheus	Praça Sto. Eduardo	12.566,11	Em Execução
MG	Avenida Guilherme Cotching - LADO PAR	Praça Sto. Eduardo	Rua Gavea		Em Execução
MG	Praça Sto. Eduardo - LADO PAR	Entorno da Praça			Em Execução
MG	Av. Guilherme Cotching - LADO ÍMPAR	Praça Sto. Eduardo	Rua Ararituaba		Em Execução
MG	Av. Guilherme Cotching - LADO ÍMPAR	Praça Sto. Eduardo	Av. Nadir Dias de Figueiredo		Em Execução
MG	Praça Sto. Eduardo - LADO ÍMPAR	Entorno da Praça			Em Execução
				48.019,59	

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

LOTE 20 - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

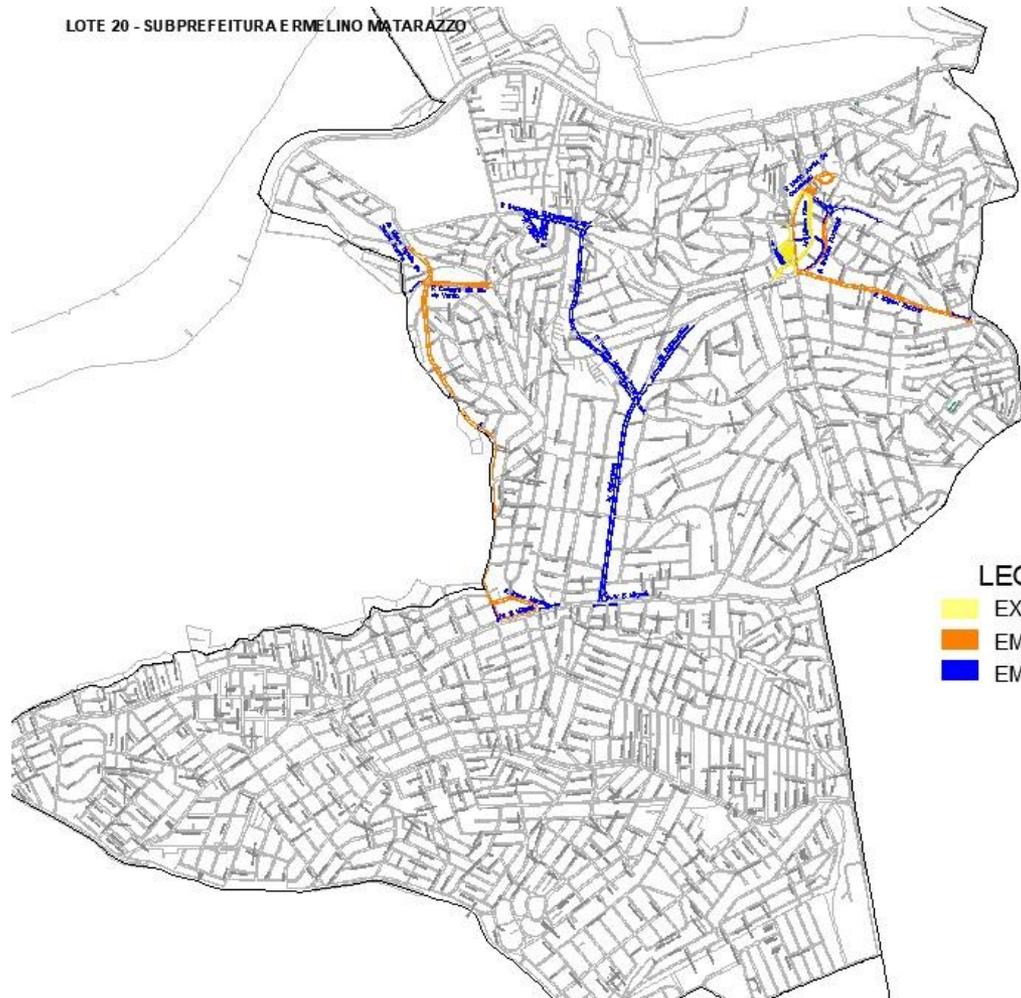


LEGENDA

-  EXECUTADO
-  EM EXECUÇÃO
-  EM ANÁLISE

Subprefeitura Ermelino Matarazzo


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
EM	Avenida Milene Elias	Avenida Paranaguá	Avenida Botussuru	3.223,16	Executado
EM	Avenida Paranaguá	Rua Shobee Kumagai	Rua Rui Pirozzelli		Executado
EM	Rua Dona Maria Jovita da Conceição	Praça 1º de Maio	Rua Ver. José de Azevedo Guerra		Executado
EM	Rua Fioravante Lopes Garcia	Avenida Paranaguá	Rua Isaac Gonçalves		Executado
EM	Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR	Rua Domingos Scarpel	Travessa Friso Fernandes de Oliveira	959,90	Executado
EM	Rua Domingos Scarpel - LADO PAR	Rua Dona Maria Jovita da Conceição	Avenida Milene Dias		Executado
EM	Avenida Milene Elias	Rua Domingos Scarpel	Rua Alto Pacajá	836,24	Executado
EM	Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR	Travessa Friso Fernandes de Oliveira	Rua João Ribeiro Pereira		Executado
EM	Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR	Rua João Ribeiro	Avenida Paranaguá		Executado
EM	Avenida Milene Elias - LADO PAR	Rua Alto do Pacajá	Avenida Paranaguá	963,38	Executado
EM	Avenida Paranaguá - LADO PAR	Avenida Milene Elias	Rua Dona Maria Jovita da Conceição	24.552,94	Em Execução
EM	Avenida São Miguel - LADO ÍMPAR	Rua Olavo Egidio de Souza Aranha	Rua Rosa Mendes		Em Execução
EM	Rua Gambarra	Rua Dona Maria Jovita da Conceição	Rua Hilária		Em Execução
EM	Rua Gambarra	Rua Hilária	Rua Dona Maria Jovita da Conceição		Em Execução
EM	Rua Miguel Rachid - LADO ÍMPAR	Rua Shobbe Kumagai	Rua Victoria Simionato		Em Execução
EM	Rua Miguel Rachid - LADO PAR	Rua Shobbe Kumagai	Rua Francisco Antonio Miranda		Em Execução
EM	Rua Caiçara do Rio do Vento	Rua Olavo Egidio de Souza Aranha	Rua Barra de Santa Rosa		Em Execução
EM	Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO ÍMPAR	Avenida Milene Elias	Rua Carmem Magnani		Em Execução
EM	Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO PAR	Travessa Friso Fernandes de Oliveira	Rua Carmem Magnani		Em Execução
EM	Rua Olavo Egidio de Souza Aranha - LADO ÍMPAR	Rua Nova Palmeira	Rua Rosa Mendes		Em Execução
EM	Rua Olavo Egidio de Souza Aranha - LADO PAR	Avenida Wenceslay Guimarães	Avenida São Miguel		Em Execução
EM	Rua Rosa Mendes - LADO PAR	Rua Olavo Egidio de Souza Aranha	Avenida São Miguel		Em Execução
EM	Rua Shobee Kumagai - LADO ÍMPAR	Rua Alto Pacaja	Rua João Ribeiro Pereira		Em Execução
EM	Rua Shobee Kumagai - LADO PAR	Rua Antonio Freitas Toledo	Rua Miguel Rachid		Em Execução
				48.019,59	

LOTE 20 - SUBPREFEITURA PENHA

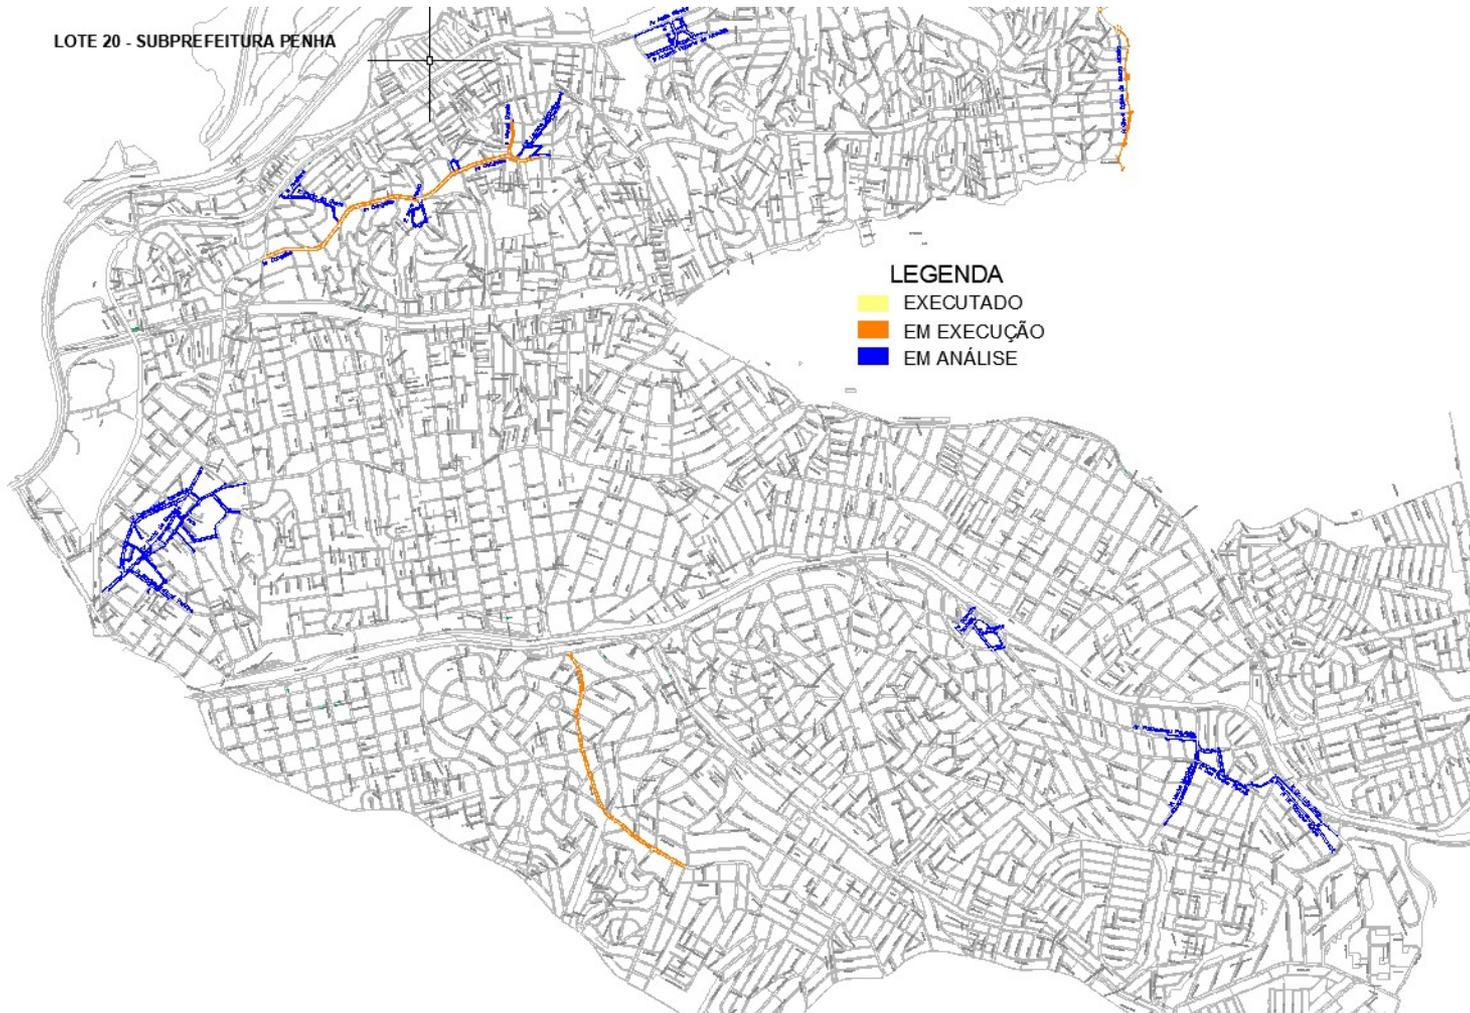

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
PE	Avenida Waldemar Carlos Pereira	Rua Dona Matilde	Avenida Pauster	10.107,00	Em Execução
PE	Rua Dona Matilde	Rua Joaquim Marra	Rua Hercília		Em Execução
PE	Avenida Cangaíba	Rua Bartolomeu Quadros	Rua Antonio de Arzão	11.094,82	Em Execução
PE	Rua Miguel Garcia	Avenida Cangaíba	Travessa Américo Martins Peixoto		Em Execução
PE	Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO ÍMPAR	Avenida São Miguel	Rua Vera	5.876,76	Em Execução
PE	Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO PAR	Rua Coremu	Rua Olivia de Oliveira		Em Execução
				27.078,58	


LOTE 21 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

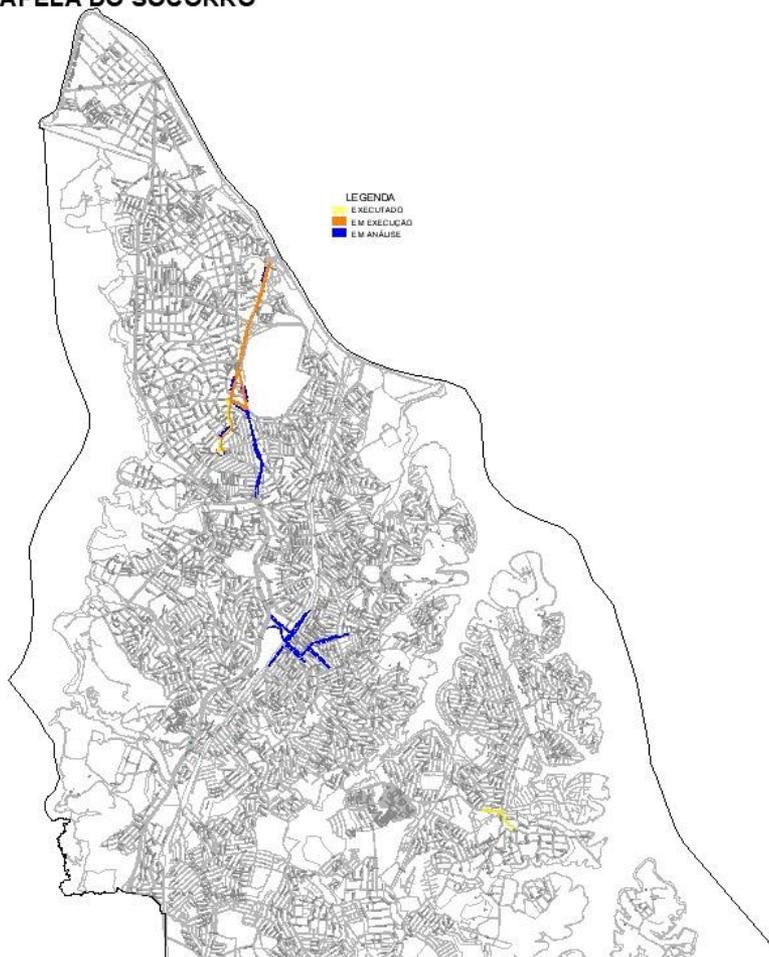

Subprefeitura Capela do Socorro


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO ÍMPAR	Rua Clarissa	Travessa Viela A	2.632,00	Executado
CS	Avenida Interlagos - LADO PAR	Praça Batista Botelho	Rua Mahatman Gandhi	2.933,87	Executado
CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR	nº 6000 da Avenida Dona Belmira Marin	Avenida Carlos Barbosa Santos	1.345,00	Executado
CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR	Avenida Carlos Barbosa Santos	Praça Irara Branca	1.245,00	Executado
CS	Avenida do Jangadeiro	Avenida Interlagos	Avenida Senador Teotonio Vilela	20.250,25	Em Execução
CS	Avenida Interlagos	Avenida do Jangadeiro	Rua Pedras Talhadas		Em Execução
CS	Avenida Interlagos - LADO ÍMPAR	Rua Pde. José Garzotti	Avenida do Jangadeiro		Em Execução
CS	Avenida Senador Teotonio Vilela	Avenida Interlagos	Avenida do Jangadeiro		Em Execução
				28.406,12	

LOTE 22 - SUBPREFEITURA ARICANDUVA

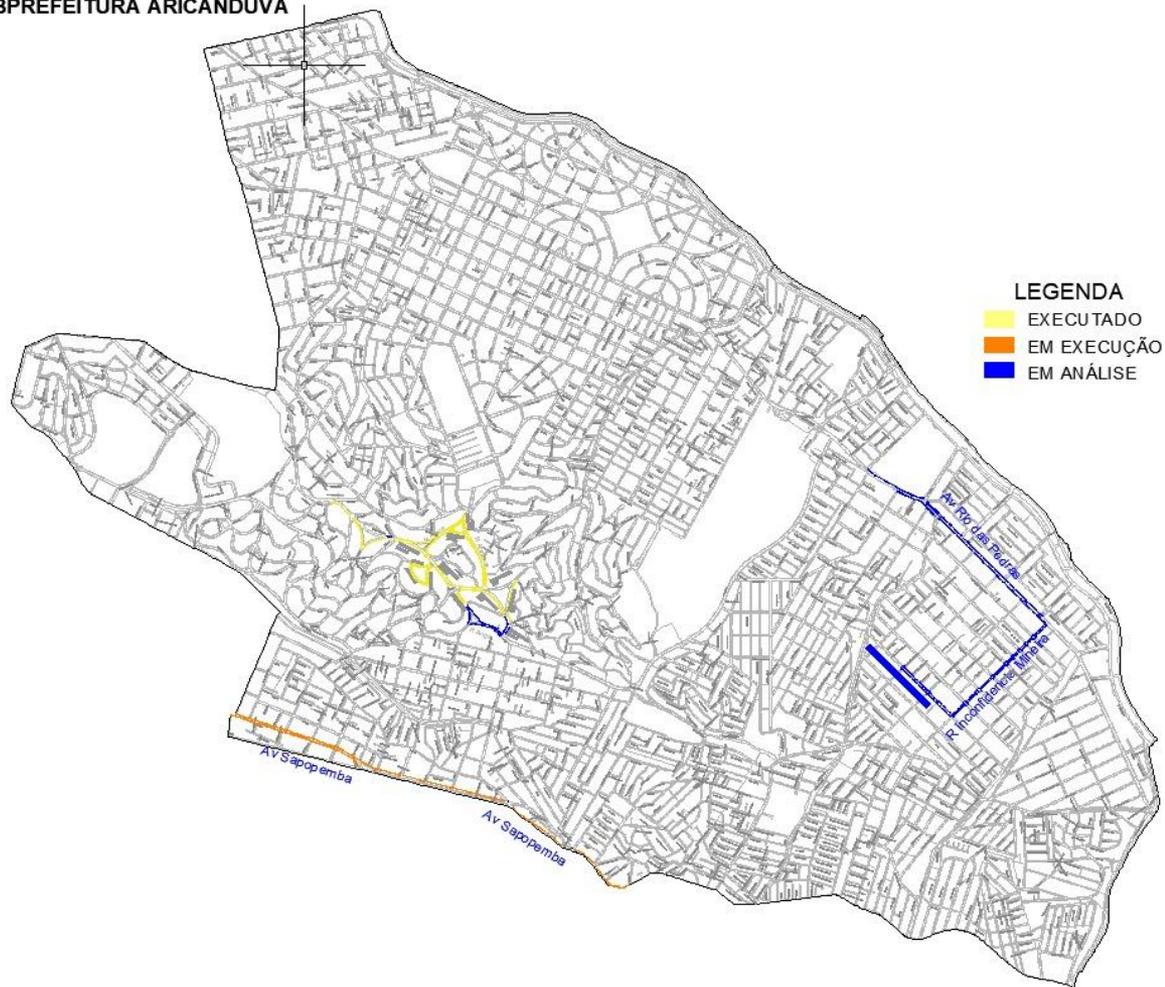


Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching	Praça Comendador Tadashi Nishi	Rua Saigon	3.115,55	Executado
AF	Praça Canárias	Entorno da praça			Executado
AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching	Praça Sampaio Vidal	Praça Skal	3.128,44	Executado
AF	Praça Sampaio Vidal	entorno da praça			Executado
AF	Rua São Ticiano	Rua Argonautas	Praça Skal		Executado
AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Asfaltite	Praça Canárias	1.152,00	Executado
AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Tauande	Rua Arapacu		Executado
AF	Praça Nossa Senhora das Vitórias - LADO PAR	Rua Asfaltite	Lote 0058		Executado
AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Tauande	Rua Arapacu	1.240,00	Executado
AF	Rua Granjão - LADO PAR	Rua Arapacu	Lote 0075		Executado
AF	Avenida Eduardo Cotching - LADO ÍMPAR	Rua Joaquim Figueira	Rua Pretoria	5.230,20	Em Execução
AF	Rua Arace - LADO ÍMPAR	Rua Pretoria	Praça Inspetor Pedro Gomes		Em Execução
AF	Rua Arace - LADO PAR	Avenida Eduardo Cotching	Rua Diogo Marinho Silva		Em Execução
AF	Rua Arapoca - LADO ÍMPAR	Rua Diogo Marinho Silva	Avenida Eduardo Cotching		Em Execução
AF	Rua Arapoca - LADO PAR	Praça Inspetor Pedro Gomes	Avenida Eduardo Cotching		Em Execução
AF	Avenida Sapopemba	Rua Antonio Gomes	Avenida da Barreira Grande		Em Execução
				26.818,40	

LOTE 23 - IPIRANGA

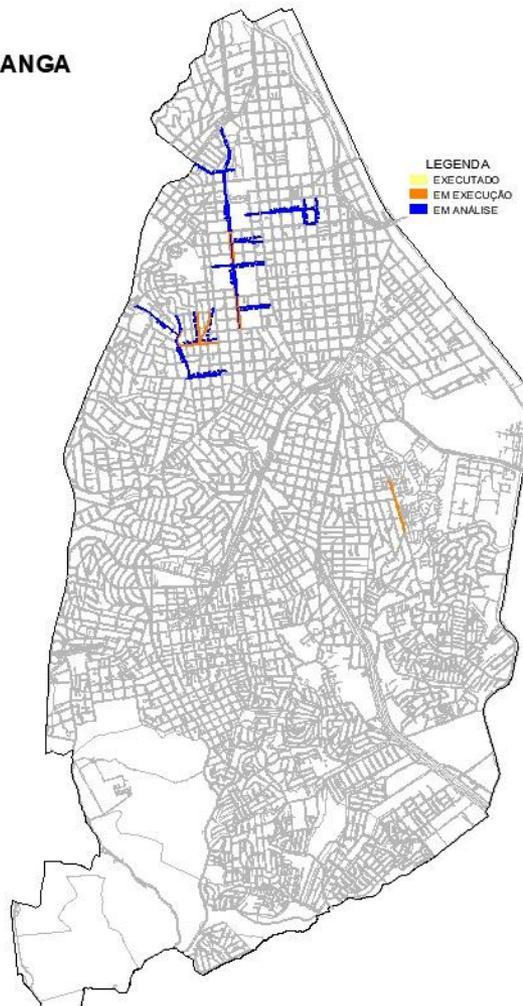

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
IP	Estrada das Lágrimas	Rua Santa Fé	Rua Protocolo	1.869,92	Em Execução
IP	Avenida Nazaré	Rua Moreira Godoi	Rua Padre Marchetti	12.738,00	Em Execução
IP	Avenida Nazaré - LADO ÍMPAR	Rua Antonio Marcondes	Rua Arcipreste Andrade		Em Execução
IP	Avenida Nazaré - LADO PAR	Rua Antonio Marcondes	Rua Vieira de Almeida		Em Execução
IP	Rua Doutor Elísio de Castro	Rua Vergueiro	Rua Gama Lobo		Em Execução
IP	Rua Doutor Mario Vicente	Rua Salvador Simões	Rua Vinte e Quatro de Outubro		Em Execução
IP	Rua Salvador Simões	Rua Doutor Elísio de Castro	Rua Vinte e Quatro de Outubro		Em Execução
IP	Rua Vergueiro - LADO ÍMPAR	Rua Dr. Elísio de Castro	Rua Olival Costa		Em Execução
					14.607,92


LOTE 23 - VILA PRUDENTE

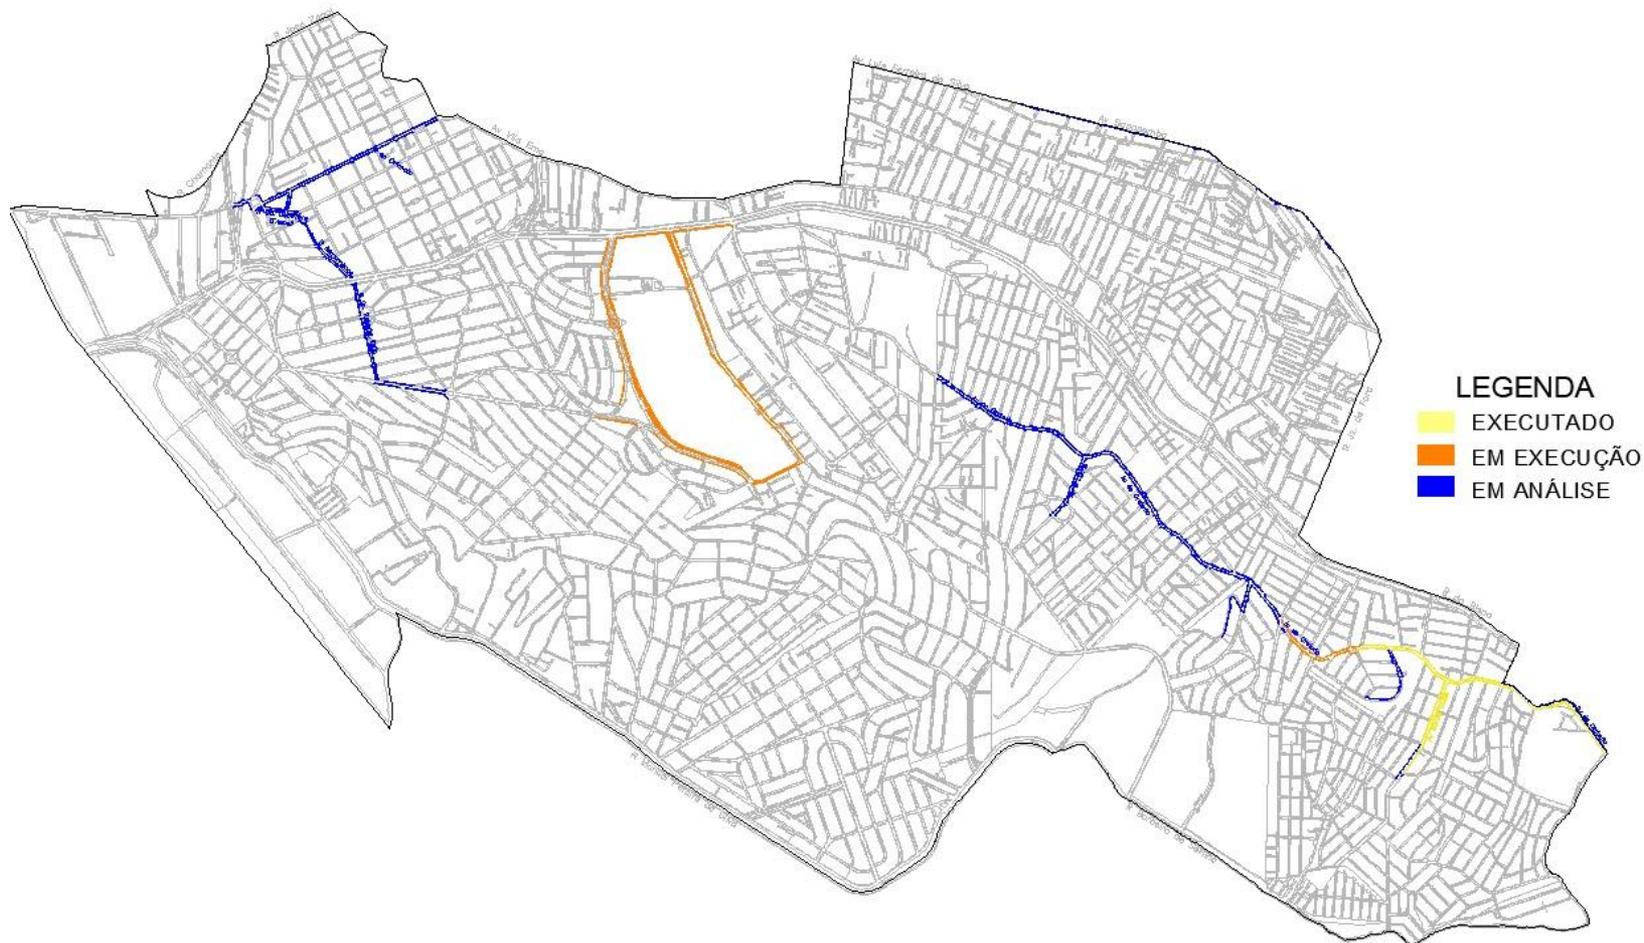

Subprefeitura Vila Prudente

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
VP	Avenida do Oratório	Rua São José das Espinharas	Rua Atalaia do Norte	3.345,66	Executado
VP	Avenida do Oratório	Rua Mocoim	Rua João Bastista Fernandes	3.391,29	Executado
VP	Avenida Morais Costa	Avenida Oratório	Rua Dois Irmãos		Executado
VP	Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR	Rua Nova Timboteua	Rua José Antônio Fontes	1.113,80	Executado
VP	Avenida do Oratório LADO PAR	Rua João Batista Fernandes	Avenida Casa Grande	1.471,20	Executado
VP	Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR	Rua João Manoel de Matos	Rua Santana de Mangueira	3.127,25	Em Execução
VP	Avenida do Oratório - LADO PAR	Rua Ingarana	Rua Itambaraca		Em Execução
VP	Avenida Francisco Falconi	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo	Rua José Jeraissati	21.575,85	Em Execução
VP	Avenida Jacinto Menezes Palhares	Rua José Jeraissati	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo		Em Execução
VP	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo	Avenida Francisco Falconi	Avenida Alberto Ramos		Em Execução
VP	Rua José Jeraissati	Avenida Francisco Falconi	Avenida Brumado de Minas		Em Execução
				34.025,05	


LOTE 24 - SANTO AMARO

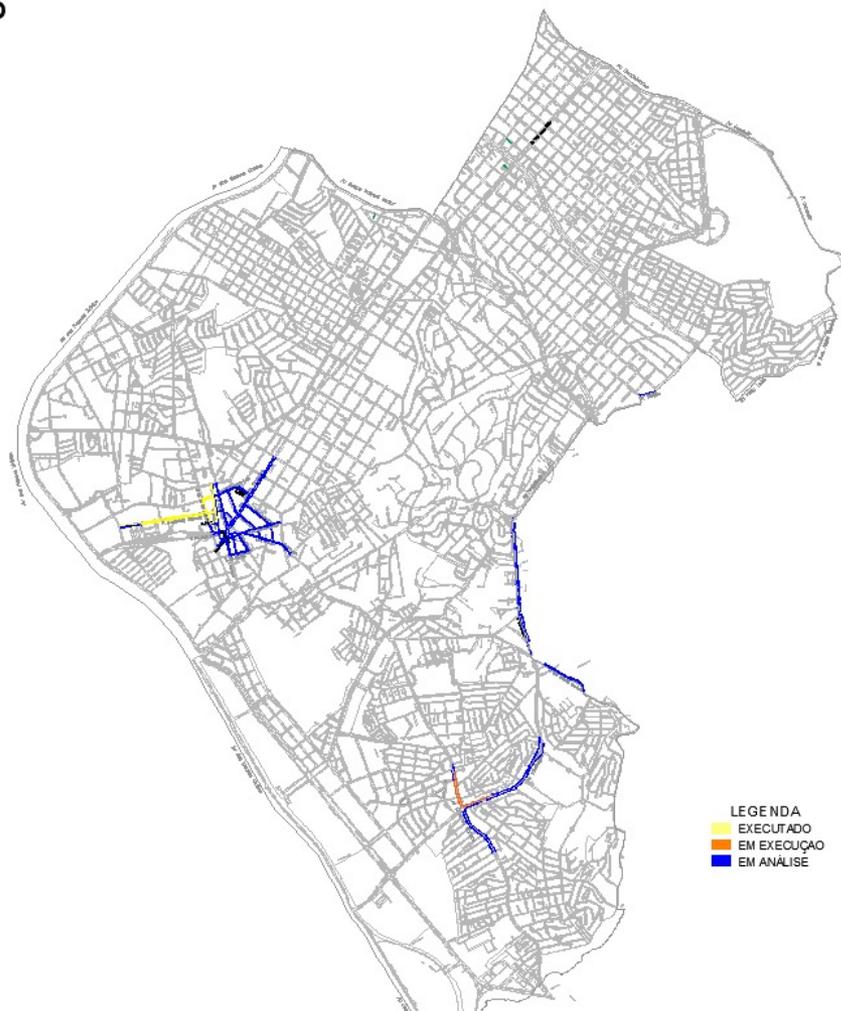

Subprefeitura Santo Amaro

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
SA	Avenida Mario Lopes Leão	Rua Barão do Rio Branco	Rua Paulo Eiró	3.536,99	Executado
SA	Ladeira Aurora	Barão do Rio Branco	Rua Paulo Eiró		Executado
SA	Rua Amador Bueno	Rua Paulo Eiró	Travessa Jurci Soares Sebastião		Executado
SA	Rua Barão do Rio Branco	Avenida Mario Lopes Leão	Ladeira Aurora		Executado
SA	Rua Paulo Eiró	Ladeira Aurora	Avenida Maio Lopes Leão		Executado
SA	Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR	Tv Jurci Soares Sebastião	Rua Barão do Rio Branco	1.502,28	Executado
SA	Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR	Rua Antonio de Saavedra	Tv Jurci Soares Sebastião	996,84	Executado
SA	Rua Amador Bueno - LADO PAR	Rua Manuel Elói do Nascimento	Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	915,10	Executado
SA	Avenida Interlagos - LADO PAR	Rua Assur	Avenida Nossa Senhora do Sabará	3.143,35	Em Execução
SA	Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO ÍMPAR	Avenida Interlagos	Rua Tomas Aquino de Macedo		Em Execução
SA	Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO PAR	Avenida Interlagos	Rua Norma		Em Execução
				10.094,56	

LOTE 24 - CIDADE ADEMAR

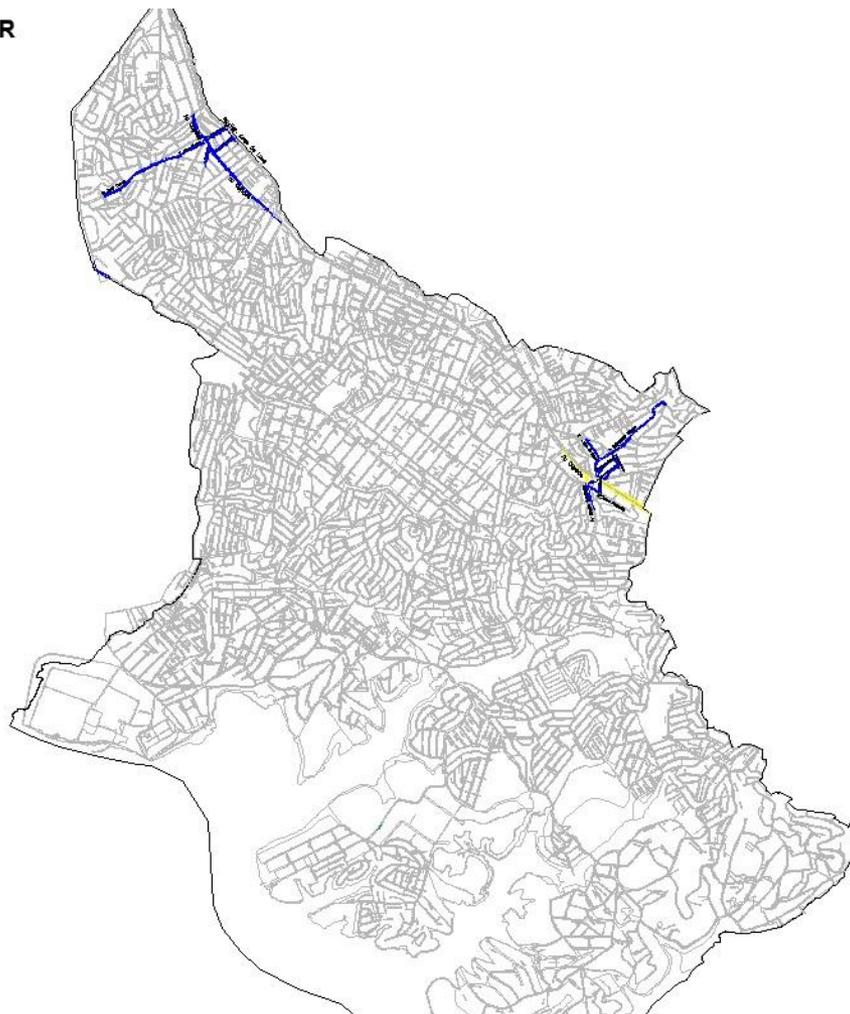

LEGENDA
EXECUTADO
EM EXECUÇÃO
EM ANÁLISE

Sub.	VIA	TRECHO		Área aprox. (m ²)	Situação da Obra
		DE	ATÉ		
AD	Avenida Angelo Cristianini	Avenida Cupecê	Avenida Garcia de Ávila	3.536,99	Executado
AD	Avenida Cupecê	Avenida Brás de Abre - 1b. Avenida Assembléia /	1a. Avenida Senador Vitorino Freire - 1b. Rua Adão Aranha		Executado
				3.536,99	

Exemplos de antes e depois de calçadas concluídas




Antes



Depois



Antes

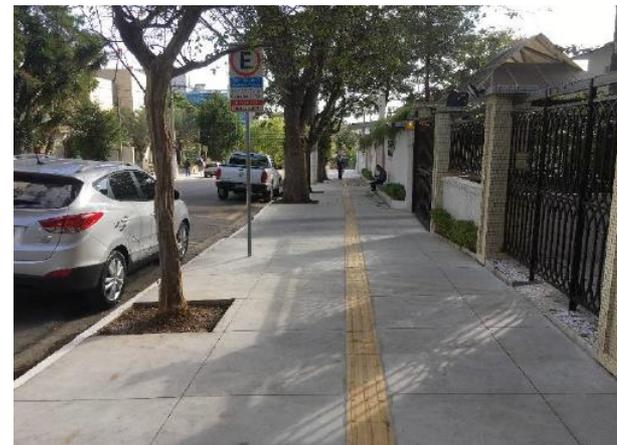

Depois




Antes



Depois

Subprefeitura Sapopemba

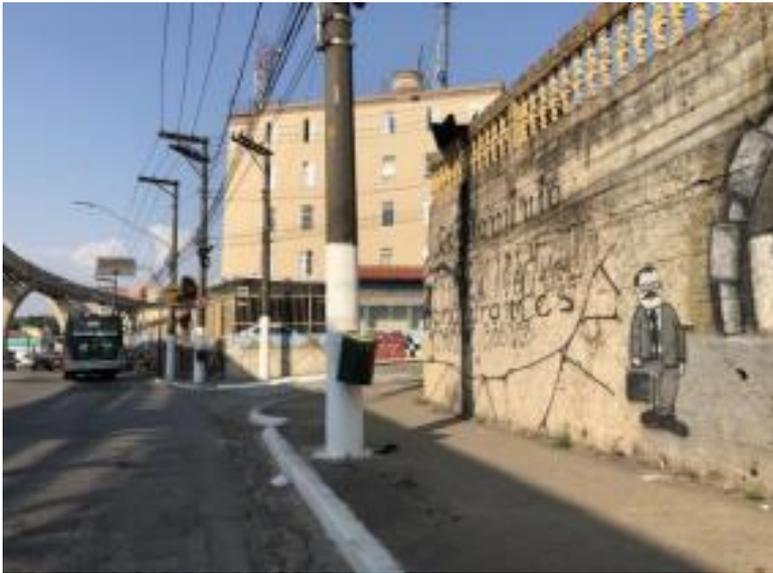

Antes



Depois



Antes



Depois



Antes




Depois



Antes



Depois

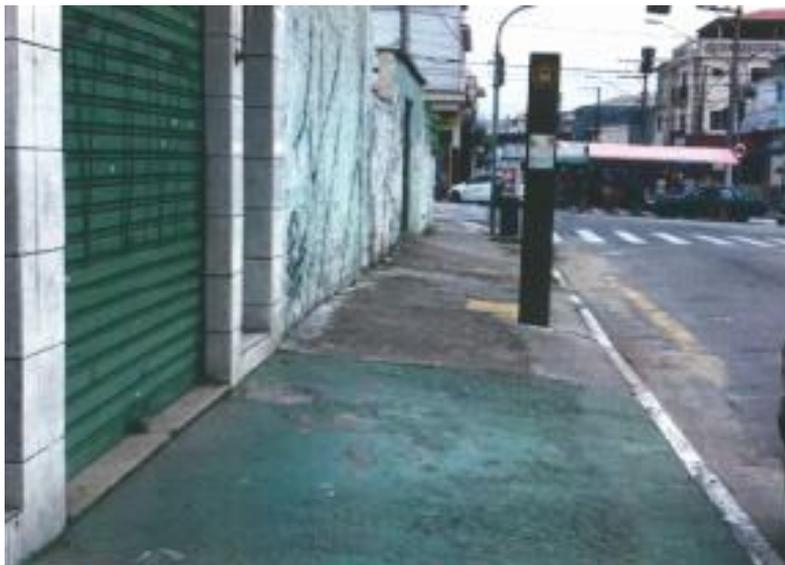

Antes



Depois



Antes



Depois



Antes



Depois
